



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JULHO/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área a Ser Construída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....	R\$ 965.277,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$ 40.203,37
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$ 102.046,35
Valor do 3º Termo Aditivo.....	R\$ 66.293,08
Valor do 5º Termo Aditivo.....	R\$ 32.772,30
Valor do 6º Termo Aditivo.....	R\$ 91.939,94
Valor do Reequilíbrio Financeiro.....	R\$ 311.290,92
Valor do 8º Termo Aditivo (Supressão de Valores).....	R\$ 129.899,19
Valor do 10º Termo Aditivo.....	R\$ 31.133,89
Valor Total.....	R\$ 1.511.057,66
Valor Executado.....	R\$ 1.390.665,42

% Acumulado Executado da Obra: **92,03%**

Projeto Acessibilidade (Rampas e Calçadas)

Valor da Licitação.....	R\$ 126.196,72
Valor Executado.....	R\$ 80.474,73

% Acumulado Executado da Obra: **63,77%**

Projeto Esquadrias (Portas e Janelas)

Valor da Licitação.....	R\$ 276.057,80
Valor Executado.....	R\$ 0,00

% Acumulado Executado da Obra: **0,00%**

Valor Total

Valor Total do Projeto Inicial Ajustado.....	R\$ 1.511.057,66
Valor do Projeto de Acessibilidade (Rampas e Passeio) Licitado...	R\$ 126.196,72
Valor do Projeto de Esquadrias (Portas e Janelas).....	R\$ 276.057,80
Valor Total Atualizado.....	R\$ 1.913.312,18
Valor Executado.....	R\$ 1.448.178,62

% Acumulado Executado da Obra: **75,69%**

Atividades:

- Realizada a Licitação do Projeto de Aberturas (Portas e Janelas) valor Licitado R\$ 276.057,80;
- Em fase de colocação do piso cerâmico nas rampas de acesso e área externo nos fundos.
- Em fase de colocação do Piso Tátil nas Calçadas;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Prédio do Centro Administrativo Municipal

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 352.518,15

Valor da Licitação.....R\$ 352.174,94

Valor Executado.....R\$ 257.602,21

Atividades:

- Em fase de colocação das janelas e Portas;
- Em fase de aplicação de massa corrida;
- Em fase de colocação do Piso Porcelanato;
- Em fase de Pintura das Paredes;
- Realizado Boletim de Medição nº 08 no Valor de R\$ 20.989,38

Situação:

- Executado **73,15%.**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**

Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....R\$ 450.000,00

Valor Executado pela 1ª Empresa.....R\$ 176.286,85

Valor do Projeto Remanescente.....R\$ 264.705,84

Valor Executado do Projeto Remanescente.....R\$ 183.696,65

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 33.845,94

Valor Executado do Termo Aditivo.....R\$ 21.454,97

Valor Total do Projeto (Projeto Inicial + Projeto Novo + Aditivo)....R\$ 474.838,63


Valor Total Executado (Projeto Inicial + Projeto Novo + Aditivo)....R\$ 381.684,09

Atividades:

- Em fase de pintura externa, execução do passeio e espalhamento de terra.
- Realizado Boletim de Medição nº 16 no valor de R\$ 25.632,85
- Realizado Boletim de Medição nº 01 no valor de R\$ 21.454,97 referente 1º Termo Aditivo.


Situação Atual da Obra:

- Executado (contrato atual) **69,40%**
- Executado (aditivo) **63,39%**
- Executado (acumulado) **80,38%**

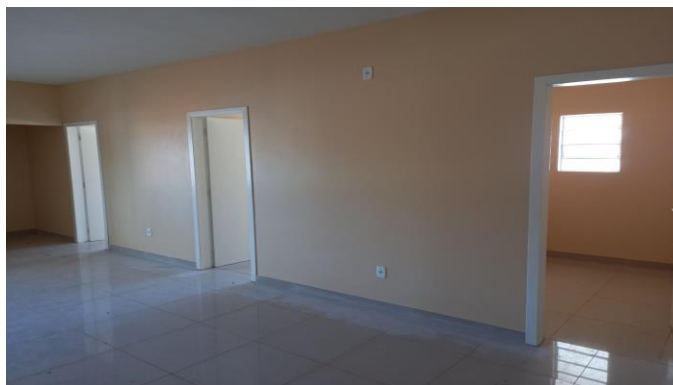



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

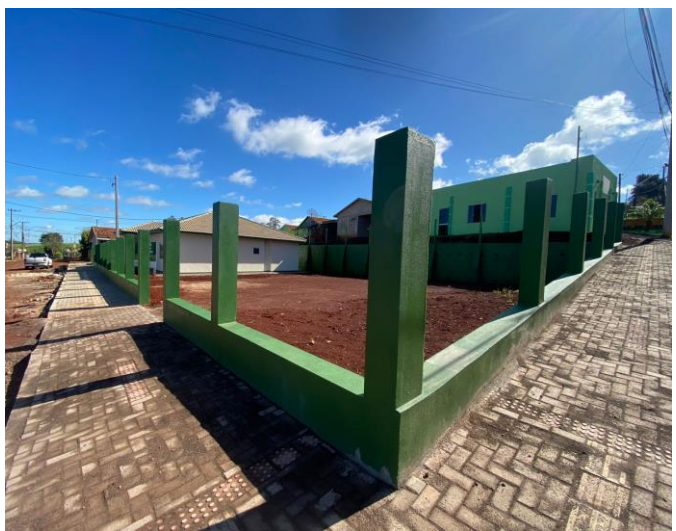

Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado.....R\$ **182.456,03**

Valor da Licitação.....R\$ **149.554,87**

Valor Executado.....R\$ **111.085,09**

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Erwin Mathaus Braun


Rua Sinfrônio Julio Ribeiro

Atividades:

- Em fase de Pavimentação da Rua Erwin Mathaus Braun
- Realizado Boletim de Medição nº 06 no valor de R\$ 16.374,33
- Realizado Boletim de Medição nº 07 no Valor de R\$ 12.183,17

Situação Atual da Obra:

- Executado **74,28%.**

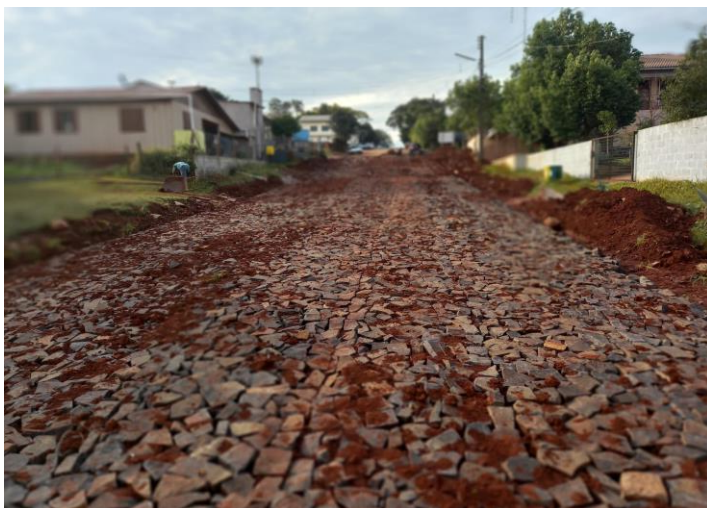



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação Asfáltica – Perímetro Urbano

Órgão Concedente: **Governo do Estado do Rio Grande do Sul.**

Recurso: **Programa Pavimenta**

Objeto:

Pavimentação Asfáltica

- Trecho da Rua Acelyno Lutz Pinheiro
- Estrada Saída para Coronel Bicaco
- Rua Industrial I

Área a Ser Pavimentada: **8.588m²**

Área a Ser Pavimentada (Aditivo): **1.778,32m²**

Área Total Ser Pavimentada: **10.366,32m²**

Valor Repasse.....R\$ 701.948,40

Valor Contrapartida.....R\$ 218.306,38

Valor da Licitação.....R\$ 920.254,78

Valor Executado.....R\$ 897.069,53

Valor Pago a Empresa.....R\$ 428.306,38

Percentual Executado do Projeto: 100,00%

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 182.234,80

Valor Executado do Termo Aditivo.....R\$ 182.234,80

Valor Pago a Empresa.....R\$ 181.223,32

Percentual Executado do Termo Aditivo: 100,00%

Valor Total da Obra.....R\$ 1.102.489,58

Valor Total Executado.....R\$ 1.102.489,58

Valor Total Pago a Empresa.....R\$ 609.529,70

Percentual Executado do Total da Obra: 100,00%

Atividades:

- Realizado Boletim de Medição nº 01 no Valor de R\$ 252.279,64
- Realizado Boletim de Medição nº 01 no Valor de R\$ 181.223,32 do 1º Termo Aditivo.
- Realizado Boletim de Medição nº 02 no Valor de R\$ 242.759,99
- Realizado Boletim de Medição nº 03 no Valor de R\$ 297.331,87
- Realizado Boletim de Medição nº 04 no Valor de R\$ 104.698,03
- Emitido Boletim de Medição nº 05 (Final) no Valor de R\$ 23.185,25;
- Emitido Boletim de Medição nº 02 (Final) do Termo Aditivo no Valor de R\$ 1.011,48;
- Realizada a Pintura e Colocação das Placas de Sinalização.

Situação:

- Obra Concluída



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
Rua Acelyno Lutz Pinheiro



*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
Rua Walter Perachi de Barcellos





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
Rua Sinfrônio Julio Ribeiro





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
Rua Estrada Saída para Coronel Bicaco





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Rua Industrial I





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
Pinturas das Faixas e Placas de Trânsito





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Um Galpão das Máquinas na Sub Prefeitura de São João

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 108.024,60

Valor da Licitação.....R\$ 94.895,25

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 4.800,12

Valor Total da Obra.....R\$ 99.695,37

Descrição: **Construção de Um Galpão Para Máquinas na Subprefeitura de São João**

Área: **184,00m²**

Atividades:

- Realizado o Pagamento do valor referente o contrato inicial no valor de R\$ 94.895,25.

Situação:

- Obra Concluída.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação da Escola Municipal Maria Belmont Albert

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 449.232,00

Valor da Licitação.....R\$ 449.232,00

Valor Executado.....R\$ 50.895,71

Percentual Executado: 11,33%

Item:

Construção de 04 Salas de Aula e Sanitários

Atividades:

- Emitido Boletim de Medição nº 01 no valor de R\$ 50.895,71

Situação:

- Em Execução





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 45.484,02

Valor da Licitação.....R\$ 295.484,02

Atividades:

- Em fase de escavação dos buracos das sapatas.

Situação Atual da Obra:

- Em Execução.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Concedente**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 115.973,14

Valor da Licitação.....R\$ 402.473,14

Atividades:

- Em fase de escavação dos buracos das sapatas.

Situação Atual da Obra:

- Em Execução.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Revitalização da Avenida Constante Luiz Gemelli

Recurso: **Municipal**

Valor.....R\$ 513.969,56

Valor da Licitação.....R\$ 478.493,00

Item:

Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli

Atividades:

- Obra iniciada em 25/07/2022.

Situação Atual da Obra:

- Aguardando início da obra.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00

Itens:

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico.

02 (duas) Carretas Basculantes

01 (uma) Roçadeira Agrícola

Atividades:

- Solicitado às empresas a entrega dos equipamentos;
- Recebido pedido da Empresa (Item Carretas) de Reequilíbrio Financeiro.



Roçadeira Agrícola



Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 466.666,67

Valor da Licitação.....R\$ 465.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira, 4x4, Motor com Potência Mínima de 85HP

Atividades:

- Equipamento Entregue dia 07/07/2022.

Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **044467/2019**

Valor Repasse.....R\$ 146.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 4.800,00

Valor Total.....R\$ 150.800,00

Valor da Licitação.....R\$ 149.150,00

Itens:

02 (duas) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

Situação:

- Equipamentos Recebidos





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **023468/2021**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.100,00

Valor Total.....R\$ 332.600,00

Valor da Licitação.....R\$ 332.500,00

Item:

Aquisição de 02 Tratores Agrícolas (75cv)

Situação:

- Recurso Liberado





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS LICITADOS / Aguardando a Entrega dos Itens

Aquisição de Um Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido

Recurso: **Municipal (Emendas Impositivas Vereadores)**

Valor Total.....R\$ 72.333,33

Valor da Licitação.....R\$ 47.300,00

Itens:

Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido

Atividades:

- Solicitado a empresa a entrega do equipamento.

Situação:

- Aguardando entrega do equipamento.

Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 614.166,67

Valor da Licitação.....R\$ 614.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (um) Caminhão Equipado com Caçamba de no Mínimo 12m³

Atividades:

- Processo de Licitação realizado dia 21/07/2022

- Empresa Vencedora IVECO Caminhões

Situação:

- Aguardando Contratação com a empresa vencedora da licitação



Foto Ilustrativa



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM FASE DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO

Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento de Urgência

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-003**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Total.....R\$ 250.000,00

Item:

01 (um) Equipamento Raio X Fixo Analógico;	01 (uma) Bomba de Infusão;
02 (dois) Carro de Emergência;	01 (um) Carro Maca Avançada;
01 (um) Desfibrilador Convencional;	01 (um) Eletrocardiógrafo;
01 (uma) Mesa de Cabeceira;	01 (um) Monitor Multiparâmetros;
01 (um) Aspirador de Secreção Elétrico Móvel;	01 (um) Computador.

Atividades:

- Encaminhado Projeto ao Setor de Licitações.
- Aguardando realização do Certame.

Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.256000/1220-02**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Lasier Martins**

Valor Repasse.....R\$ 80.000,00

Valor Total.....R\$ 80.000,00

Item:

Equipamentos e Material Permanente

06 Computador	01 Notebook
05 Impressora	03 Lanterna Clínica
01 Espaldar em Madeira	01 Detector Fetal
01 Balança Digital Portátil	01 Martelo de Reflexo
02 Escada com 2 Degraus	01 Estetoscópio
02 Andador	04 Mesa Ginecológica
01 Biombo	01 Goniômetro
01 TENS e FES	01 Ultrassom Fisioterapia
01 Cama Elástica Proprioceptiva	06 Exercitador de Mãos e Dedos
03 Fotopolimerizador de Resinas	

Atividades:

- Encaminhado Projeto ao Setor de Licitações.
- Aguardando realização do Certame.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS APROVADOS/RECURSO LIBERADO

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....R\$ 35.374,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.036,00

Valor Total.....R\$ 38.410,00

Item:

Aquisição de 262 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Assinado Termo Aditivo de supressão de 462 sacas para 262 sacas

Situação:

- Aguardando abertura do crédito no Orçamento 2022 para posterior realização da Licitação.

Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Saúde – Fundo a Fundo**

Valor Repasse.....R\$ 50.000,00

Valor Total.....R\$ 50.000,00

Item:

Equipamentos e Material Permanente

01 Câmara para Conservação de Vacinas, Medicamentos;

01 Eletrocardiógrafo;

01 Monitor de Sinais Vitais;

01 Cilindro para Oxigênio Medicinal 50 Litros

02 Cilindro para Oxigênio Medicinal 7 Litros

04 Cadeiras de Rodas Adulto Dobrável

05 Nebulizador Ultrassônico

Atividades:

- Recurso Liberado em 01/07/2022.

Situação:

- Aguardando abertura de crédito no orçamento vigente para posterior licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROPOSTAS/Recursos Liberados:

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4296492/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Item:

Incremento Custeio do Piso de Atenção Primária - PAP

Situação:

- Recurso Liberado em 17/06/2022.

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4619692/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 110.000,00

Valor Total.....R\$ 110.000,00

Item:

Incremento Custeio do Piso de Atenção Primária - PAP

Situação:

- Recurso Liberado em 18/06/2022.

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4601602/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 200.000,00

Valor Total.....R\$ 200.000,00

Item:

Incremento Custeio do Piso de Atenção Primária - PAP

Situação:

- Recurso Liberado em 24/06/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.460112/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar:

Valor Repasse.....R\$ 150.000,00

Valor Total.....R\$ 150.000,00

Item:

Incremento Custeio do Piso de Atenção Primária - PAP

Situação:

- Recurso Liberado em 24/06/2022.

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4658842/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Pompeo de Mattos**

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Item:

Incremento Custeio do Piso de Atenção Primária - PAP

Situação:

- Recurso Liberado em 24/06/2022.

PROJETOS EM ANÁLISE (GOVERNO RS)

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2018/2019**

Valor Repasse.....R\$ 59.009,21

Valor Contrapartida.....R\$ 1.834,87

Valor Total.....R\$ 60.844,08

Item:

Aquisição de 418 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Projeto enviado dia 28/04/2021 para análise da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul.

Situação:

- Aguardando a Aprovação do Plano de Trabalho para posterior realização da Licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROPOSTAS CADASTRADAS:

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Heitor Schuch**

Proposta SICONV: **002523/2022**

Valor Repasse.....R\$ 143.250,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.750,00

Valor Total.....R\$ 146.000,00

Itens:

01 (uma) Grade Aradora

01 (uma) Grade Niveladora

01 (uma) Carreta Agrícola com Carroceria de Madeira

01 (uma) Roçadeira Agrícola

Situação:

- Proposta Aprovada, em análise de Plano de Trabalho.

PROJETO APROVADO (Aguardando Elaboração do Projeto de Engenharia)

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **052170/2021**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 239.750,00

Objeto: **Pavimentação com Pedras Irregulares**

Local: **Localidade de Vila São Sebastião**

Atividades:

- Proposta Aprovada / Contrato de Repasse Assinado

Situação:

- Aguardando Solicitação da CEF para elaboração do Projeto de Engenharia.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM ELABORAÇÃO:

Ampliação do Galpão das Máquinas da Secretaria de obras

Recurso: **Municipal**


Item:

Ampliação Da Cobertura do Galpão da Secretaria de Obras

Área Aproximada: 472,70m²

Atividades:

- Aguardando orçamentos das empresas.

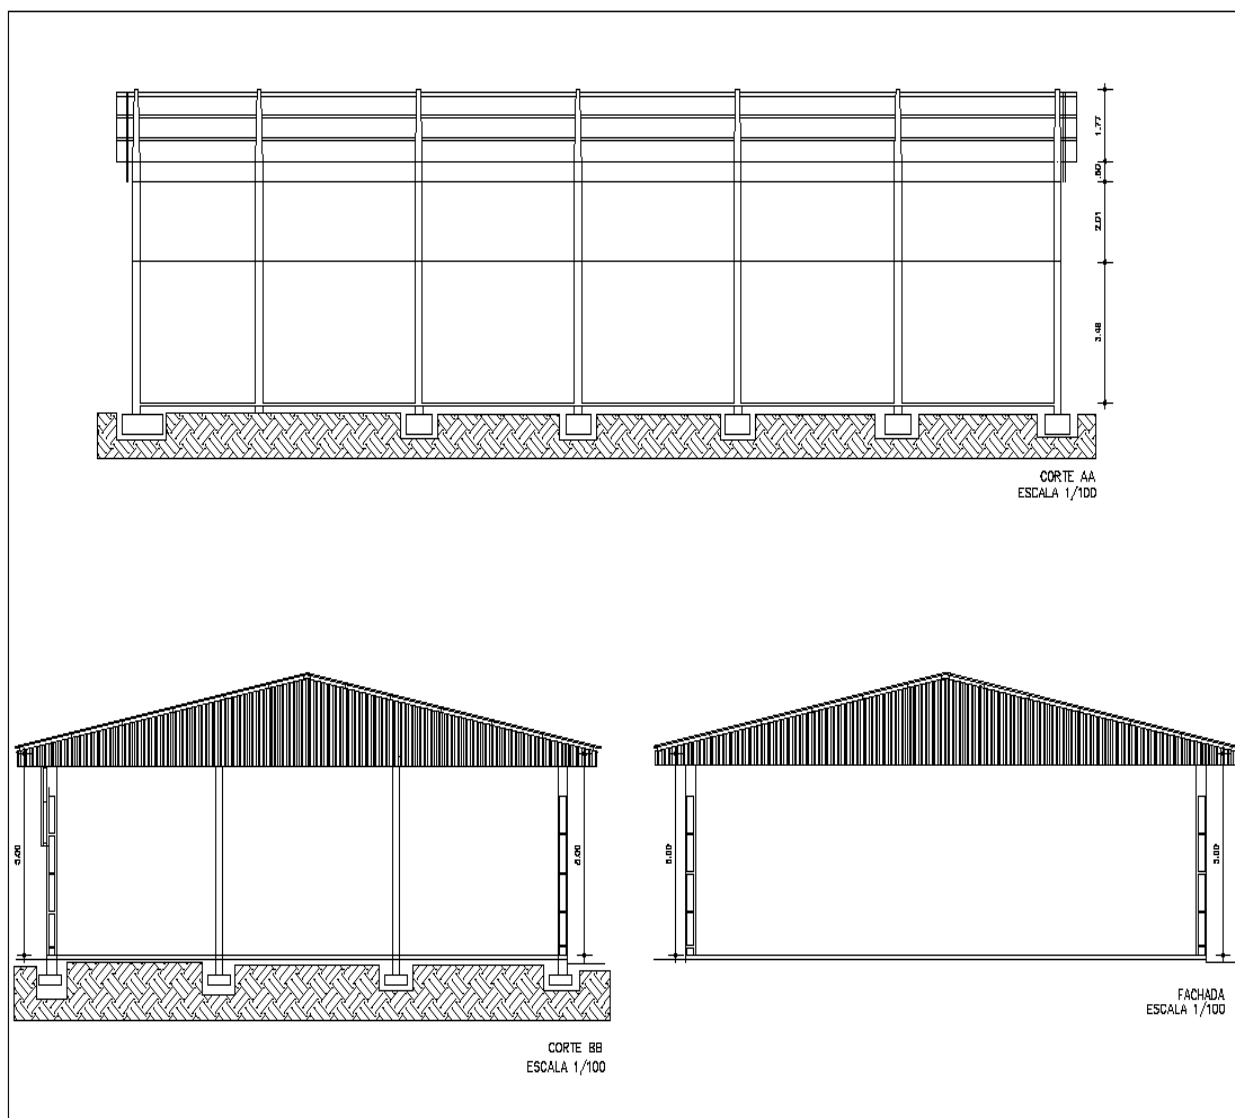



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Perímetro Urbano


Recurso: **Municipal**

Atividades:

- Encaminhada Documentação ao Tabelionato para realizar a localização de parcela na Matrícula

Situação:

- Em fase de elaboração dos mapas da ampliação do perímetro urbano

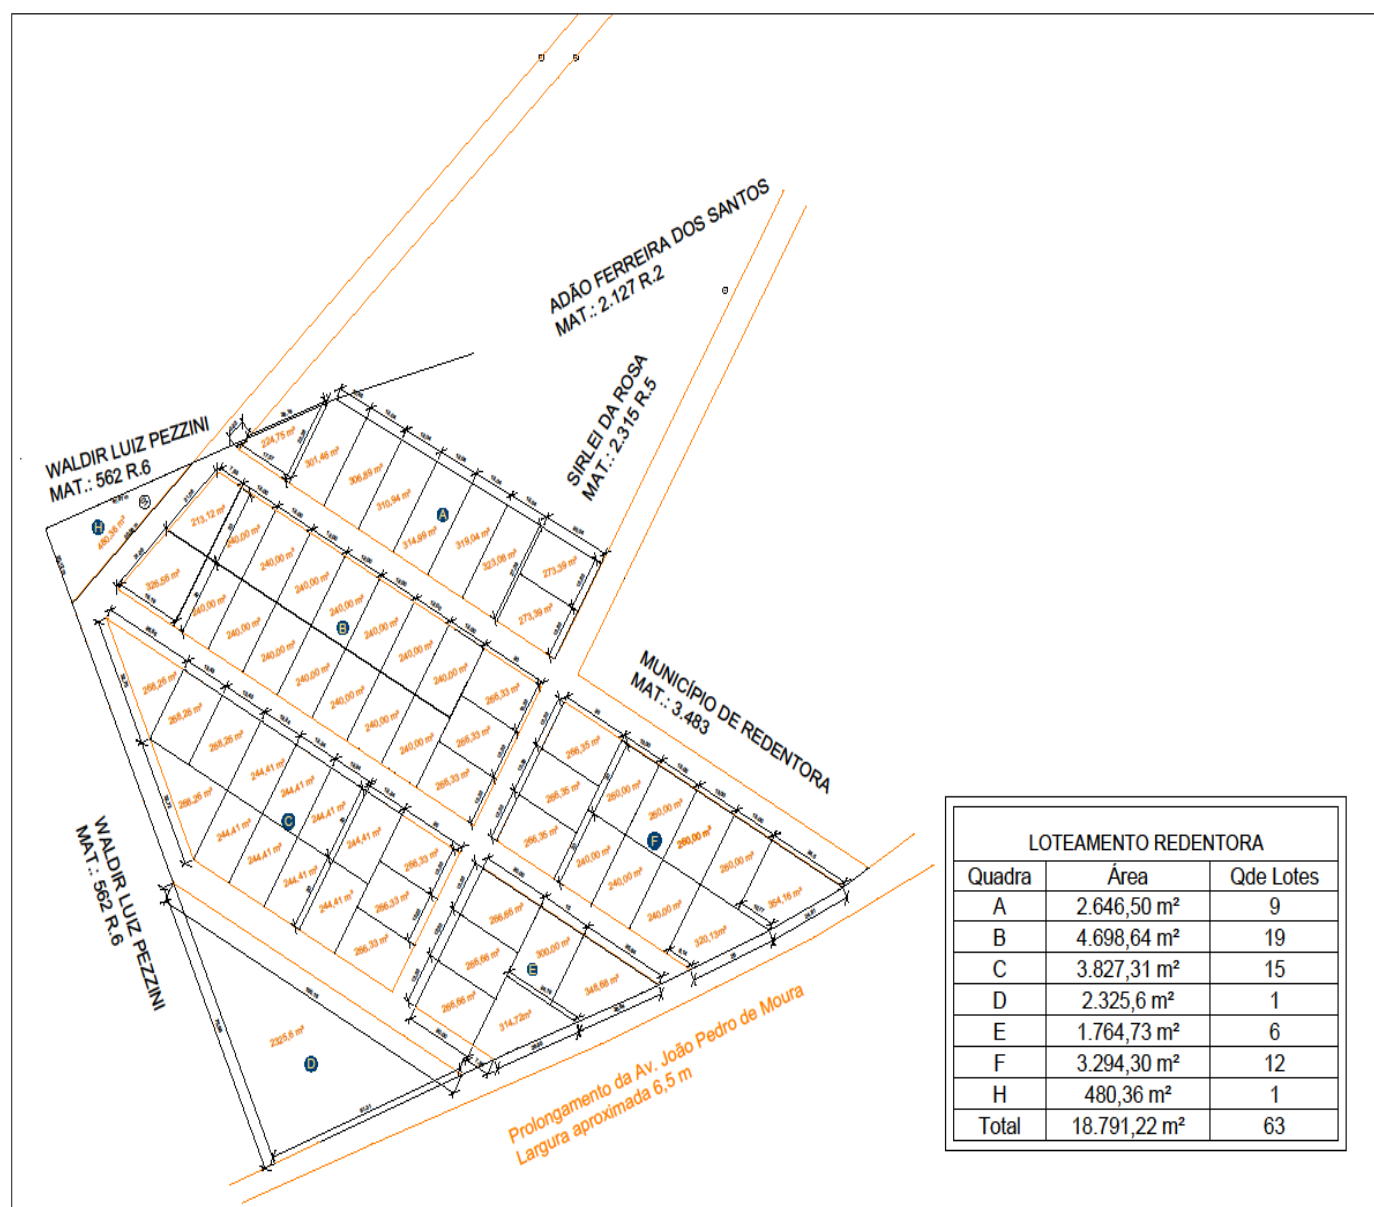




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Um Pórtico no Acesso ao Bairro São José

Recurso: **Municipal**

Atividades:

- Projeto em elaboração

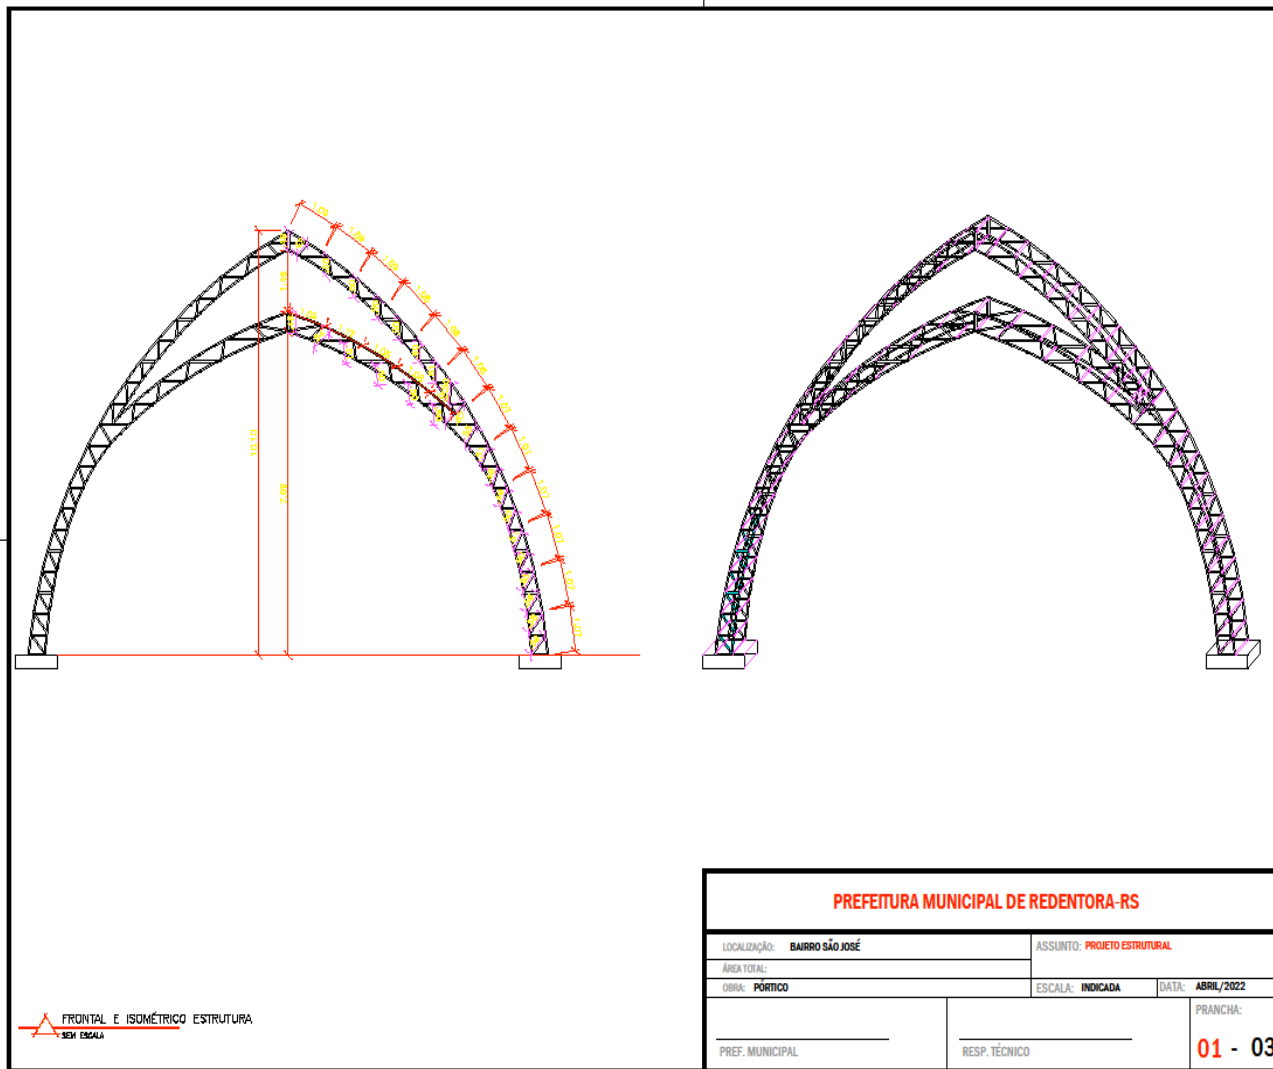



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Paradas de Ônibus

Recurso: **Municipal**

Atividades:

- Projeto em elaboração





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS CONCLUÍDOS:

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Recurso: **Municipal**

Item:

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Valor do Projeto.....R\$ 106.678,63

Valor da Licitação.....R\$ 106.635,75

Valor Executado.....R\$ 106.635,75

Atividades:

- Em fase de elaboração do Termo Aditivo da Obra R\$ 21.317,39

Situação Atual da Obra:

- Executado **100,00%.**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

Valor.....R\$ 340.585,32

Item:

Implantação de 35 Módulos Sanitários

Atividades:

- Convênio encerrado.
- Concluída 20 Unidades (57,14%).

Situação da Obra:

- Convênio encerrado.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Perfuração de Poços

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

Valor Total.....	R\$	70.000,00
Valor da Licitação (Geólogo).....	R\$	4.440,00
Valor da Licitação (Perfuração).....	R\$	45.500,00
Termo Aditivo (Adição) da Licitação (Perfuração).....	R\$	11.000,00
Termo Aditivo (Supressão) da Licitação (Perfuração).....	R\$	2.350,00
Valor Total Utilizado.....	R\$	58.590,00

Item:

Realizada a Perfuração dos Poços Tubulares Profundos (Poços Artesianos)

Situação:

- Projeto concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Situação:

- Prestação de Contas complementada e enviada para análise.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Situação:

- Prestação de Contas Enviada para Análise.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SETOR DE ARQUITETURA

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 24 de junho de 2022 até 01 de julho de 2022;
- Reanálise de Projeto de uma edificação em alvenaria, protocolo nº 1072/2022;
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários e responsável técnico, referente ao Projeto de uma edificação em alvenaria, protocolo nº 1072/2022;
- Contato com empresa responsável técnica pela obra de execução do galpão para máquinas no Distrito São João, referente a execução de fundações;
- Visita em propriedade com fiscal de obras, para avaliação de imóvel, tabela ITBI, de casa de madeira e lote para compra e venda;
- Montagem de tabela para avaliação de casa térrea em madeira e lote, valores de avaliação como base tabela ITBI;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (05/07);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Pavimentação com Pedras Irregulares e Drenagem Pluvial nas Ruas Ervin Mathaus Braun e Sinfrônio Júlio Ribeiro (05/07);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Pavimentação das Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial I , Estrada para Cel. Bicaco, Walter Perachi de Barcelos e Sinfrônio Julio Ribeiro (05/07);
- Reanálise de Projeto e contato com setor de Cadastros Imobiliários e responsável técnico, referente a Retificação das Dimensões e da área Superficial de dois lotes urbanos, protocolo 1126/2022;
- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros Imobiliários, referente a Retificação das Dimensões e da área Superficial de dois lotes urbanos, protocolo 1126/2022;
- Visita no local a ser executado a obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 e 883914/2019 para locação da obra dos vestiários (05/07);
- Preenchimento de dados, envio de manual e modelo para responsável pela execução da obra de Modernização do Estádio Municipal, referente as placas de obra do contrato 892538/2019 e 883914/2019;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita para acompanhamento da demolição da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 e 883914/2019 e levantamento fotográfico (06/07);

Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Pavimentação das Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial I , Estrada para Cel. Bicaco, Walter Perachi de Barcelos e Sinfrônio Julio Ribeiro (06/07);

- Contato com empresa responsável pela execução da obra de ampliação da Escola Maria Belmont Albert, referente ao envio de CNO da obra e ART de execução da mesma;

- Elaboração de RRT, junto ao CAU/RS, referente a fiscalização da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019;

- Elaboração de RRT, junto ao CAU/RS, referente a fiscalização da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019;

- Elaboração de Boletim de Medição 01, referente a obra de Pavimentação Asfáltica dos trechos da Rua Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial I e Estrada para Cel. Bicaco (06/08);

- Elaboração de Boletim de Medição 01, referente a medição do Aditivo 01, referente a Pavimentação Asfáltica dos trechos da Rua Walter Perachi de Barcelos e Sinfrônio Julio Ribeiro (06/08);

- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (07/07);

- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Pavimentação das Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial I , Estrada para Cel. Bicaco, Walter Perachi de Barcelos e Sinfrônio Julio Ribeiro (07/07);

- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (07/07);

- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (07/07);

- Elaboração de Boletim de Medição 16, referente a obra da Unidade de Acolhimento (07/07);

- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 16 referente a obra da Unidade de Acolhimento (07/07);

- Recebimento de novos arquivos por responsável técnico, reanálise do projeto de uma edificação residencial em alvenaria e contato com responsável técnico, protocolo nº 416/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Recebimento e análise de projeto de edificação residencial Unifamiliar em alvenaria, aprovação 23/2022;
- Aprovação e entrega ao Setor de Cadastros Imobiliários, referente ao projeto de edificação residencial Unifamiliar em alvenaria, aprovação 23/2022.
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 01 de julho de 2022 até 08 de julho de 2022;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Pavimentação das Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial I, Estrada para Cel. Bicaco, Walter Perachi de Barcelos e Sinfrônio Julio Ribeiro;
- Boletim de Medição 02 e 03 referente a obra de Pavimentação das Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial I, Estrada para Cel. Bicaco, Walter Perachi de Barcelos e Sinfrônio Julio Ribeiro;
- Recebimento de novos arquivos referentes a Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1072/2022;
- Relatório fotográfico referente ao boletim de Medição 01, 02 e 03 referente a obra de Pavimentação das Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial I, Estrada para Cel. Bicaco, Walter Perachi de Barcelos e Sinfrônio Julio Ribeiro;
- Contato com setor de Cadastros Imobiliários e morador, referente a legislação para criação de loteamentos, assim como, pesquisa e estudo na legislação referente ao item mencionado anteriormente;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (14/07);
- Conferência de dados, referente ao recebimento de modelo para placas da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 e 883914/2019 e resposta a gráfica;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico das obras de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 e 883914/2019 (14/07);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de ampliação da Escola Maria Belmont Albert (14/07);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra do Galpão para Máquinas localizado na Sub Prefeitura do Distrito São João (14/07);
- Contato com empresa responsável pela execução do Galpão para Máquinas na Sub Prefeitura do Distrito São João, referente a ART de execução e CNO da obra;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita para vistoria de módulo sanitário e Relatório Fotográfico no interior do Município (14/07);

- Elaboração de RRT, junto ao CAU/RS, referente a fiscalização da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert, com quatro salas de aulas e sanitários;

- Elaboração de boletim de Medição 01, referente a obra do Galpão para Máquinas na Sub Prefeitura do Distrito São João;

- Elaboração de boletim de Medição 01, do aditivo 01, referente a obra do Galpão para Máquinas na Sub Prefeitura do Distrito São João;

Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 01, referente a obra do Galpão para Máquinas na Sub Prefeitura do Distrito São João;

- Análise de Projeto de Reforma e Ampliação de Edificação Residencial Unifamiliar, protocolo nº 1215/2022;

- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros Imobiliários de Projeto de Reforma e Ampliação de Edificação Residencial Unifamiliar, protocolo nº 1215/2022;

- Análise de Croqui e Memorial Descritivo referente a um desmembramento de lote urbano nº 752, quadra nº 20-A, protocolo nº 1286/2022;

- Contato com setor de Cadastros Imobiliários, para conferência de lotes confrontantes e demais dúvidas, sobre o projeto de desmembramento de lote urbano, protocolo nº 1286/2022;

- Reanálise após recebimento de nos arquivos de Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1072/2022;

- Contato com setor de Cadastros Imobiliários, referente ao Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1072/2022, sobre adendo no contrato e planta de situação/ localização;

- Reanálise após recebimento de nos arquivos de Projeto de uma edificação em alvenaria, protocolo nº 416/2022;

- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros imobiliários de Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1072/2022;

- Boletim de medição 01, referente a vistoria de Módulo sanitário, assim como, relatório fotográfico do mesmo;

- Elaboração e envio a responsável técnico de parecer referente a Croqui e Memorial Descritivo referente a um desmembramento de lote urbano nº 752, quadra nº 20-A, protocolo nº 1286/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração e envio a responsável técnico de parecer referente ao Projeto de uma edificação em alvenaria, protocolo nº 416/2022;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 08 de julho de 2022 até 15 de julho de 2022;
- Contato com empresa responsável pela execução do Galpão para Máquinas na Sub Prefeitura do Distrito São João, referente a documentação e CNO da obra;
- Elaboração de RRT, junto ao CAU/RS, referente a fiscalização da obra do Galpão para Máquinas na Sub Prefeitura do Distrito São João;
- Resposta ao contato de empresa responsável pela execução da obra da Unidade de Acolhimento, referente ao tipo de grades especificadas no projeto;
- Contato com setor de Cadastros Imobiliários, referente a particularidades de projeto de edificação residencial aprovado anteriormente, aprovação 25/2022;
- Resposta ao contato de responsável técnica pela elaboração de Projeto de uma edificação residencial em alvenaria, protocolo nº 416/2022, referente a dúvida após envio de parecer a mesma;
- Contato com responsável técnica e setor de Cadastros Imobiliários referente a Projeto de Desmembramento de lote urbano, protocolo nº 1286/2022;
- Elaboração e envio a empresa de Termo de Recebimento de Obra, referente a obra do Galpão para Máquinas na Sub Prefeitura do Distrito São João;
- Reanálise após recebimento de novos arquivos referente ao Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1150/2022;
- Aprovação e entrega ao setor de cadastros de Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1150/2022;
- Reanálise após recebimento de nos arquivos de Projeto de uma edificação residencial em alvenaria, protocolo nº 416/2022;
- Aprovação e entrega ao setor de cadastros de Projeto de uma edificação residencial em alvenaria, protocolo nº 416/2022;
- Visita para acompanhamento da obra e locação da mesma, e Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (20/07);
- Visita para acompanhamento da obra e locação da mesma, e Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (20/07);



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de ampliação da Unidade de Acolhimento (20/07);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de ampliação da Escola Maria Belmont Albert (20/07);
- Envio de arquivos, após solicitação de empresa, referente a instalação e execução de esquadrias no Hospital Santa Rita de Cássia, processo nº 068/2022, tomada de preço nº 007/2022;
- Visita para acompanhamento da obra, execução de ferragens da viga Baldrame, e concretagem da mesma, assim como, relatório Fotográfico da obra de ampliação da Escola Maria Belmont Albert (21/07);
- Contato com empresa responsável pela elaboração do projeto de ampliação da Escola Maria Belmont Albert, após dúvida do construtor, referente aos pilares estruturais especificados no projeto;
- Visita para acompanhamento da obra, execução de pintura e instalação de placas, assim como Relatório Fotográfico da obra de Pavimentação das Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial I, Estrada para Cel. Bicaco, Walter Perachi de Barcelos e Sinfrônio Julio Ribeiro (21/07);
- Assinatura de Alvarás de Construção;
- Atendimento a moradores da cidade, para sanar dúvidas referentes a localização e dimensões de ruas existentes no município, assim como, leis e procedimentos para aprovação de projeto de criação de loteamento;
- Envio de arquivos após solicitação de empresa e horário para visita técnica, referente a instalação e execução de esquadrias no Hospital Santa Rita de Cássia, processo nº 068/2022, tomada de preço nº 007/2022;
- Visita para acompanhamento da obra e concretagem da viga baldrame, assim como, conferência de pilares e armaduras e relatório Fotográfico da obra de ampliação da Escola Maria Belmont Albert (22/07);
- Recebimento de arquivos, após envio de parecer, referente a Projeto de Desmembramento de lote urbano, protocolo nº 1286/2022;
- Diagramação de tabela para elaboração de boletins de medição referente a obra de ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 15 de julho de 2022 até 22 de julho de 2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Assinatura de alvarás de construção;
- Resposta a contato de empresa, sobre elaboração de cronograma da referente a instalação e execução de esquadrias no Hospital Santa Rita de Cássia, processo nº 068/2022, tomada de preço nº 007/2022;
- Simulação referente a custo na substituição de canteiros centrais de vegetação e meio fio, por calçada com pisos intertravados, referente a obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Visita para acompanhamento da obra e locação da mesma, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (26/07);
- Visita para acompanhamento da obra e locação das fundações, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (26/07);
- Visita para acompanhamento da obra e locação das fundações, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (26/07);
- Adequação na tabela de Boletim de medição da obra de Ampliação do Centro Administrativo, com o valor da proposta da empresa vencedora;
- Resposta ao contato de funcionário da RBS, assim como, visita a Praça Redenção, com ele e eletricitista do município, para averiguar situação atual de torre e fiação existente no local, assim como, propor possíveis melhorias e substituição de rede elétrica;
- Elaboração de boletim de medição 01, referente a obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Elaboração de relatório fotográfico, referente a boletim de medição 01, referente a obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Estudo no projeto de calçadas do Hospital Santa Rita de Cássia, após dúvida surgida por parte da empresa responsável pela execução do mesmo;
- Andamento no cálculo e elaboração de planilha referente a aditivo da obra de ampliação do Centro Administrativo;
- Resposta ao contato de engenheiro da empresa responsável pela execução da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli, para envio de ART e RRT da obra, assim como, resposta a dúvida referente a instalação de postes de iluminação;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (27/07);



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de ampliação do Centro Administrativo (27/07);
- Assinatura de alvarás de construção;
- Recebimento de novos arquivos referentes a Projeto de uma edificação em alvenaria, protocolo 939/2022;
- Análise de projeto de regularização e desmembramento de lote urbano, protocolo nº 1304/2022;
- Reanálise, após recebimento de novos arquivos, referente a Croqui e Memorial Descritivo referente a um desmembramento do lote urbano nº752, quadra nº 20, protocolo nº 1286/2022;
- Análise de Projeto de regularização de edificação residencial unifamiliar (casa popular), protocolo nº 1324/2022;
- Análise de Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1342/2022;
- Elaboração de boletim de medição 05, referente a obra de Pavimentação das Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial I, Estrada para Cel. Bicaco, Walter Perachi de Barcelos e Sinfrônio Julio Ribeiro (28/07);
- Elaboração de boletim de medição 02, referente ao aditivo, da obra de Pavimentação das Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial I, Estrada para Cel. Bicaco, Walter Perachi de Barcelos e Sinfrônio Julio Ribeiro (28/07);
- Assinatura de relatório fotográfico, referente a obra de Pavimentação das Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial I, Estrada para Cel. Bicaco, Walter Perachi de Barcelos e Sinfrônio Julio Ribeiro;
- Conversa com setor de Cadastros Imobiliários, referente a Croqui e Memorial Descritivo de a um desmembramento do lote urbano nº752, quadra nº 20, protocolo nº 1286/2022;
- Conversa com setor de Cadastros Imobiliários, referente a Projeto de regularização de edificação residencial unifamiliar (casa popular), protocolo nº 1324/2022;
- Conversa com setor de Cadastros Imobiliários referente a projeto de regularização e desmembramento de lote urbano, protocolo nº 1304/2022;
- Conversa com setor de Cadastros Imobiliários, referente a Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1342/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Reanálise, após recebimento de novos arquivos, referente a Projeto de uma edificação em alvenaria, protocolo 939/2022;
- Conversa com setor de Cadastros Imobiliários, referente a Projeto de uma edificação em alvenaria, protocolo 939/2022;
- Contato com responsável técnico, referente a alterações em arquivos do projeto de Croqui e Memorial Descritivo de a um desmembramento do lote urbano nº752, quadra nº 20, protocolo nº 1286/2022;
- Contato com empresa responsável pela execução do Galpão para Máquinas na Sub Prefeitura do Distrito São João, referente a documentação;
- Contato com responsável técnico, para resposta e parecer após análise, referente a Croqui e Memorial Descritivo de a um desmembramento do lote urbano nº752, quadra nº 20, protocolo nº 1286/2022;
- Envio de arquivos de projeto referente a instalação e execução de esquadrias no Hospital Santa Rita de Cássia, processo nº 068/2022, tomada de preço nº 007/2022;
- Visita para acompanhamento da obra e vistoria de detalhes finais, assim como, Relatório Fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (29/07).

SETOR DE ENGENHARIA

- Visita na obra de reforma e adequação do hospital municipal para conferência de contrato de obra de calçadas e acessibilidade;
- Visita na obra do contrato remanescente da unidade de acolhimento;
- Alteração no projeto de calçadas e rampas acessíveis do prédio administrativo;
- Digitalização de Relatórios fotográficos trator 01, trator 02 e Plantadeira;
- Montagem de planilhas para controle de cargas do programa pavimentação;
- Acompanhamento do programa pavimentação na Rua Acelyno Lutz Pinheiro e ruas Walter Perachi de Barcellos e Sinfrônio Júlio Ribeiro.
 - Montagem de boletim de medição do programa pavimentação bm 01; 02; 03 e 04;
 - Visita na obra da unidade de acolhimento;
 - Montagem de relatório fotográfico da unidade de acolhimento;
 - Relatório Fotográfico BM 01 Rua acelyno Lutz Pinheiro 1º camada;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Relatório Fotográfico BM 02 Rua Acelyno Lutz Pinheiro 2º Camada;
- Relatório Fotográfico BM 03 Estrada para Coronel bicaco 1º e 2º camada;
- Relatório Fotográfico BM 01 DO 1º Termo Aditivo, Ruas Walter Perachi de Barcellos e Rua Sinfrônio Júlio Ribeiro;
- Relatório Fotográfico BM 04 Rua Industrial I;
- Montagem de Planilha Orçamentária de cotações para execução e instalação de esquadrias do hospital municipal;
- Montagem de Planilha de Quadro de Resumo de cotações para execução e instalação de esquadrias do hospital municipal;
- Atualização de Orçamento de empresa terceira para montagem de processo de licitação de execução e instalação de esquadrias do hospital municipal;
- Visita no Distrito São João para verificar instalações de galpão metálico e tirar fotos para relatório fotográfico;
- Visita no Sítio Cassemiro para verificar instalações de módulo Sanitário Remanescente da Beneficiária Camila Raquel da Rosa;
- Montagem de boletim de medição 01 de módulo sanitário remanescente;
- Início de Montagem de planilha orçamentária das calçadas e rampas do prédio administrativo;
- Férias.

SETOR CONVÊNIOS E PARCERIAS

- Organização e preenchimento do Plano de Trabalho de aquisição de veículo – SEDUR;
- Curso 14º ERCO 2022 em Frederico;
- Audiência Pública sobre o Plano de saneamento Básico;
- Envio de documentos e assinatura Termo de Cooperação IGP;
- Envio documentos do Plano SEDUC.
- Solicitação de Orçamento de equipamentos para a Saúde;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Descrição de características de equipamentos para a Saúde;
- Organização Convênio Emater;
- Organização Convênio Cisa;
- digitalização de documentos dos Comodatos;
- leitura e análise de Minuta de Termo de Fomento para elaboração de Novo Termo da APAE;
- Protocolo 4 manhãs e 1 tarde;
- Solicitação de Orçamento de equipamentos para a Saúde;
- Descrição de características de equipamentos para a Saúde;
- Solicitação Termo de Cooperação Correios Comunitários;
- Solicitação Cartão do Correio.

DIVERSOS

- Participação na Audiência Pública sobre o Plano de saneamento Básico;
- Vistoria no Módulo Sanitário para pagamento a empresa;
- Participação No Leilão de Bens como Membro da Comissão de Avaliação.

Redentora, 31 de julho de 2022.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento
