



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETEMBRO/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área a Ser Construída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....	R\$ 965.277,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$ 40.203,37
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$ 102.046,35
Valor do 3º Termo Aditivo.....	R\$ 66.293,08
Valor do 5º Termo Aditivo.....	R\$ 32.772,30
Valor do 6º Termo Aditivo.....	R\$ 91.939,94
Valor do Reequilíbrio Financeiro.....	R\$ 311.290,92
Valor do 8º Termo Aditivo (Supressão de Valores).....	R\$ 129.899,19
Valor do 10º Termo Aditivo.....	R\$ 31.133,89
Valor Total.....	R\$ 1.511.057,66
Valor Executado.....	R\$ 1.390.665,42

% Acumulado Executado da Obra: **92,03%**

Projeto Acessibilidade (Rampas e Calçadas)

Valor da Licitação.....	R\$ 126.196,72
Valor Executado.....	R\$ 100.256,85

% Acumulado Executado da Obra: **79,44%**

Projeto Esquadrias (Portas e Janelas)

Valor da Licitação.....	R\$ 276.057,80
Valor Executado.....	R\$ 134.916,13

% Acumulado Executado da Obra: **48,87%**

Projeto de Entrada de Energia Elétrica

Valor da Licitação.....	R\$ 68.800,00
Valor Executado.....	R\$ 0,00

% Acumulado Executado da Obra: **0,00%**

Valor Total

Valor Total do Projeto Inicial Ajustado.....	R\$ 1.511.057,66
Valor do Projeto de Acessibilidade (Rampas e Passeio).....	R\$ 126.196,72
Valor do Projeto de Esquadrias (Portas e Janelas).....	R\$ 276.057,80
Valor do Projeto de Entrada de Energia Elétrica.....	R\$ 68.800,00
Valor Total Atualizado.....	R\$ 1.982.112,18
Valor Executado.....	R\$ 1.625.838,40

% Acumulado Executado da Obra: **82,03%**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**

Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....R\$ 450.000,00

Valor Executado pela 1ª Empresa.....R\$ 176.286,85

Valor do Projeto Remanescente.....R\$ 264.705,84

Valor Executado do Projeto Remanescente.....R\$ 228.260,51

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 35.914,94

Valor Executado do Termo Aditivo.....R\$ 35.914,94

Valor Total do Projeto (Projeto Inicial + Projeto Novo + Aditivo)....R\$ 476.653,25

Valor Total Executado (Projeto Inicial + Projeto Novo + Aditivo)....R\$ 440.462,30

Atividades:

- Em fase de Pintura dos Arremates e Limpeza da Obra;

Situação Atual da Obra:

- Executado (contrato atual) **86,23%**


- Executado (aditivo) **100,00%**

- Executado (acumulado) **92,40%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

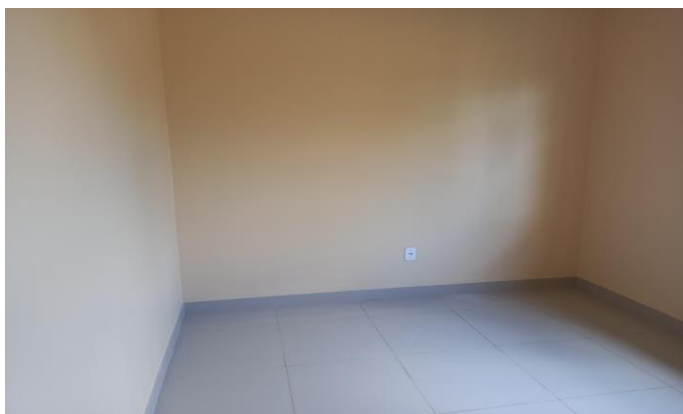

Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação da Escola Municipal Maria Belmont Albert

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 449.232,00

Valor da Licitação.....R\$ 449.232,00

Valor Executado.....R\$ 189.444,69

Percentual Executado: 42,19%

Item:

Construção de 04 Salas de Aula e Sanitários

Atividades

- Em fase de colocação da cobertura e reboco das paredes externas.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 45.484,02

Valor da Licitação.....R\$ 295.484,02

Valor Executado.....R\$ 43.218,50

Percentual Executado: 14,63%

Atividades:

- Realizado Boletim de Medição nº 02 no Valor de R\$ 32.556,75.
- Em fase de Montagem da caixaria para concretagem da viga superior.

Situação Atual da Obra:

- Em Execução.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Concedente**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 115.973,14

Valor da Licitação.....R\$ 402.473,14

Valor Executado.....R\$ 58.478,02

Percentual Executado: 12,59%

Atividades:

- Em fase de levantamento das paredes.

Situação Atual da Obra:

- Em Execução.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Revitalização da Avenida Constante Luiz Gemelli

Recurso: **Municipal**

Valor.....R\$ 513.969,56

Valor da Licitação.....R\$ 478.493,00

Valor Executado.....R\$ 26.178,35

Percentual Executado: 5,47%

Atividades:

- Obra em execução;





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado.....R\$ 182.456,03

Valor da Licitação.....R\$ 149.554,87

Valor Executado.....R\$ 111.085,09

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Erwin Mathaus Braun


Rua Sinfrônio Julio Ribeiro

Atividades:

- Em fase de Pavimentação da Rua Erwin Mathaus Braun
- Realizado Boletim de Medição nº 06 no valor de R\$ 16.374,33
- Realizado Boletim de Medição nº 07 no Valor de R\$ 12.183,17

Situação Atual da Obra:

- Executado **74,28%.**

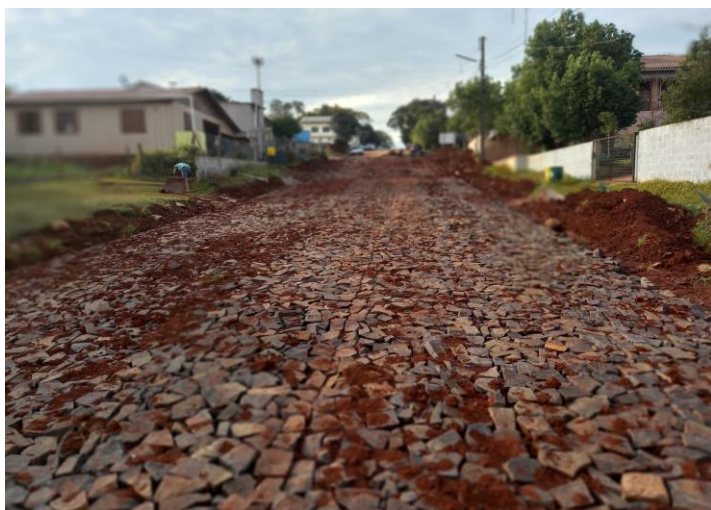



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Prédio do Centro Administrativo Municipal

Recurso: **Municipal**

Valor da Licitação.....	R\$ 352.174,94
Valor do Aditivo de Supressão.....	R\$ 52.131,03
Valor Atualizado do Projeto.....	R\$ 300.043,91
Valor Executado.....	R\$ 300.043,91
Valor do Termo Aditivo	R\$ 74.726,40
Valor Total da Obra.....	R\$ 374.770,31

Percentual Executado: **100,00%.**


Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

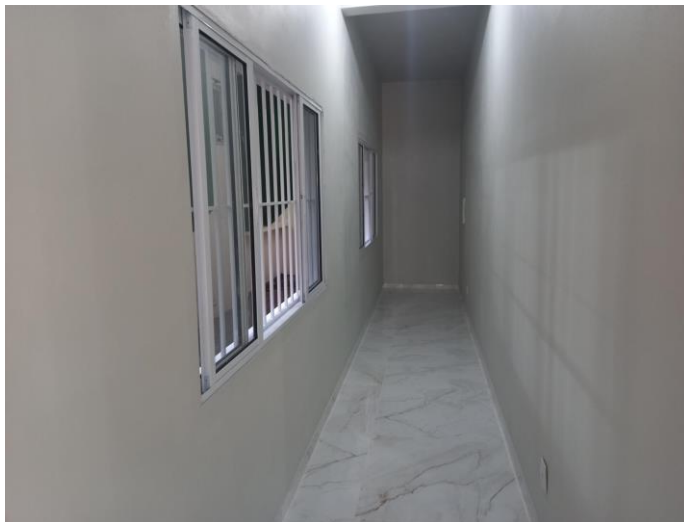

Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação Asfáltica – Perímetro Urbano

Órgão Concedente: **Governo do Estado do Rio Grande do Sul.**

Recurso: **Programa Pavimenta**

Objeto:

Pavimentação Asfáltica

- Trecho da Rua Acelyno Lutz Pinheiro
- Estrada Saída para Coronel Bicaco
- Rua Industrial I

Área a Ser Pavimentada: **8.588m²**

Área a Ser Pavimentada (Aditivo): **1.778,32m²**

Área Total Ser Pavimentada: **10.366,32m²**

Valor Repasse.....	R\$	701.948,40
Valor Contrapartida.....	R\$	218.306,38
Valor da Licitação.....	R\$	920.254,78
Valor Executado.....	R\$	897.069,53
Valor Pago a Empresa.....	R\$	428.306,38
Percentual Executado do Projeto: 100,00%		

Valor do Termo Aditivo.....	R\$	182.234,80
Valor Executado do Termo Aditivo.....	R\$	182.234,80
Valor Pago a Empresa.....	R\$	181.223,32
Percentual Executado do Termo Aditivo: 100,00%		

Valor Total da Obra.....	R\$	1.102.489,58
Valor Total Executado.....	R\$	1.102.489,58
Valor Total Pago a Empresa.....	R\$	609.529,70
Percentual Executado do Total da Obra: 100,00%		

Atividades:

- Recebido os Laudos referente as amostras;
- Aguardando Liberação da 2ª e 3ª Parcelas do Recurso.

Situação:

- Obra Concluída



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Um Galpão das Máquinas na Sub Prefeitura de São João

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 108.024,60

Valor da Licitação.....R\$ 94.895,25

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 4.800,12

Valor Total da Obra.....R\$ 99.695,37

Descrição: **Construção de Um Galpão Para Máquinas na Subprefeitura de São João**

Área: **184,00m²**

Atividades:

- Realizado o Pagamento do valor referente o contrato inicial no valor de R\$ 94.895,25.

Situação:

- Obra Concluída.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Recurso: **Municipal**

Item:

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Valor do Projeto.....R\$ 106.678,63

Valor da Licitação.....R\$ 106.635,75

Valor Executado.....R\$ 106.635,75

Situação Atual da Obra:

- Executado **100,00%.**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00

Itens:

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico (Já Entregue);

01 (uma) Roçadeira Agrícola (Já Entregue);

01 (uma) Carreta Agrícola Metálica Basculante;

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes.

Atividades:

- Realizado a Alteração do Plano de Trabalho, aguardando abertura de Dotação Orçamentária no Orçamento para realizar novo Processo de Licitação.



Roçadeira Agrícola



Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânica



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 466.666,67

Valor da Licitação.....R\$ 465.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira, 4x4, Motor com Potência Mínima de 85HP

Atividades:

- Equipamento Entregue dia 07/07/2022.

Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **044467/2019**

Valor Repasse.....R\$ 146.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 4.800,00

Valor Total.....R\$ 150.800,00

Valor da Licitação.....R\$ 149.150,00

Itens:

02 (duas) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

Situação:

- Concluído





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **023468/2021**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.100,00

Valor Total.....R\$ 332.600,00

Valor da Licitação.....R\$ 332.500,00

Item:

Aquisição de 02 Tratores Agrícolas (75cv)

Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Um Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido

Recurso: **Municipal (Emendas Impositivas Vereadores)**

Valor Total.....R\$ 72.333,33

Valor da Licitação.....R\$ 47.300,00

Itens:

Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido

Atividades:

- Equipamento Entregue pela Empresa.

Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS LICITADOS / Aguardando a Entrega dos Itens

Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 614.166,67

Valor da Licitação.....R\$ 614.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (um) Caminhão Equipado com Caçamba de no Mínimo 12m³

Atividades:

- Processo de Licitação realizado dia 21/07/2022
- Empresa Vencedora IVECO Caminhões

Situação:

- Aguardando Contratação com a empresa vencedora da licitação



Foto Ilustrativa



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM FASE DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **013316/2020**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Bohn Gass**

Valor Repasse.....R\$ 171.900,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.100,00

Valor Total.....R\$ 174.000,00

Item:

01 (uma) Roçadeira Agrícola Articulada;

01 (uma) Plantadeira Plantio Direto 05 Linhas.

Situação:

- Encaminhado ao Setor de Licitações.

Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento de Urgência

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-003**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Total.....R\$ 250.000,00

Item:

01 (um) Equipamento Raio X Fixo Analógico;

01 (uma) Bomba de Infusão;

02 (dois) Carro de Emergência;

01 (um) Carro Maca Avançada;

01 (um) Desfibrilador Convencional;

01 (um) Eletrocardiógrafo;

01 (uma) Mesa de Cabeceira;

01 (um) Monitor Multiparâmetros;

01 (um) Aspirador de Secreção Elétrico Móvel;

01 (um) Computador.

Atividades:

- Aguardando realização do Certame.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.256000/1220-02**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Lasier Martins**

Valor Repasse.....R\$ 80.000,00

Valor Total.....R\$ 80.000,00

Item:

Equipamentos e Material Permanente

06 Computador	01 Notebook
05 Impressora	03 Lanterna Clínica
01 Espaldar em Madeira	01 Detector Fetal
01 Balança Digital Portátil	01 Martelo de Reflexo
02 Escada com 2 Degraus	01 Estetoscópio
02 Andador	04 Mesa Ginecológica
01 Biombo	01 Goniômetro
01 TENS e FES	01 Ultrassom Fisioterapia
01 Cama Elástica Proprioceptiva	06 Exercitador de Mãos e Dedos
03 Fotopolimerizador de Resinas	

Atividades:

- Licitação realizada, aguardando a entrega dos equipamentos.

Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Saúde – Fundo a Fundo**

Valor Repasse.....R\$ 50.000,00

Valor Total.....R\$ 50.000,00

Item:

Equipamentos e Material Permanente

01 Câmara para Conservação de Vacinas, Medicamentos;
01 Eletrocardiógrafo;
01 Monitor de Sinais Vitais;
01 Cilindro para Oxigênio Medicinal 50 Litros
02 Cilindro para Oxigênio Medicinal 7 Litros
04 Cadeiras de Rodas Adulto Dobrável
05 Nebulizador Ultrassônico

Atividades:

- Encaminhado ao Setor de Licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Paradas de Ônibus

Recurso: **Municipal**

Quantidade: **10 Unidades**

Valor.....R\$ 75.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 52.300,00

Atividades:

- Realizado o Processo de Licitação, aguardando contratação.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Execução de Entrada de Energia Elétrica – Hospital Municipal


Recurso: **Municipal**

Valor.....R\$ **75.121,00**




Valor da Licitação.....R\$ **68.800,00**

Atividades:

- Realizado o Processo de Licitação, aguardando contratação.

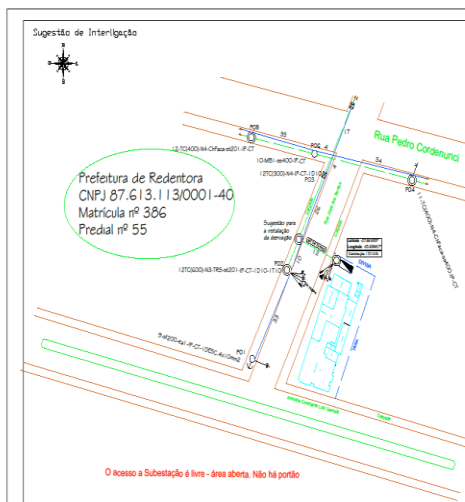

NOTAS:
1) Desenho sem escala, Unidade: mm;
2) Material: chapa de aço galvanizada, Espessura: 1mm;
3) Fundo: pintura branca padrão Munsell N9.5;
4) Textos: Com aplicação de Vinil Adesivo Plotado, Fonte "Univers / Univers Bold", Tamanho mínimo de 30mm, Cor: preto Munsell N1;
5) Pictograma: Com aplicação de Vinil Adesivo Plotado, Cor: Fundo - amarelo Munsell 5Y-8/12, caracteres/ margem - preto Munsell N1;
6) Perigo: Com aplicação de Vinil Adesivo Plotado, Fonte "Univers / Univers Bold", Tamanho mínimo de 30mm, Cor: Fundo - vermelho Munsell SR 4/14, margem - preto Munsell N1, texto branco padrão Munsell N9.5.

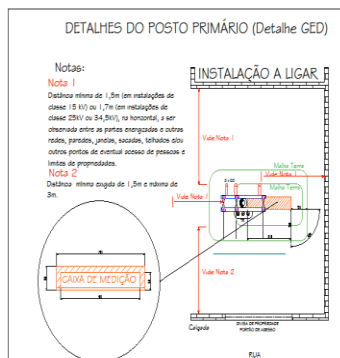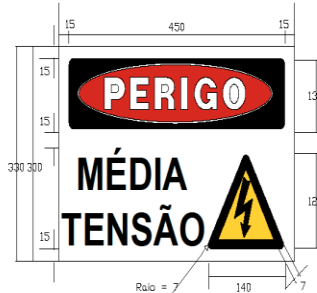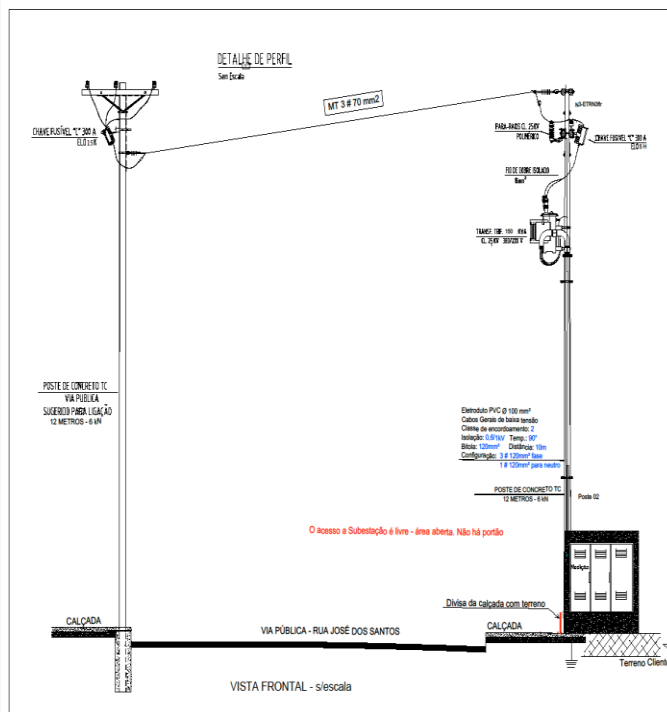

CANTARELLI ENGENHARIA CREA-RS 158.907 Rua Prof. Kennedy, 1118 - Sala 404 - Centro - Redentora/Rio Grande do Sul - CEP 98550-000 - Fone 51 3144 4717	
Requerente: Prefeitura de Redentora Projeto: Nova Ligação - SE 150 kVA Localidade: Rua José dos Santos, 55 - Centro Município: Redentora - RS	
Escala: 1:100	Desenho: Lutz
Data: 30/05/2022	
Folha: 1-A1	
Projeto nº: 062/22	
Responsabilidade Técnica:	
Reg. Técnico: Engº Eletr. Lutz Antônio Cantarelli CREA-RS 48715 CPF 22.494.020-4	
Assinatura: Presidente da Prefeitura CPF 01.011.113.0001-40	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS APROVADOS/RECURSO LIBERADO

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....	R\$	35.374,00
Valor Contrapartida.....	R\$	3.036,00
Valor Total.....	R\$	38.410,00

Item:

Aquisição de 262 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Assinado Termo Aditivo de supressão de 462 sacas para 262 sacas

Situação:

- Aguardando abertura do crédito no Orçamento 2022 para posterior realização da Licitação.

PROPOSTAS CADASTRADAS:

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Heitor Schuch**

Proposta SICONV: **002523/2022**

Valor Repasse.....	R\$	143.250,00
Valor Contrapartida.....	R\$	2.750,00
Valor Total.....	R\$	146.000,00

Itens:

01 (uma) Grade Aradora
01 (uma) Grade Niveladora
01 (uma) Carreta Agrícola com Carroceria de Madeira
01 (uma) Roçadeira Agrícola

Situação:

- Proposta Aprovada, em análise de Plano de Trabalho.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROPOSTAS/Recursos Liberados:

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4296492/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 17/06/2022.**

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4619692/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Total.....R\$ 110.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 18/06/2022.**

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4601602/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Total.....R\$ 200.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 24/06/2022.**

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.460112/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar:

Valor Total.....R\$ 150.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 24/06/2022.**

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4658842/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Pompeo de Mattos**

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 24/06/2022.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETO APROVADO (Em Elaboração do Projeto de Engenharia)

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **052170/2021**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 239.750,00


Objeto: **Pavimentação com Pedras Irregulares na Localidade de Vila São Sebastião**

Atividades:

- Proposta Aprovada / Contrato de Repasse Assinado

Situação:

- Aguardando Solicitação da CEF para elaboração do Projeto de Engenharia.

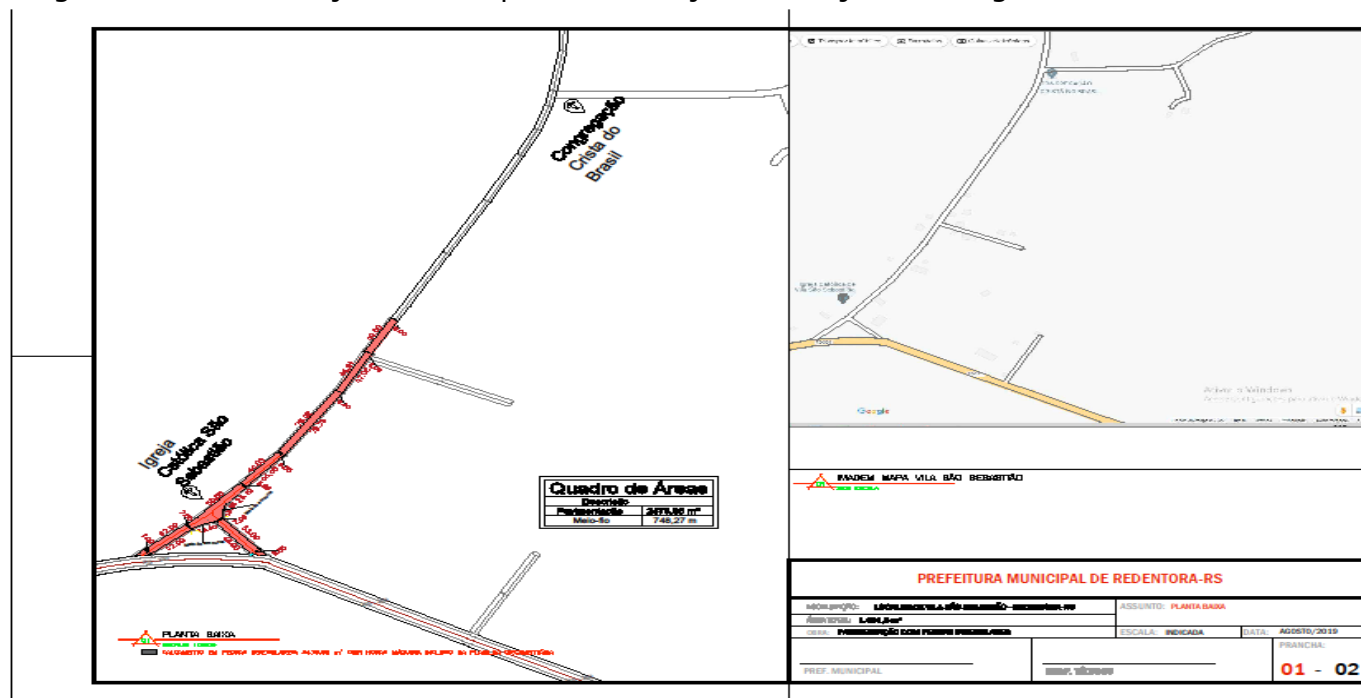



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM ANÁLISE (GOVERNO RS)

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2018/2019**

Valor Repasse.....R\$ 59.009,21

Valor Contrapartida.....R\$ 1.834,87

Valor Total.....R\$ 60.844,08

Item:

Aquisição de 418 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Projeto enviado dia 28/04/2021 para análise da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul.

Situação:

- Aguardando a Aprovação do Plano de Trabalho para posterior realização da Licitação.

Aquisição de Veículo

Órgão Concedente: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano/RS.**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Patrícia Alba**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 10.500,00

Valor Total.....R\$ 110.500,00

Item:

Aquisição de Um Veículo de Pequeno Porte

Atividades:

- Projeto enviado para análise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM ELABORAÇÃO:

Ampliação do Galpão das Máquinas da Secretaria de obras

Recurso: **Municipal**


Item:

Ampliação Da Cobertura do Galpão da Secretaria de Obras

Área Aproximada: 472,70m²

Atividades:

- Aguardando orçamentos das empresas.

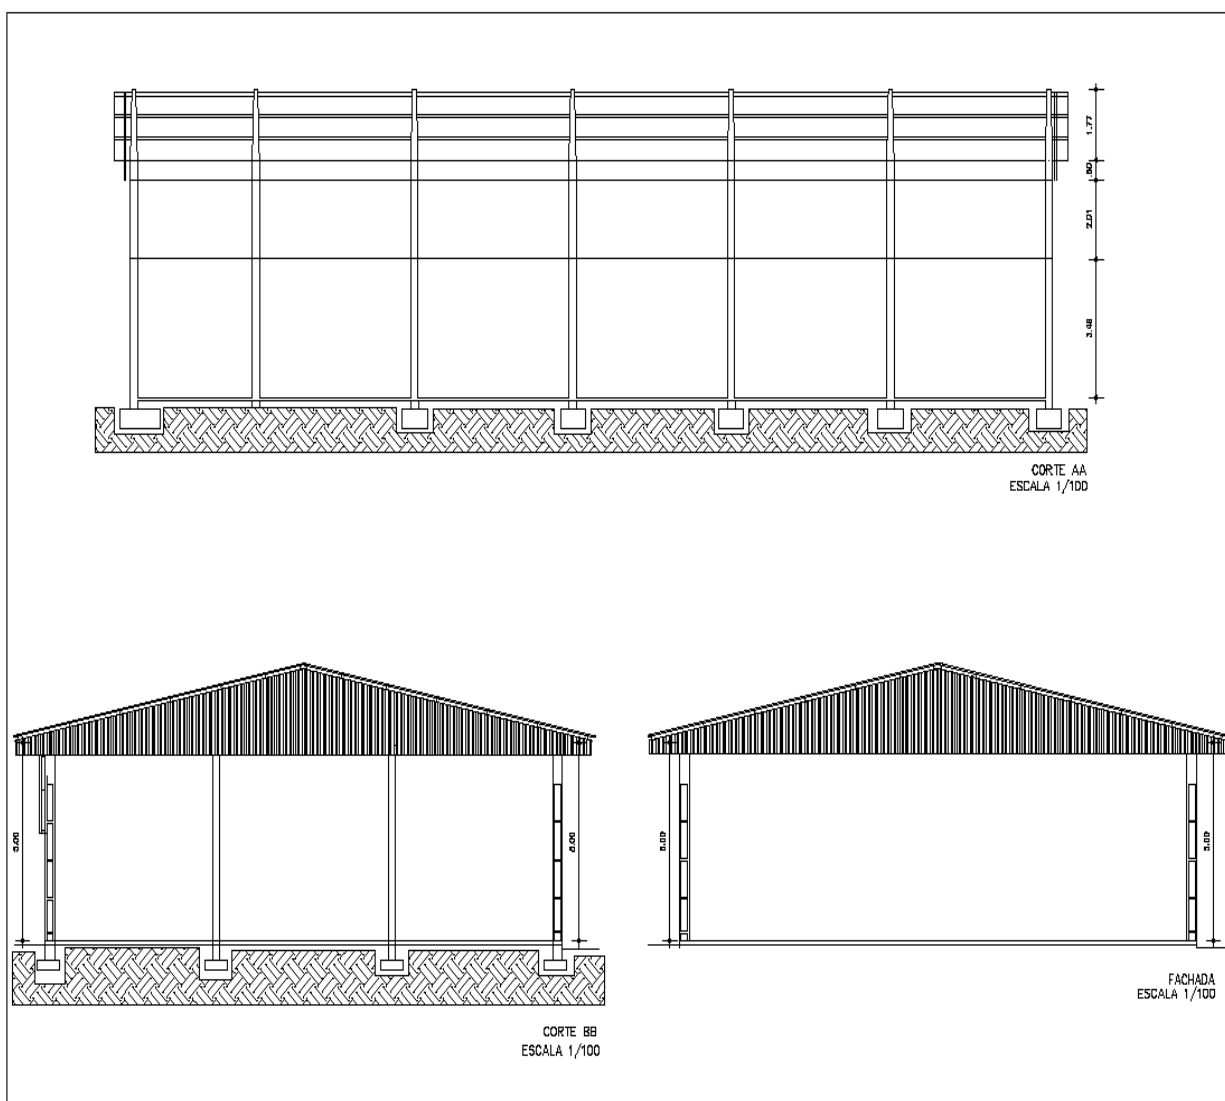



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Perímetro Urbano


Recurso: **Municipal**

Atividades:

- Encaminhada Documentação ao Tabelionato para realizar a localização de parcela na Matrícula

Situação:

- Em fase de elaboração dos mapas da ampliação do perímetro urbano

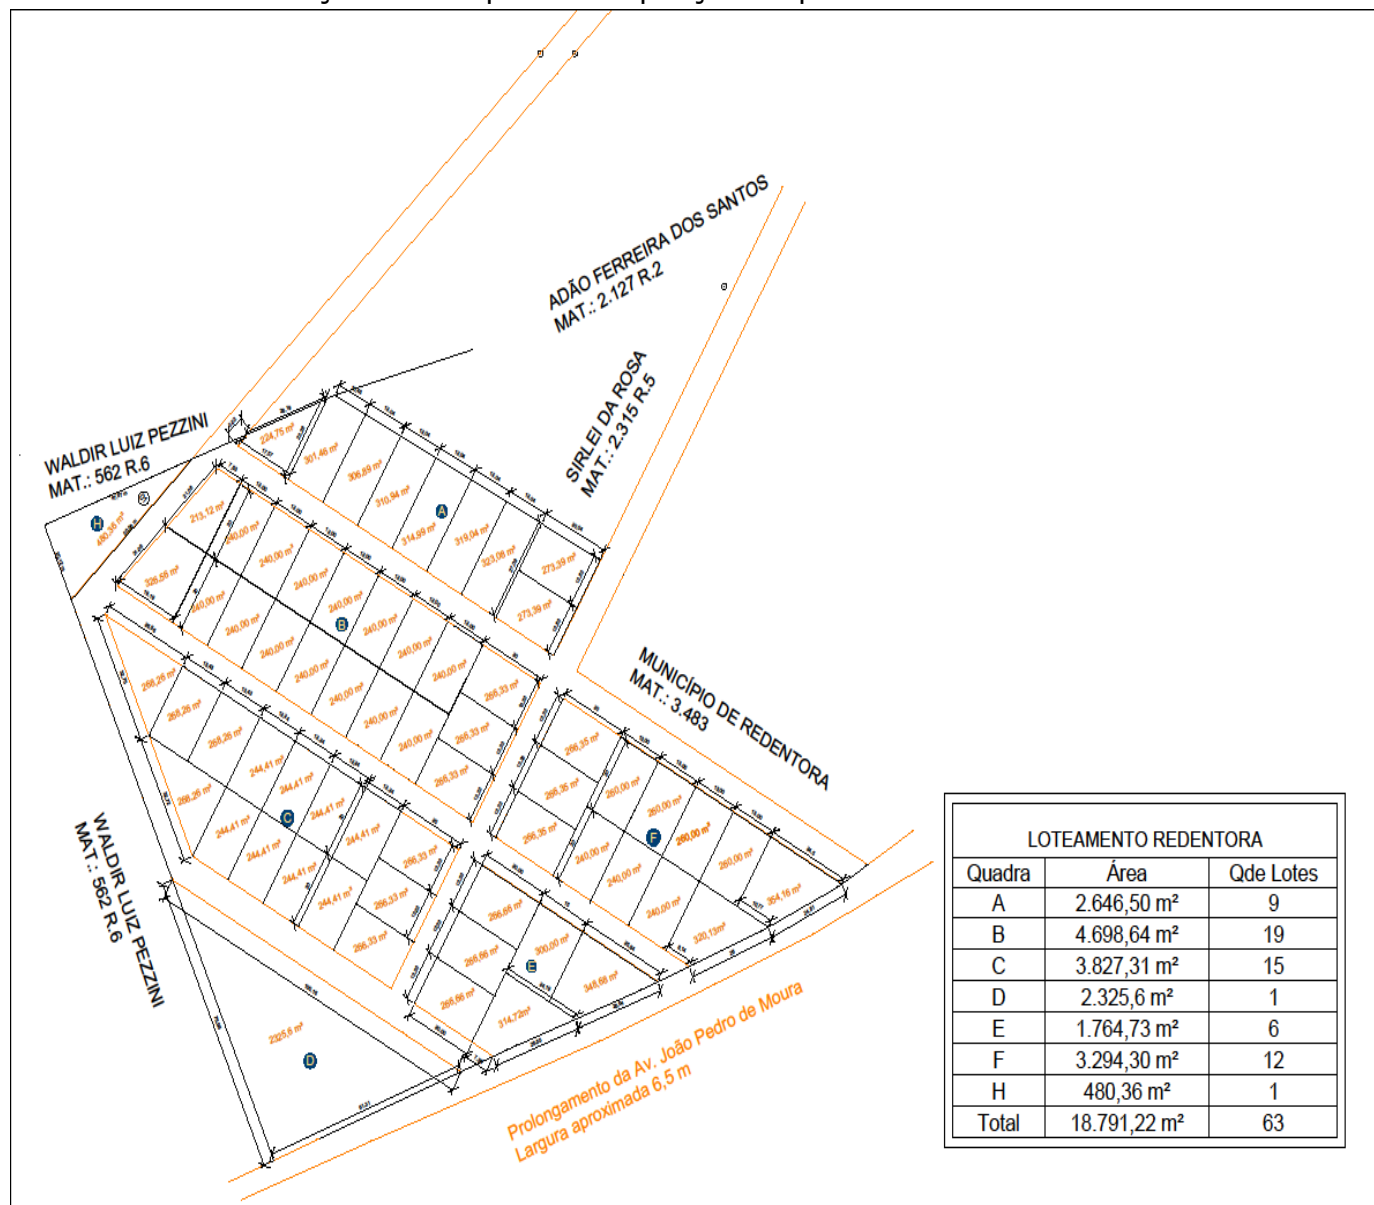



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Um Pórtico no Acesso ao Bairro São José


Recurso: **Municipal**

Objeto:

- Projeto de Construção de um Pórtico em Estrutura Metálica

Atividades:

- Projeto em elaboração

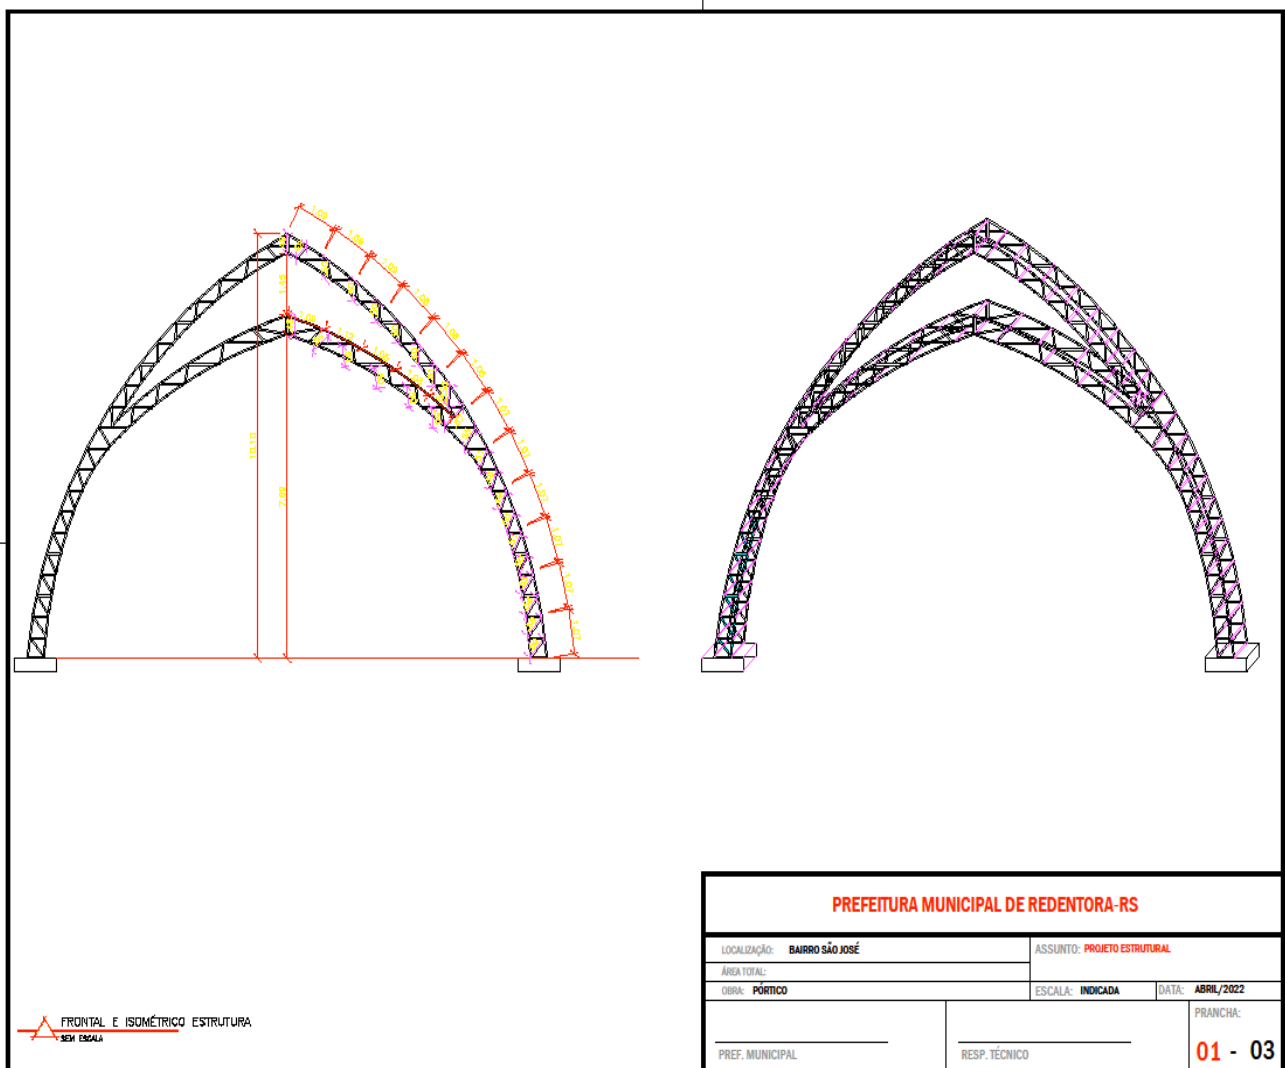



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Revitalização das Calçadas do Prédio do Centro Administrativo

Recurso: **Municipal**


Valor Total.....R\$ 79.971,77

Objeto:

- Revitalização das Calçadas e Acessos ao Prédio do Centro Administrativo.

Atividades:

- Projeto em elaboração

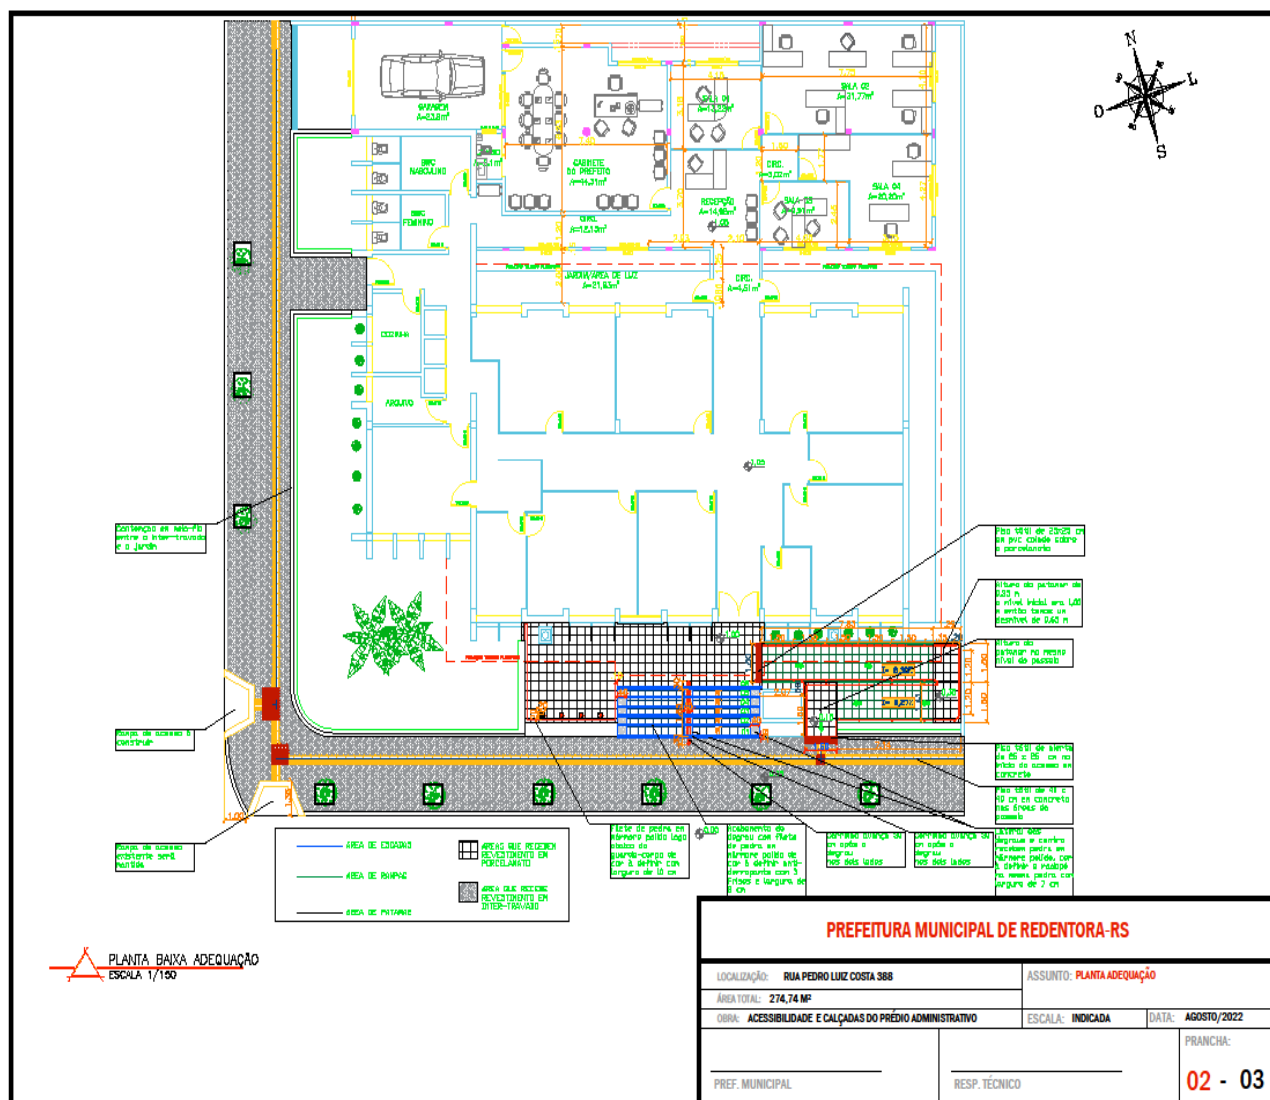



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Execução de Piso de Concreto e Drenagem na Quadra de Esportes

Recurso: **Municipal**


Valor Estimado do Projeto.....R\$ 160.000,00

Objeto:

- Execução de Piso de Concreto na Quadra de Esportes da Praça Arnaldo Roewer.

Atividades:

- Projeto em elaboração

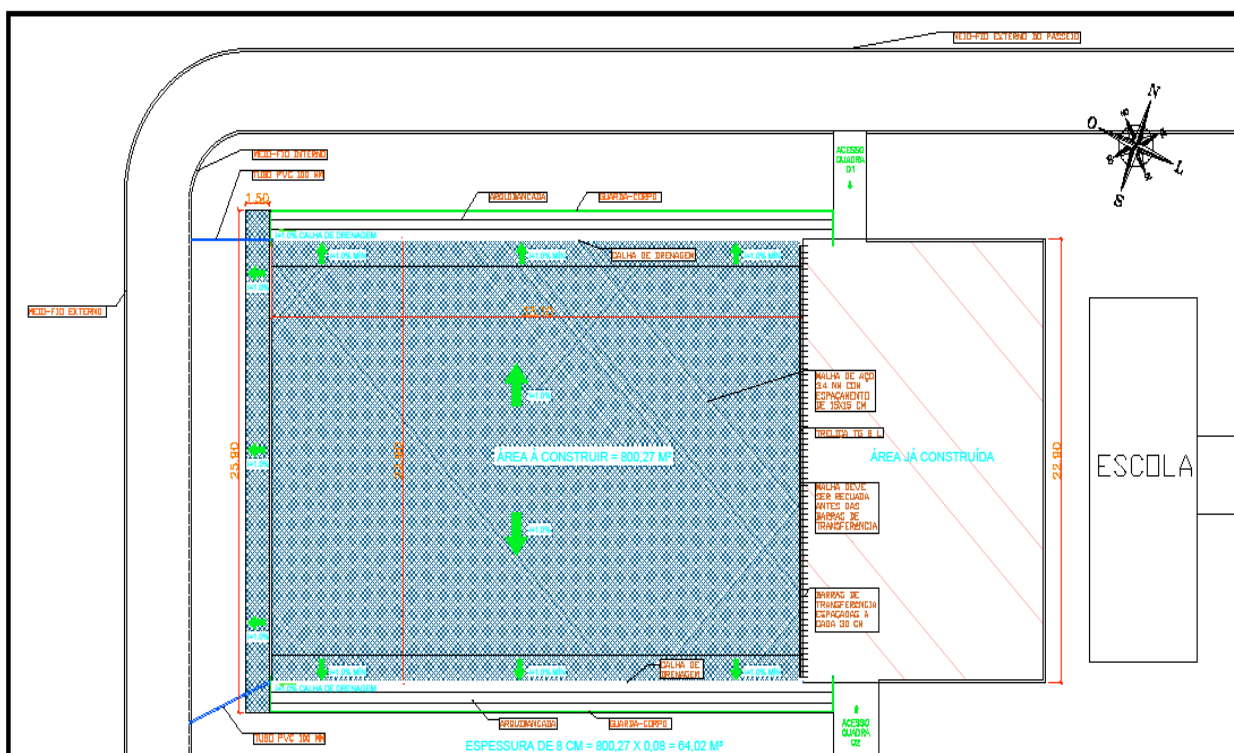

PLANTA BAIXA ÁREA DE CONCRETO - QUADRA POLIESPORTIVA
ESCALA 1/200

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA-RS

LOCALIZAÇÃO: RUA PEDRO LUIZ COSTA - PRAÇA ARNALDO ROEWER	ASSUNTO: PLANTA BAIXA - PISO DE CONCRETO
ÁREA TOTAL: 1.138,17 M²	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO E ADEQUAÇÃO DE QUADRA	ESCALA: INDICADA DATA: SETEMBRO/2022
PREF. MUNICIPAL	RESP. TÉCNICO

PRANCHA:
01 - 01



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Perfuração de Poços

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

Valor Total.....	R\$	70.000,00
Valor da Licitação (Geólogo).....	R\$	4.440,00
Valor da Licitação (Perfuração).....	R\$	45.500,00
Termo Aditivo (Adição) da Licitação (Perfuração).....	R\$	11.000,00
Termo Aditivo (Supressão) da Licitação (Perfuração).....	R\$	2.350,00
Valor Total Utilizado.....	R\$	58.590,00

Item:

Realizada a Perfuração dos Poços Tubulares Profundos (Poços Artesianos)

Situação:

- Projeto concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

Valor.....R\$ 340.585,32

Item:

Implantação de 20 Módulos Sanitários





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Situação:

- Prestação de Contas complementada e enviada para análise.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsólador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Situação:

- Prestação de Contas Enviada para Análise.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SETOR DE ARQUITETURA

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 19 de agosto de 2022 até 26 de agosto de 2022;
- Envio de arquivos solicitados por empresa interessada na participação de licitação, referente a licitação do projeto de Abrigo para Ônibus;
- Análise de projeto para Retificação de lote urbano bem como de suas confrontações, referente descrição na matrícula nº 3.720, protocolo nº 1478/2022;
- Análise de projeto de uma edificação pré-moldada em concreto e alvenaria, destinada ao uso comercial, protocolo nº 1513/2022;
- Resposta ao contato do Rodrigo do Ministério da Cidadania, referente ao andamento da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 e da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019;
- Contato com setor de tributos referente a projeto para Retificação de lote urbano bem como de suas confrontações, referente descrição na matrícula nº 3.720, protocolo nº 1478/2022;
- Aprovação e entrega ao setor de cadastros de projeto para Retificação de lote urbano bem como de suas confrontações, referente descrição na matrícula nº 3.720, protocolo nº 1478/2022;
- Contato com setor de tributos referente a projeto de edificação pré-moldada em concreto e alvenaria, destinada ao uso comercial, protocolo nº 1513/2022;
- Resposta ao contato da empresa Vale engenharia, referente ao Aditivo 01 da Obra do Galpão para máquinas no Distrito São João;
- Elaboração de Justificativas, referente a Montagem de Planilha de Adição e Supressão de itens, referente a montagem de Aditivo 01, da obra de Ampliação do Prédio Administrativo;
- Visita para acompanhamento da obra e da colocação de grade de cercamento, assim como, Relatório Fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (31/08);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (31/08);
- Visita para acompanhamento da obra, conferência no andamento de montagem de armaduras e Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (31/08);



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita para acompanhamento da obra, concretagem de vigas superiores, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (31/08);
- Visita para acompanhamento da obra e da montagem de esquadrias internas, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Reforma e Adequação do Hospital (31/08);
- Visita para acompanhamento da obra, conferência no assentamento de piso intertravado, execução de rampas e definição de área de canteiros, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (31/08);
- Elaboração de plantas arquitetônicas, referente as alterações feitas na obra de Ampliação do Prédio Administrativo, para complementar justificativa de elaboração de aditivo da mesma;
- Resposta ao contato de arquiteto, referente a documentação para aprovação de Projeto de regularização e auxílio no preenchimento de RRT, referente ao mesmo;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (01/09);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Reforma e Adequação do Hospital (01/09);
- Cálculo de percentual, referente ao executado, para montagem de boletim de Medição da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Montagem de Boletim de Medição 03, referente a obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Boletim de Medição 18, da obra da Unidade de Acolhimento;
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 03, da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 18, da obra da Unidade de Acolhimento;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 26 de agosto de 2022 até 02 de setembro de 2022;
- Resposta ao contato de responsável técnico, referente a Projeto de Edificação de Galpão Agrícola, protocolo nº 1476/2022;
- Resposta ao contato de responsável técnico, referente a projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, nº 721/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Análise de projeto de uma edificação pré-moldada em concreto e alvenaria, destinada ao uso comercial, protocolo nº 1513/2022;
- Elaboração e envio de parecer a responsável técnico referente a uma edificação pré-moldada em concreto e alvenaria, destinada ao uso comercial, protocolo nº 1513/2022;
- Análise de projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1496/2022;
- Análise de Projeto de uma Edificação comercial, mista em alvenaria e madeira, protocolo nº 1548/2022;
- Contato com setor de cadastros imobiliários referente a projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1496/2022;
- Contato com setor de cadastros imobiliários referente a Projeto de uma Edificação comercial, mista em alvenaria e madeira, protocolo nº 1548/2022;
- Contato com responsável técnico referente a projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1496/2022;
- Análise de projeto de uma edificação mista, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1543/2022;
- Reanálise, após recebimento de novos arquivos referente a Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1342/2022;
- Reanálise, após parecer e recebimento de novos arquivos, referente a Projeto de Edificação de Galpão Agrícola, protocolo nº 1476/2022;
- Reanálise, após parecer e recebimento de novos arquivos, referente a Projeto de Retificação e desmembramento de lote urbano, protocolo nº 2630/2021;
- Visita para acompanhamento da obra e conferência no andamento de montagem de armaduras para concretagem de vigas baldrame, assim como, relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (06/09);
- Visita para acompanhamento da obra e andamento na montagem de portas internas da obra de Reforma e Adequação do Hospital (06/09);
- Visita para acompanhamento da obra e andamento na instalação de grades, assim como, relatório fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (06/09);
- Resposta ao Contato da empresa responsável a execução de Projeto de Pavimentação;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Assinatura de Alvarás de Construção;
- Elaboração e envio de parecer ao responsável técnico, referente a Projeto de uma Edificação comercial, mista em alvenaria e madeira, protocolo nº 1548/2022;
- Elaboração e envio de parecer ao responsável técnico, referente projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1496/2022;
- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros Imobiliários de referente a Projeto de Edificação de Galpão Agrícola, protocolo nº 1476/2022;
- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros Imobiliários de referente a projeto de uma edificação mista, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1543/2022;
- Visita para acompanhamento da obra, locação de postes decorativos a serem instalados e relatório fotográfico, referente a obra de Revitalização dos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (08/09);
- Visita para acompanhamento da obra e conferência da concretagem de vigas baldrame, assim como, relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (08/09);
- Aprovação de Boletim de Medição 01, na Plataforma Mais Brasil, referente aos serviços iniciais da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019;
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a Projeto de uma Edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1342/2022;
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a Projeto de Retificação e desmembramento de lote urbano, protocolo nº 2630/2021;
- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros Imobiliários de referente a Projeto de uma Edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1342/2022;
- Resposta ao contato de engenheira responsável pela elaboração de PPCI da quadra de Esportes da Praça Municipal;
- Elaboração de Boletim de Medição 01, referente ao Termo Aditivo 01, da Obra de Ampliação do Centro Administrativo (09/09);
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 01, do Termo Aditivo 01, da Obra de Ampliação do Centro Administrativo;
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 01, da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Recebimento de novos arquivos, após envio de parecer, referente a projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1496/2022;
- Elaboração de Termo de Recebimento Definitivo, referente a Obra e Ampliação do Centro Administrativo;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 02 de setembro de 2022 até 09 de setembro de 2022;
- Montagem de tabela para Boletim de Medição, com valores da proposta da empresa responsável pela execução da obra, referente a obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Montagem de Boletim de Medição 01, referente a obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Resposta a engenheira referente a dúvida na aprovação de projeto protocolado anteriormente, pelo qual haverá mudança de lote;
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 01, da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (13/09);
- Visita para acompanhamento da obra e do andamento da montagem de madeiramento para telhado, assim como, relatório fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (13/09);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (13/09);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (13/09);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Reforma e Adequação do Hospital (13/09);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico, referente a obra de Revitalização dos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (13/09);
- Análise e aprovação de Boletim de Medição 02, na Plataforma Mais Brasil, referente aos serviços iniciais da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019;
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 02, da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita para acompanhamento da obra, assim como, conferência na execução de projeto de PPCI e relatório fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (14/09);
- Reanálise, após recebimento de novos arquivos de projeto de edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1496/2022;
- Aprovação e entrega ao Setor de Cadastros Imobiliários de projeto de edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1496/2022;
- Reanálise, após recebimento de novos arquivos de projeto de uma edificação pré-moldada em concreto e alvenaria, destinada ao uso comercial, protocolo nº 1513/2022;
- Visita para acompanhamento da obra e início da colocação de pisos intertravados vermelhos, assim como, relatório fotográfico, referente a obra de Revitalização dos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (15/09);
- Resposta ao contato de morador, referente a aprovação de projeto e entrega ao Setor de Cadastros Imobiliários;
- Resposta e envio de arquivos a empresa solicitante, referente a Tomada de Preço nº 10/2022;
- Visita na quadra de esportes da Praça Municipal, para levantamento de medidas e estudo de formas de viabilizar projeto para construção de piso em concreto polido, formas de nivelamento e escoamento da água;
- Conversa com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a Projeto de retificação e desmembramento do lote urbano nº 482, protocolo nº 1491/2022;
- Conversa com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a dúvida de engenheira sobre mudança de lote a ser construído projeto aprovado anteriormente;
- Resposta ao engenheira referente a dúvida anterior e contato com Setor de Cadastros Imobiliários;
- Aprovação e entrega ao Setor de Cadastros Imobiliários de projeto de uma edificação pré-moldada em concreto e alvenaria, destinada ao uso comercial, protocolo nº 1513/2022;
- Visita para acompanhamento da obra e do andamento na montagem de madeiramento para telhado, assim como, relatório fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (15/09);
- Visita para acompanhamento da obra e de impermeabilização de vigas baldrame, assim como, relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (15/09);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico, referente a obra de Revitalização dos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (15/09);



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Conversa com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a particularidades do Projeto de retificação e desmembramento do lote urbano nº 482, protocolo nº 1491/2022, assim como assessoramento na elaboração de parecer;
- Elaboração e envio ao responsável técnico, de parecer após análise, referente a Projeto de retificação e desmembramento do lote urbano nº 482, protocolo nº 1491/2022;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 09 de setembro de 2022 até 16 de setembro de 2022;
- Análise de Projeto de Regularização de construção de edificação de Uso misto, residencial e comercial, com área de 298 m², protocolo nº 1574/2022;
- Análise de projeto de Unificação e Desmembramento de dois lotes urbanos, protocolo nº 1546/2022;
- Análise de Projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 1575/2022;
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a projeto de Regularização de construção de edificação de Uso misto, residencial e comercial, com área de 298 m², protocolo nº 1574/2022;
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a projeto de Unificação e Desmembramento de dois lotes urbanos, protocolo nº 1546/2022;
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a Projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 1575/2022;
- Contato com responsável técnico, referente a de Projeto de Regularização de construção de edificação de Uso misto, residencial e comercial, com área de 298 m², protocolo nº 1574/2022;
- Aprovação e entrega a Setor de Cadastros Imobiliários de Projeto de Unificação e Desmembramento de dois lotes urbanos, protocolo nº 1546/2022;
- Elaboração de parecer, após análise e envio ao responsável técnico, referente a Projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 1575/2022;
- Resposta ao contato de eletricitista, responsável pela execução de parte elétrica, referente ao Projeto de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Envio de arquivos a empresa solicitante, referente a tomada de Preço nº 10/2022;
- Conferência de informações no Memorial Descritivo para compatibilização com obra, referente a obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Reanálise, após recebimento de novos arquivos de Projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 1575/2022;
- Aprovação e entrega ao Setor de Cadastros Imobiliários de Projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 1575/2022;
- Recebimento de novos arquivos, após contato com responsável técnico, referente a Projeto de Regularização de construção de edificação de Uso misto, residencial e comercial, com área de 298 m², protocolo nº 1574/2022;
- Resposta a contato do Setor de Cadastros Imobiliários, referente a requerimento de Projeto com aprovação 34/2022, Edificação mista, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1543/2022;
- Contato com responsável técnico, referente a mudança no requerimento de Projeto de Edificação mista, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1543/2022;
- Visita para acompanhamento da obra e do andamento da montagem de madeiramento para telhado, assim como, relatório fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (22/09);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (22/09);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (22/09);
- Visita para acompanhamento da obra e acompanhamento na execução de esquadrias, referente a obra de Reforma e Adequação do Hospital (22/09);
- Visita para acompanhamento da obra e posição de colocação de novo poste de luz, assim como, relatório fotográfico, referente a obra de Revitalização dos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (22/09);
- Visita para verificação de alinhamento de postes elétricos, instalados em rua do município;
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (22/09);
- Assinatura de Alvarás de Construção;
- Reanálise, após recebimento de novos arquivos, referente a Projeto de Regularização de construção de edificação de Uso misto, residencial e comercial, com área de 298 m², protocolo nº 1574/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Contato com setor de cadastros imobiliários, referente a de Projeto de Regularização de construção de edificação de Uso misto, residencial e comercial, com área de 298 m², protocolo nº 1574/2022;
- Contato com responsável técnico, referente a de Projeto de Regularização de construção de edificação de Uso misto, residencial e comercial, com área de 298 m², protocolo nº 1574/2022;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 16 de setembro de 2022 até 23 de setembro de 2022;
- Elaboração e envio de parecer ao responsável técnico, assim como, assessoramento ao mesmo, referente a Projeto de Regularização de construção de edificação de uso misto, residencial e comercial, com área de 298 m², protocolo nº 1574/2022;
- Resposta a responsável técnico referente a projeto de regularização residencial que não respeita os recuos frontais da legislação atual;
- Visita na obra e resposta a dúvidas do prefeito referente a colocação de divisórias internas na obra de ampliação do Centro Administrativo;
- Resposta a empresa responsável pela execução da obra de ampliação da Escola Maria Belmont Albert, referente a escolha entre vidro canalado e vidro simples nas janelas da obra assim como, conferência no memorial de cálculo e orçamento;
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (27/09);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (27/09);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (27/09);
- Visita para acompanhamento da obra e retoques finais, assim como, relatório fotográfico, referente a obra da Unidade de Acolhimento (27/09);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico, referente a obra de Revitalização dos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (27/09);
- Assessoramento a responsável técnico, referente a projeto de retificação de lote urbano, e localização de benfeitoria no mesmo;
- Análise e aprovação referente a itens solicitados pela empresa responsável pela execução da obra, na Plataforma Mais Brasil, para elaboração de Boletim de Medição 02, da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 02, da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914;
- Assessoramento de dúvidas de responsável técnico, referente a aprovação de projetos de Retificação e Unificação de lotes urbanos;
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (29/09);
- Visita para acompanhamento da obra e acompanhamento na instalação de esquadrias, referente a obra de Reforma e Adequação do Hospital (29/09);
- Recebimento de novos arquivos, após envio de parecer ao responsável técnico, referente a Projeto de Regularização de construção de edificação de Uso misto, residencial e comercial, com área de 298 m², protocolo nº 1574/2022;
- Cálculo de percentual executado de itens, para elaboração de Boletim de Medição 04 da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Elaboração de Boletim de medição 04, referente a obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (29/09);
- Resposta a contato com responsável técnico referente a área mínima e testada mínima de lotes urbanos;
- Pesquisa nas leis municipais como plano diretor, código de edificações e lei que dispõe sobre loteamentos, para resposta a dúvida de responsável técnico;
- Conversa com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a legislação de dimensões de área mínima para desmembramento de lotes urbanos no município;
- Resposta a responsável técnico e envio de número de lei, referente a área mínima e testada mínima de lotes urbanos para aprovação de projetos de desmembramento no município;
- Elaboração de relatório fotográfico, referente a Boletim de Medição 04, da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Reanálise, após recebimento de novos arquivos, de Projeto de Regularização de construção de edificação de Uso misto, residencial e comercial, com área de 298 m², protocolo nº 1574/2022;
- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros Imobiliários, de Projeto de Regularização de construção de edificação de Uso misto, residencial e comercial, com área de 298 m², protocolo nº 1574/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SETOR DE ENGENHARIA

- Projeto de calçamento em pavimentação irregular da Vila São Sebastião sem horas máquina;
- Planilha Orçamentária do projeto em pavimentação irregular da Vila São Sebastião sem horas máquina;
- Memorial de cálculo do projeto em pavimentação irregular da Vila São Sebastião sem horas máquina;
- Projeto de calçamento em pavimentação irregular da Vila São Sebastião com horas máquina;
- Planilha Orçamentária do projeto em pavimentação irregular da Vila São Sebastião com horas máquina;
- Memorial de cálculo do projeto em pavimentação irregular da Vila São Sebastião com horas máquina;
- Montagem de Planilha Orçamentária para abertura de licitação da entrada de energia do hospital municipal de subestação com transformador de 150 kva;
- Especificação de projeto de portas e janelas para a construtora palmitinho na execução de área do raio-x e nutrição e dietética;
- Projeto e levantamento quantitativo de peça 3x4 m incluso banheiro de 1,20x 2,00 levantamento de madeiramento e cobertura em brasilit, para benefício eventual, beneficiária SINARA;
- Verificação de proposta de reequilíbrio encaminhada pelo setor jurídico, contrato 060/2021 da proposta de reequilíbrio do contrato 883414 do Vestiário alambrado e muro de modernização do estádio municipal parte 02 contendo 161 itens;
- Montagem do Boletim de medição 18 da Unidade de Acolhimento;
- Atualização e montagem de nova RRE da Unidade de acolhimento;
- Ofício GIGOV referente à medição 18 da Unidade de Acolhimento;
- Visita na obra da unidade de acolhimento;
- Visita nas obras de reforma e modernização do estádio municipal para verificar armaduras da viga baldrame e elevação de alvenaria;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita na obra de ampliação da escola maria belmont albert para verificar concretagem da cinta de amarração superior;
- Visita na obra de reforma e adequação do hospital municipal, para verificar a instalação de esquadrias e finalização da escadaria do raio-x.
- Alteração da RRE da Unidade de Acolhimento, ajuste nas medições e do ofício;
- Alteração da RRE da Unidade de Acolhimento, ajuste nas medições e do ofício conforme arquivos de medições anteriores;
- Montagem da RRE do contrato 892538 para primeira medição do contrato da área social e pórtico e ofício gigov;
- Alteração da RRE da Unidade de Acolhimento, ajuste nas medições e do ofício conforme medições arquivadas no setor de planejamento;
- Montagem de memorando para o setor jurídico referente à resposta da proposta de reequilíbrio do contrato 060/2021;
- Estudo da Resolução DNIT 031/2006 ES para montagem de relatório de obra de pavimento asfáltico pelo método Rotarex para os corpos de prova 09;06;05;
- Estudo da Resolução ANP Nº 10 de 11.7.2005 DOU para montagem de relatório de obra de pavimento asfáltico por características Marshall para os corpos de prova 09;06;05;
- Montagem de Relatório de obra de pavimentação asfáltica de espessuras de projeto por tratamento estatístico para a amostragem de 9 corpos de prova com cálculo de desvio padrão amostral;
- Medição 01 da instalação de portas com revestimento melamínico da obra de reforma e adequação do hospital municipal com relatório fotográfico;
- Visita na obra do hospital municipal para verificar a instalação de esquadrias de madeiras e finalização da escada da área de acesso ao raio-x;
- Visita na obra da Revitalização dos Canteiros municipais para ajuste de posicionamento da caixa de passagem e postes de luz;
- Visita na obra da Unidade de acolhimento para verificar a instalação de grades do entorno do prédio para liberação de medição;
- Visita na obra de reforma e adequação do hospital municipal para verificar a instalação de esquadrias e montar relatório fotográfico;
- Relatório fotográfico da Medição 01 da instalação de portas com revestimento melamínico da obra de reforma e adequação do hospital municipal;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita na obra da Revitalização dos Canteiros municipais para verificar instalação de blocos inter-travados vermelhos;
- Localização via mapa da Vila São Sebastião e da área à ser pavimentada para envio para o Daer;
- Medição da quadra municipal na praça pública para adequação e criação de projeto de reforma;
- Visita na obra da Unidade de acolhimento para verificar a instalação dos portões e a instalação do PPCI;
- Estudo de pavimentação asfáltica para engenharia e Classificação dos tipos de pavimentos em CBUQ;
- Análise de amostras de CBUQ pelas especificações gerais do DAER-RS de 1998 - Concreto asfáltico;
- Análise de CBUQ com cimentos asfálticos diferentes e comparativo da faixa A de projeto (DAER-RS) com a faixa B (DNIT);
- Medição 02 da área social e pórtico da obra de modernização do estádio municipal;
- Visita na obra da ampliação da escola Maria Belmont Albert para verificar montagem de madeiramento da cobertura;
- Visita na obra da modernização do estádio municipal para verificar impermeabilização de vigas baldrame (fundação rasa);
- Visita na obra de reforma e adequação do hospital municipal para verificar a instalação das esquadrias de alumínio (portas e janelas);
- Projeto de construção da quadra da praça Arnaldo Roever, com adequação de quadra de futsal oficial e quadra de vôlei oficial – folhas 01 e 02;
- Visita na obra da Revitalização dos Canteiros municipais;
- Visita na obra da ampliação da escola Maria Belmont Albert para verificar montagem de madeiramento da cobertura;
- Visita na obra da modernização do estádio municipal para verificar andamento da obra;
- Visita na Rua Alberto Pasqualini para verificar alinhamento de postes da rede para empresa PROCEL;
- Auxílio na demarcação de ponto de antena digital nas dependências da SMAS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita na obra de reforma e adequação do hospital municipal para verificar a instalação de esquadrias e montar relatório fotográfico;
- Visita na obra de reforma e adequação do hospital municipal para verificar as medidas das tesouras e barrilete da cobertura para a empresa responsável pelo projeto de climatização;
- Levantamento fotográfico de áreas de Limpeza e Manutenção do Hospital Municipal para envio à construtora palmitinho LTDA;
- Montagem de medição 02 das esquadrias, janelas em alumínio e porta;
- Folha de projeto com eixos da estrutura metálica da cobertura do hospital municipal, envio ao Eng. Marcos do projeto de climatização;
- Relatório fotográfico da Medição 02 da instalação de janelas em alumínio da obra de reforma e adequação do hospital municipal;
- Visita na obra da Revitalização dos Canteiros municipais;
- Projeto da Obra da quadra poliesportiva da Praça Arnaldo Roever;
- Montagem de Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-financeiro da Obra da quadra poliesportiva da praça Arnaldo Roever;
- Visita na obra da Unidade de acolhimento para verificar acabamento final da obra;
- Montagem de RRE da modernização do estádio CR 883914 PARTE II e Ofício GIGOV ;
- Contato com a empresa de redes de proteção para orçamento das redes esportivas da quadra Arnaldo Roever;
- Visita na obra da ampliação da escola Maria Belmont Albert para verificar serviço de emboço externo e finalização da coberta;
- Visita na obra da modernização do estádio municipal para verificar levantamento de alvenaria.

Redentora, 30 de setembro de 2022.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento
