



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

AGOSTO/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área a Ser Construída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....	R\$ 965.277,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$ 40.203,37
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$ 102.046,35
Valor do 3º Termo Aditivo.....	R\$ 66.293,08
Valor do 5º Termo Aditivo.....	R\$ 32.772,30
Valor do 6º Termo Aditivo.....	R\$ 91.939,94
Valor do Reequilíbrio Financeiro.....	R\$ 311.290,92
Valor do 8º Termo Aditivo (Supressão de Valores).....	R\$ 129.899,19
Valor do 10º Termo Aditivo.....	R\$ 31.133,89
Valor Total.....	R\$ 1.511.057,66
Valor Executado.....	R\$ 1.390.665,42

% Acumulado Executado da Obra: **92,03%**

Projeto Acessibilidade (Rampas e Calçadas)

Valor da Licitação.....	R\$ 126.196,72
Valor Executado.....	R\$ 100.256,85

% Acumulado Executado da Obra: **79,44%**

Projeto Esquadrias (Portas e Janelas)

Valor da Licitação.....	R\$ 276.057,80
Valor Executado.....	R\$ 0,00

% Acumulado Executado da Obra: **0,00%**

Valor Total

Valor Total do Projeto Inicial Ajustado.....	R\$ 1.511.057,66
Valor do Projeto de Acessibilidade (Rampas e Passeio).....	R\$ 126.196,72
Valor do Projeto de Esquadrias (Portas e Janelas).....	R\$ 276.057,80
Valor Total Atualizado.....	R\$ 1.913.312,18
Valor Executado.....	R\$ 1.490.922,27

% Acumulado Executado da Obra: **77,92%**

Atividades:

- Em fase de colocação do piso cerâmico nas rampas de acesso e área externo nos fundos.
- Em fase de colocação do Piso Tátil nas Calçadas;
- Em Fase de Início de Colocação das Portas Internas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Prédio do Centro Administrativo Municipal

Recurso: **Municipal**

Valor da Licitação.....R\$ 352.174,94

Valor do Aditivo de Supressão.....R\$ 52.131,03

Valor Atualizado do Projeto.....R\$ 300.043,91

Valor Executado.....R\$ 300.043,91

Percentual Executado do Projeto Inicial: **100,00%.**

Valor do Termo AditivoR\$ 74.726,40

Valor Total da Obra.....R\$ 374.770,31

Atividades:

- Realizado Planilha de Aditivo de Supressão no valor de R\$ 52.131,03;
- Realizado Planilha de Aditivo de Adição no valor de R\$ 74.726,40.

Situação:

- Executado **100,00%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**

Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....R\$ 450.000,00

Valor Executado pela 1ª Empresa.....R\$ 176.286,85

Valor do Projeto Remanescente.....R\$ 264.705,84

Valor Executado do Projeto Remanescente.....R\$ 193.209,75

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 35.914,94

Valor Executado do Termo Aditivo.....R\$ 35.914,94

Valor Total do Projeto (Projeto Inicial + Projeto Novo + Aditivo)....R\$ 476.653,25

Valor Total Executado (Projeto Inicial + Projeto Novo + Aditivo)....R\$ 405.657,16

Atividades:

- Aguardando a Instalação das Grades e Portões.

Situação Atual da Obra:

- Executado (contrato atual) **72,99%**


- Executado (aditivo) **100,00%**

- Executado (acumulado) **85,10%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

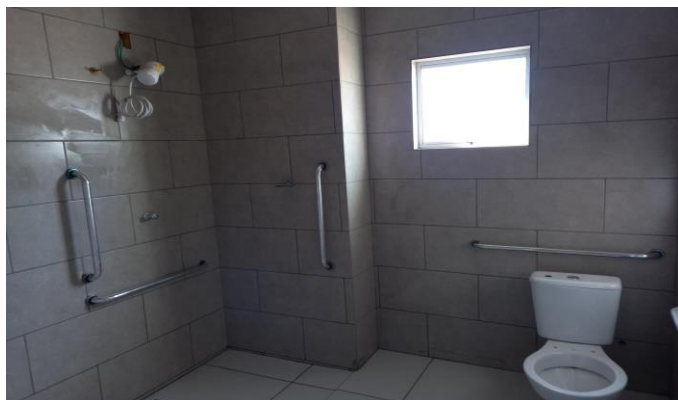

Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado.....R\$ 182.456,03

Valor da Licitação.....R\$ 149.554,87

Valor Executado.....R\$ 111.085,09

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Erwin Mathaus Braun


Rua Sinfrônio Julio Ribeiro

Atividades:

- Em fase de Pavimentação da Rua Erwin Mathaus Braun
- Realizado Boletim de Medição nº 06 no valor de R\$ 16.374,33
- Realizado Boletim de Medição nº 07 no Valor de R\$ 12.183,17

Situação Atual da Obra:

- Executado **74,28%.**

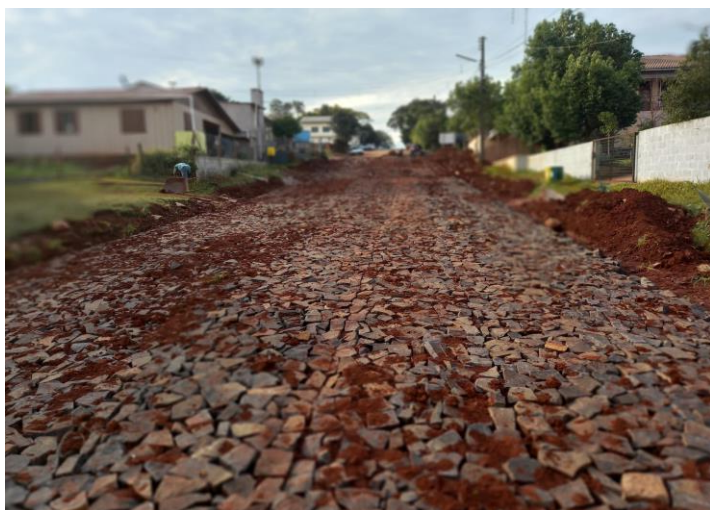



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação Asfáltica – Perímetro Urbano

Órgão Concedente: **Governo do Estado do Rio Grande do Sul.**

Recurso: **Programa Pavimenta**

Objeto:

Pavimentação Asfáltica

- Trecho da Rua Acelyno Lutz Pinheiro
- Estrada Saída para Coronel Bicaco
- Rua Industrial I

Área a Ser Pavimentada: **8.588m²**

Área a Ser Pavimentada (Aditivo): **1.778,32m²**

Área Total Ser Pavimentada: **10.366,32m²**

Valor Repasse.....R\$ 701.948,40

Valor Contrapartida.....R\$ 218.306,38

Valor da Licitação.....R\$ 920.254,78

Valor Executado.....R\$ 897.069,53

Valor Pago a Empresa.....R\$ 428.306,38

Percentual Executado do Projeto: 100,00%

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 182.234,80

Valor Executado do Termo Aditivo.....R\$ 182.234,80

Valor Pago a Empresa.....R\$ 181.223,32

Percentual Executado do Termo Aditivo: 100,00%

Valor Total da Obra.....R\$ 1.102.489,58

Valor Total Executado.....R\$ 1.102.489,58

Valor Total Pago a Empresa.....R\$ 609.529,70

Percentual Executado do Total da Obra: 100,00%

Atividades:

- Recebido os Laudos referente as amostras;
- Aguardando Liberação da 2ª e 3ª Parcelas do Recurso.

Situação:

- Obra Concluída



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação da Escola Municipal Maria Belmont Albert

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 449.232,00

Valor da Licitação.....R\$ 449.232,00

Valor Executado.....R\$ 105.407,46

Percentual Executado: 23,47%

Item:

Construção de 04 Salas de Aula e Sanitários

Atividades:

- Emitido Boletim de Medição nº 01 no valor de R\$ 50.895,71;
- Realizado Boletim de Medição nº 02 no Valor de R\$ 54.511,75

Situação:

- Em Execução





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 45.484,02

Valor da Licitação.....R\$ 295.484,02

Valor Executado.....R\$ 10.661,75

Percentual Executado: 3,61%

Atividades:

- Em fase de Concretagem das vigas;
- Realizado Boletim de Medição nº 01 no valor de R\$ 10.661,75;

Situação Atual da Obra:

- Em Execução.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Concedente**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 115.973,14

Valor da Licitação.....R\$ 402.473,14

Atividades:

- Em fase de escavação dos buracos das sapatas.

Situação Atual da Obra:

- Em Execução





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Revitalização da Avenida Constante Luiz Gemelli

Recurso: **Municipal**

Valor.....R\$ 513.969,56

Valor da Licitação.....R\$ 478.493,00

Item:

Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli

Atividades:

- Obra iniciada em 25/07/2022.

Situação Atual da Obra:

- Aguardando início da obra.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Um Galpão das Máquinas na Sub Prefeitura de São João

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 108.024,60

Valor da Licitação.....R\$ 94.895,25

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 4.800,12

Valor Total da Obra.....R\$ 99.695,37

Descrição: **Construção de Um Galpão Para Máquinas na Subprefeitura de São João**

Área: **184,00m²**

Atividades:

- Realizado o Pagamento do valor referente o contrato inicial no valor de R\$ 94.895,25.

Situação:

- Obra Concluída.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Recurso: **Municipal**

Item:

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Valor do Projeto.....R\$ 106.678,63

Valor da Licitação.....R\$ 106.635,75

Valor Executado.....R\$ 106.635,75

Atividades:

- - Em fase de elaboração do Termo Aditivo da Obra R\$ 21.317,39

Situação Atual da Obra:

- Executado **100,00%.**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00

Itens:

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico.

02 (duas) Carretas Basculantes

01 (uma) Roçadeira Agrícola

Atividades:

- Solicitado às empresas a entrega dos equipamentos;

- Recebido pedido da Empresa (Item Carretas) de Reequilíbrio Financeiro.



Roçadeira Agrícola





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânica

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 466.666,67

Valor da Licitação.....R\$ 465.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira, 4x4, Motor com Potência Mínima de 85HP

Atividades:

- Equipamento Entregue dia 07/07/2022.

Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **044467/2019**

Valor Repasse.....R\$ 146.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 4.800,00

Valor Total.....R\$ 150.800,00

Valor da Licitação.....R\$ 149.150,00

Itens:

02 (duas) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

Situação:

- Equipamentos Recebidos





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **023468/2021**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.100,00

Valor Total.....R\$ 332.600,00

Valor da Licitação.....R\$ 332.500,00

Item:

Aquisição de 02 Tratores Agrícolas (75cv)

Situação:

- Recurso Liberado





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Um Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido

Recurso: **Municipal (Emendas Impositivas Vereadores)**

Valor Total.....R\$ 72.333,33

Valor da Licitação.....R\$ 47.300,00

Itens:

Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido

Atividades:

- Equipamento Entregue pela Empresa.

Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS LICITADOS / Aguardando a Entrega dos Itens

Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 614.166,67

Valor da Licitação.....R\$ 614.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (um) Caminhão Equipado com Caçamba de no Mínimo 12m³

Atividades:

- Processo de Licitação realizado dia 21/07/2022
- Empresa Vencedora IVECO Caminhões

Situação:

- Aguardando Contratação com a empresa vencedora da licitação



Foto Ilustrativa



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM FASE DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO

Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento de Urgência

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-003**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Total.....R\$ 250.000,00

Item:

01 (um) Equipamento Raio X Fixo Analógico;	01 (uma) Bomba de Infusão;
02 (dois) Carro de Emergência;	01 (um) Carro Maca Avançada;
01 (um) Desfibrilador Convencional;	01 (um) Eletrocardiógrafo;
01 (uma) Mesa de Cabeceira;	01 (um) Monitor Multiparâmetros;
01 (um) Aspirador de Secreção Elétrico Móvel;	01 (um) Computador.

Atividades:

- Aguardando realização do Certame.

Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.256000/1220-02**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Lasier Martins**

Valor Repasse.....R\$ 80.000,00

Valor Total.....R\$ 80.000,00

Item:

Equipamentos e Material Permanente

06 Computador	01 Notebook
05 Impressora	03 Lanterna Clinica
01 Espalдар em Madeira	01 Detector Fetal
01 Balança Digital Portátil	01 Martelo de Reflexo
02 Escada com 2 Degraus	01 Estetoscópio
02 Andador	04 Mesa Ginecológica
01 Biombo	01 Goniômetro
01 TENS e FES	01 Ultrassom Fisioterapia
01 Cama Elástica Proprioceptiva	06 Exercitador de Mãos e Dedos
03 Fotopolimerizador de Resinas	

Atividades:

- Encaminhado Projeto ao Setor de Licitações.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Paradas de Ônibus


Recurso: **Municipal**

Quantidade: **10 Unidades**

Valor.....**R\$ 75.000,00**

Atividades:

- Encaminhado ao Setor de Licitações

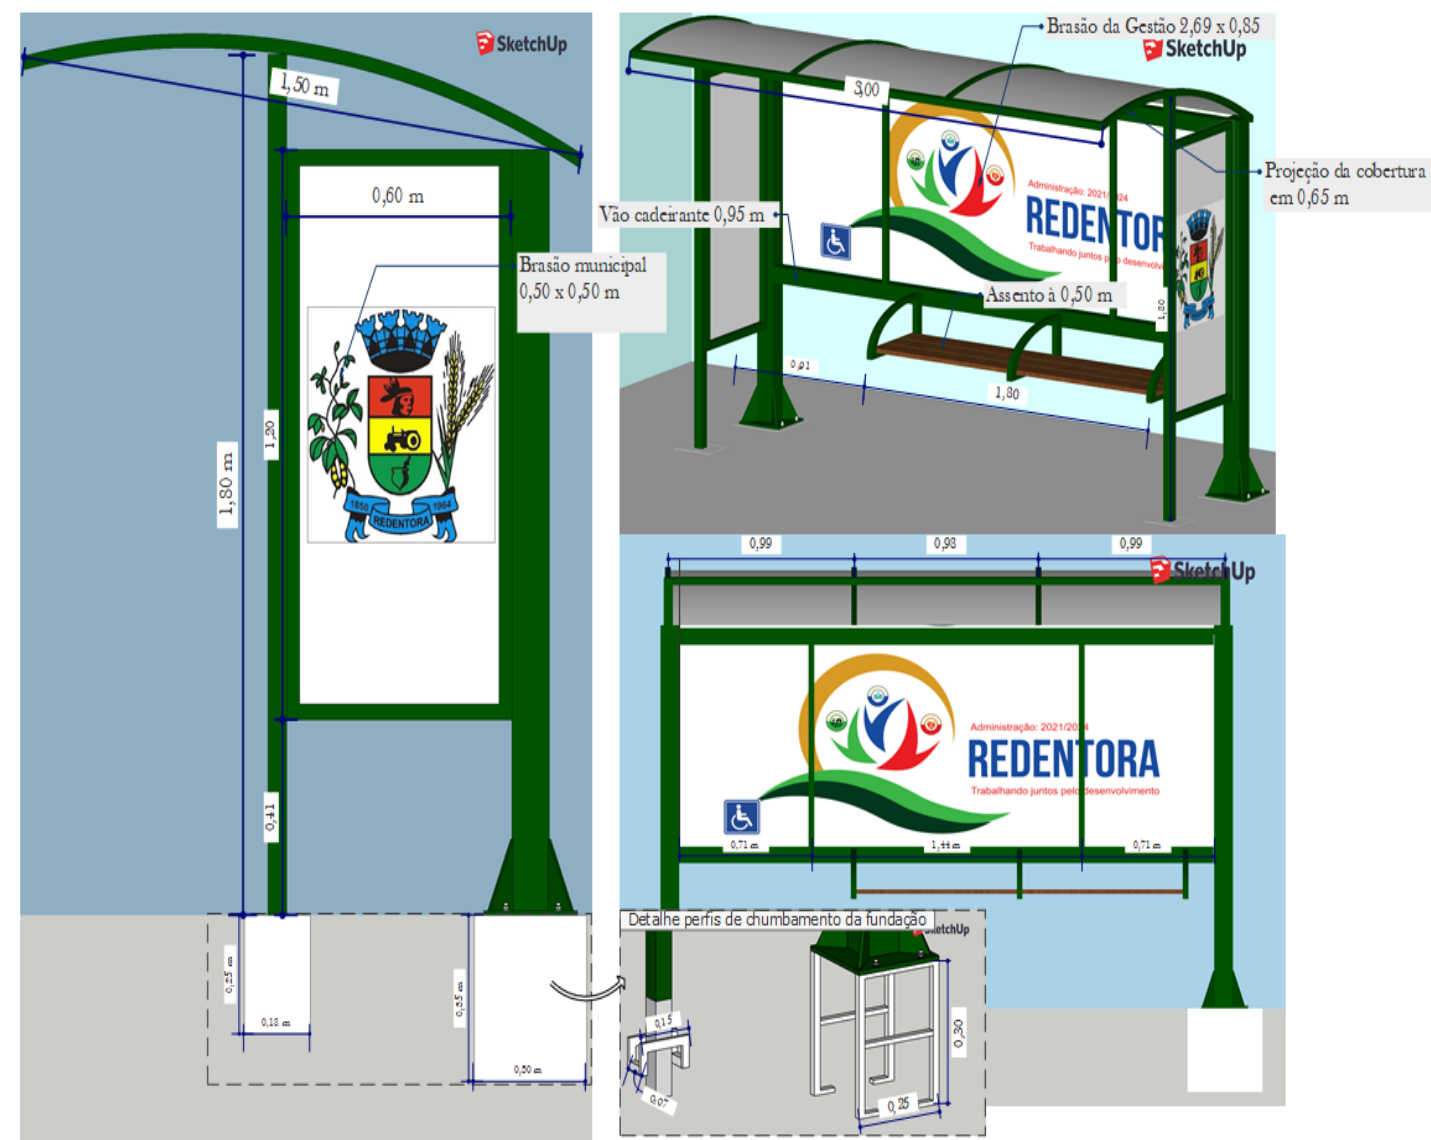



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS APROVADOS/RECURSO LIBERADO

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....R\$ 35.374,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.036,00

Valor Total.....R\$ 38.410,00

Item:

Aquisição de 262 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Assinado Termo Aditivo de supressão de 462 sacas para 262 sacas

Situação:

- Aguardando abertura do crédito no Orçamento 2022 para posterior realização da Licitação.

Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Saúde – Fundo a Fundo**

Valor Repasse.....R\$ 50.000,00

Valor Total.....R\$ 50.000,00

Item:

Equipamentos e Material Permanente

01 Câmara para Conservação de Vacinas, Medicamentos;

01 Eletrocardiógrafo;

01 Monitor de Sinais Vitais;

01 Cilindro para Oxigênio Medicinal 50 Litros

02 Cilindro para Oxigênio Medicinal 7 Litros

04 Cadeiras de Rodas Adulto Dobrável

05 Nebulizador Ultrassônico

Atividades:

- Recurso Liberado em 01/07/2022.

Situação:

- Em fase de ajustes para encaminhamento ao Setor de Licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROPOSTAS/Recursos Liberados:

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4296492/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 17/06/2022.**

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4619692/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Total.....R\$ 110.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 18/06/2022.**

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4601602/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Total.....R\$ 200.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 24/06/2022.**

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.460112/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar:

Valor Total.....R\$ 150.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 24/06/2022.**

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4658842/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Pompeo de Mattos**

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 24/06/2022.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM ANÁLISE (GOVERNO RS)

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2018/2019**

Valor Repasse.....R\$ 59.009,21

Valor Contrapartida.....R\$ 1.834,87

Valor Total.....R\$ 60.844,08

Item:

Aquisição de 418 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Projeto enviado dia 28/04/2021 para análise da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul.

Situação:

- Aguardando a Aprovação do Plano de Trabalho para posterior realização da Licitação.

PROPOSTAS CADASTRADAS:

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Heitor Schuch**

Proposta SICONV: **002523/2022**

Valor Repasse.....R\$ 143.250,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.750,00

Valor Total.....R\$ 146.000,00

Itens:

01 (uma) Grade Aradora

01 (uma) Grade Niveladora

01 (uma) Carreta Agrícola com Carroceria de Madeira

01 (uma) Roçadeira Agrícola

Situação:

- Proposta Aprovada, em análise de Plano de Trabalho.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETO APROVADO (Aguardando Elaboração do Projeto de Engenharia)

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **052170/2021**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 239.750,00

Objeto: **Pavimentação com Pedras Irregulares**


Local: **Localidade de Vila São Sebastião**

Atividades:

- Proposta Aprovada / Contrato de Repasse Assinado

Situação:

- Aguardando Solicitação da CEF para elaboração do Projeto de Engenharia.

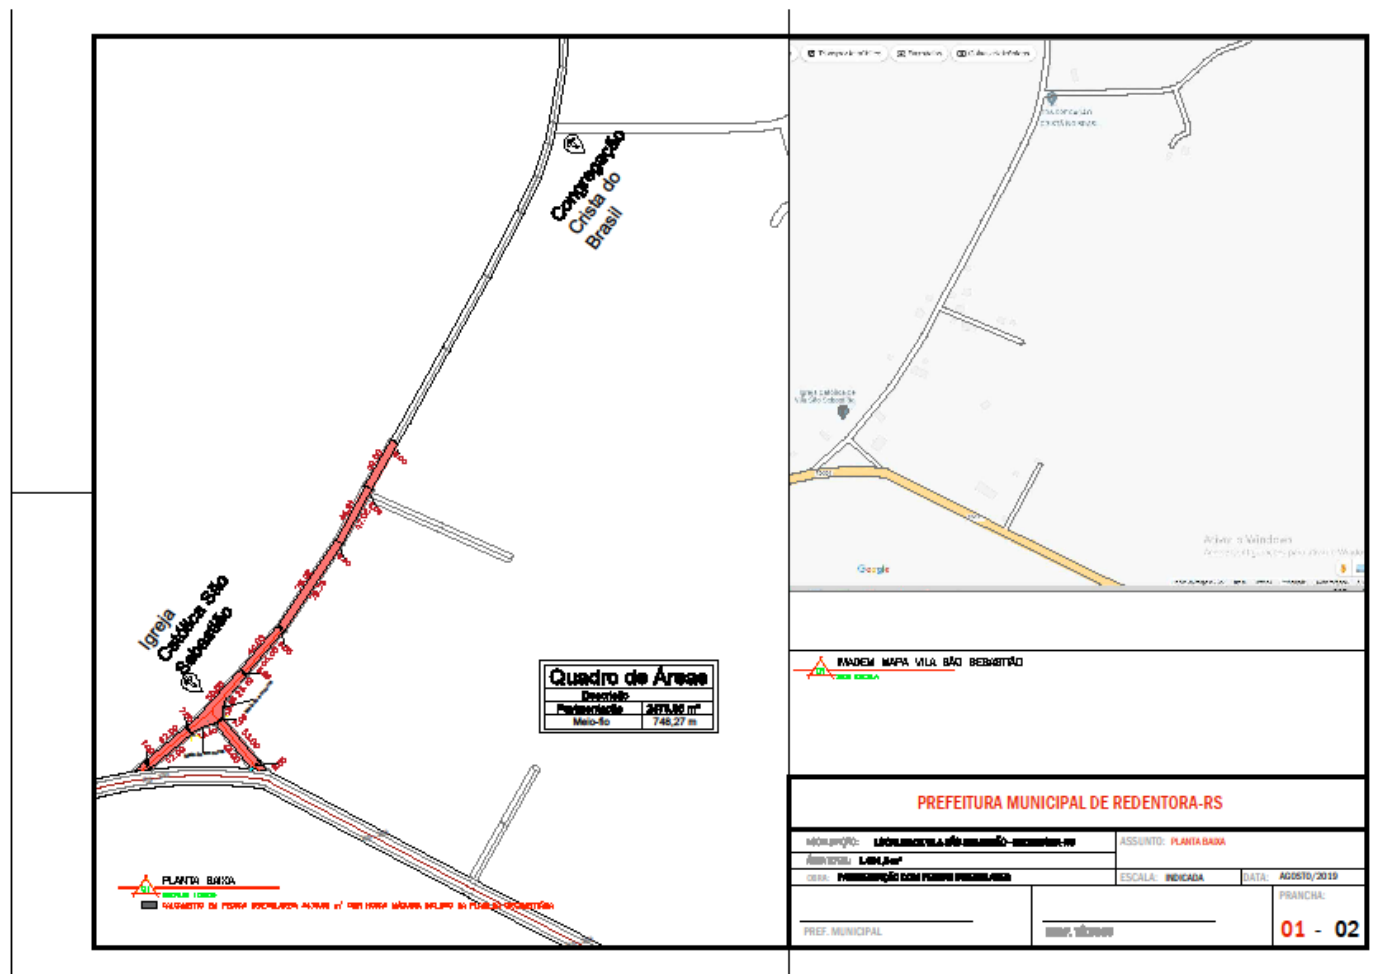



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM ELABORAÇÃO:

Ampliação do Galpão das Máquinas da Secretaria de obras

Recurso: **Municipal**


Item:

Ampliação Da Cobertura do Galpão da Secretaria de Obras

Área Aproximada: 472,70m²

Atividades:

- Aguardando orçamentos das empresas.

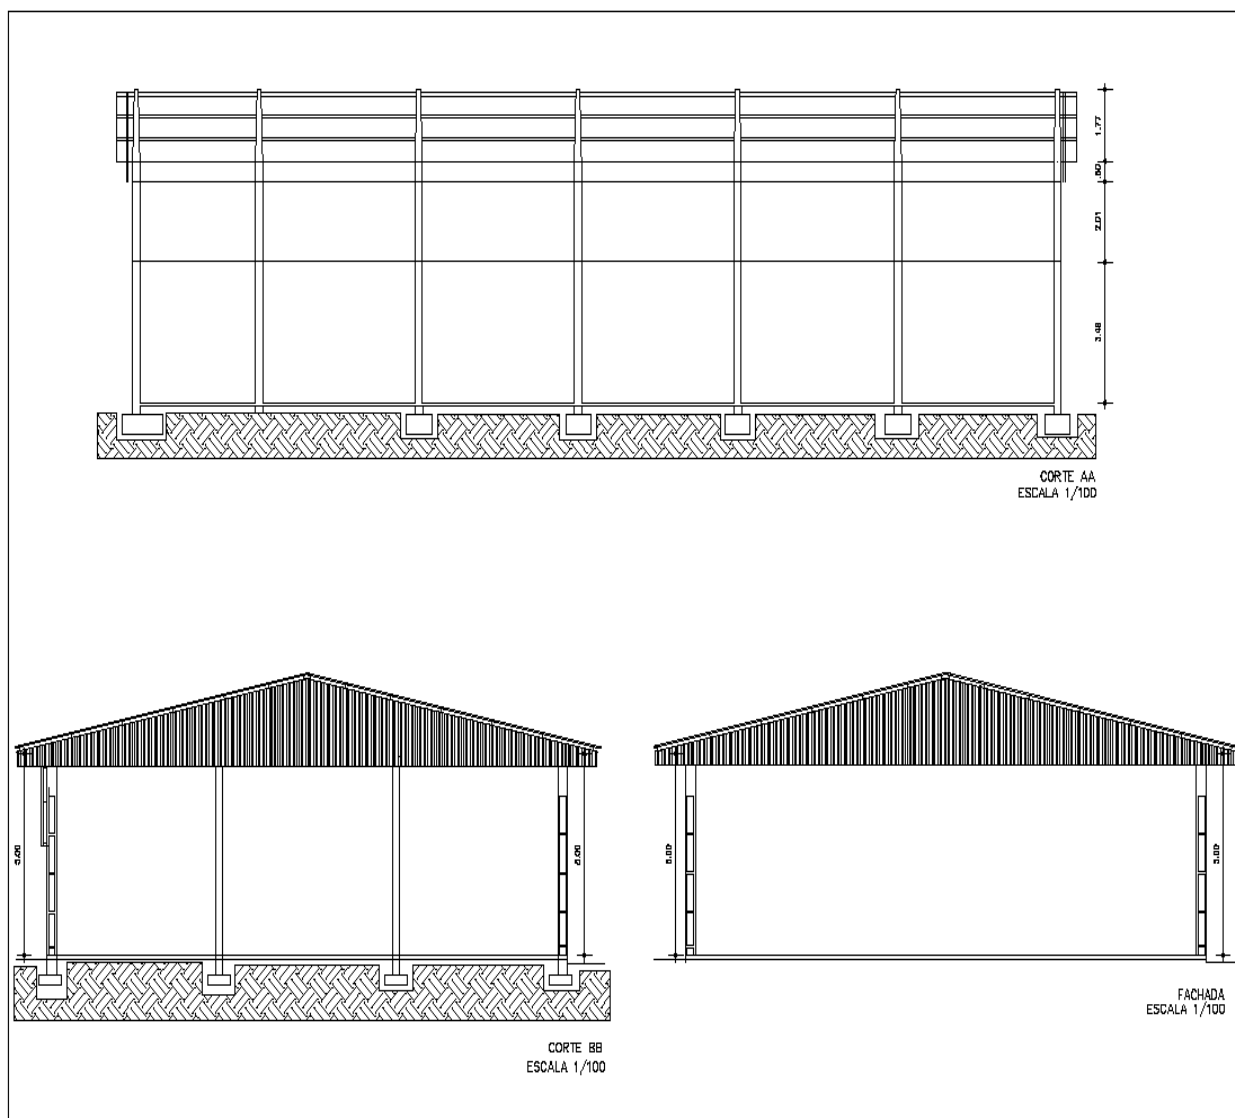



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Perímetro Urbano


Recurso: **Municipal**

Atividades:

- Encaminhada Documentação ao Tabelionato para realizar a localização de parcela na Matrícula

Situação:

- Em fase de elaboração dos mapas da ampliação do perímetro urbano

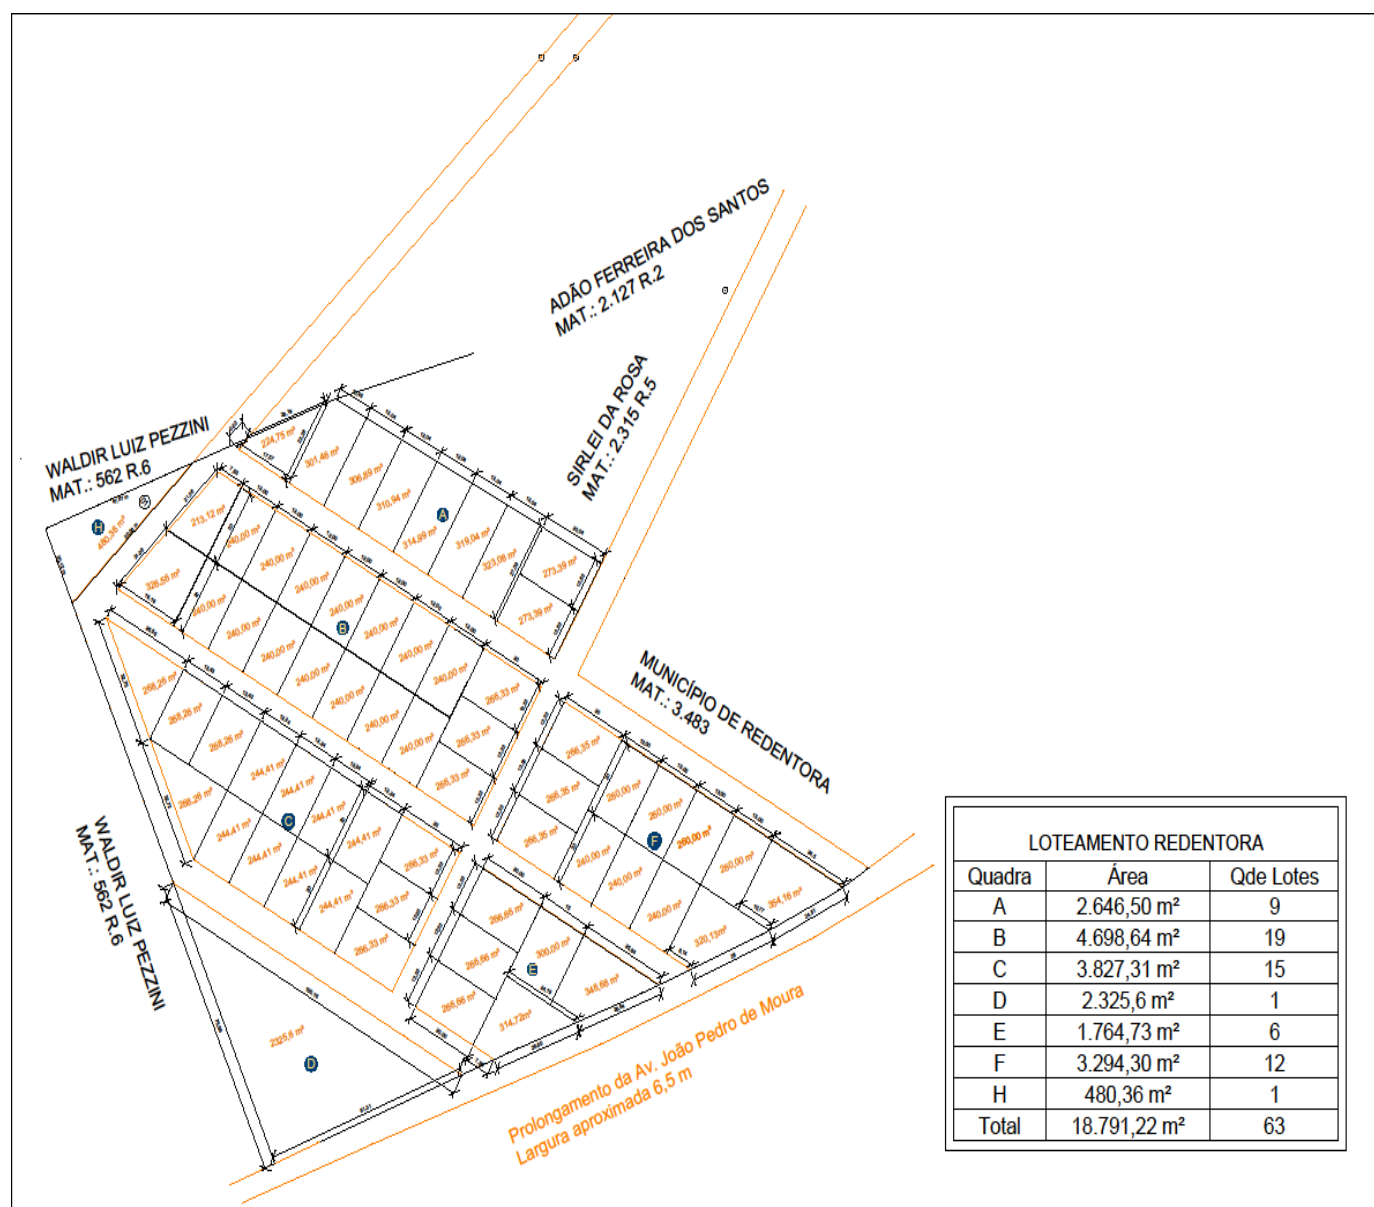




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Um Pórtico no Acesso ao Bairro São José

Recurso: **Municipal**

Atividades:

- Projeto em elaboração

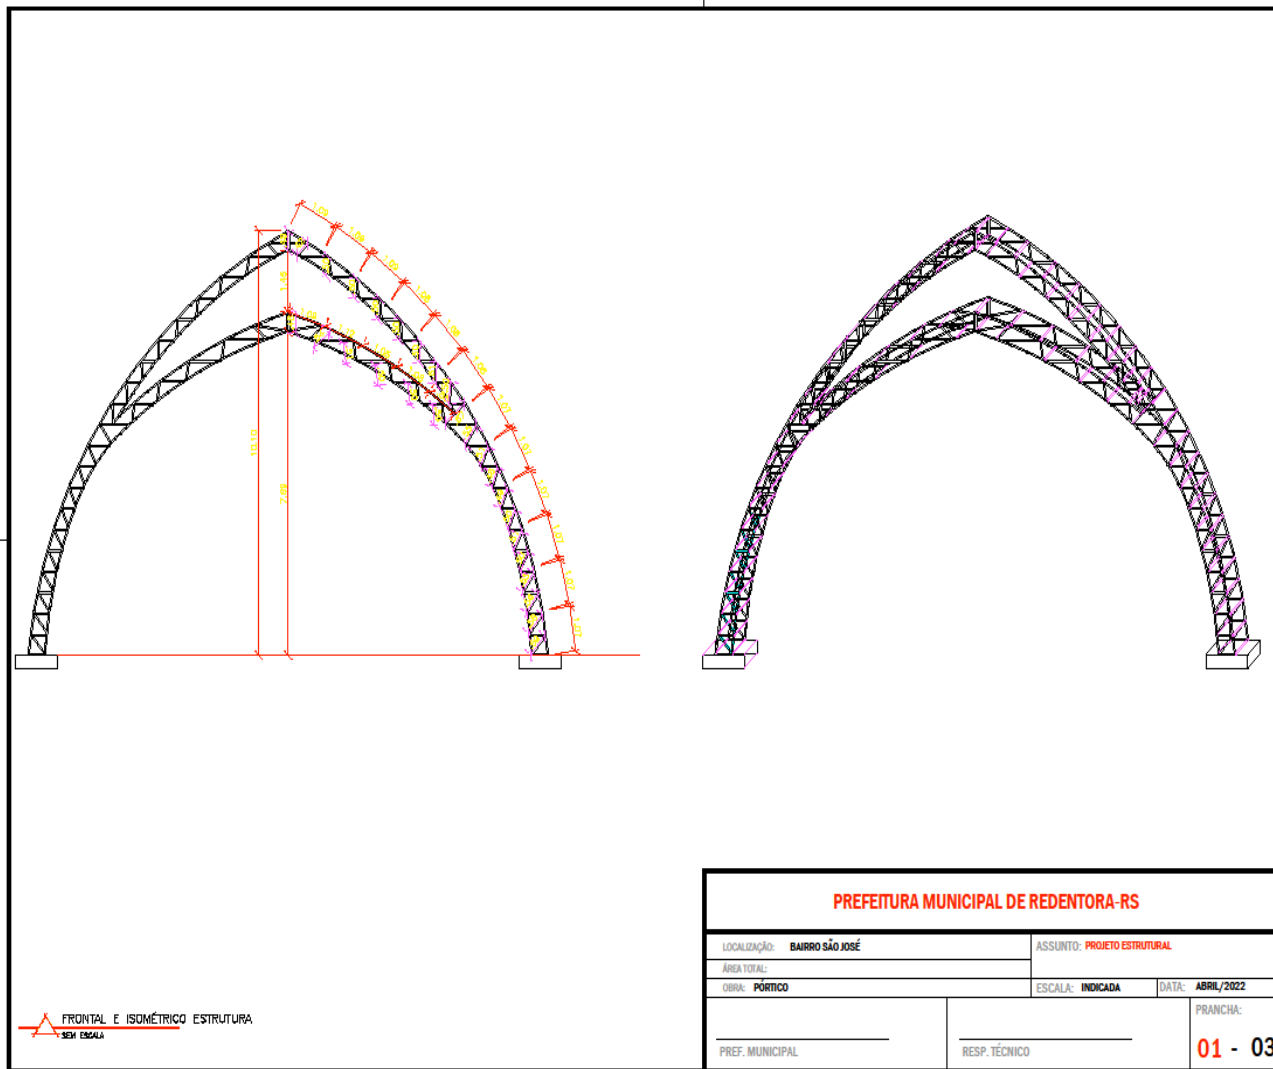



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Perfuração de Poços

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

Valor Total.....	R\$	70.000,00
Valor da Licitação (Geólogo).....	R\$	4.440,00
Valor da Licitação (Perfuração).....	R\$	45.500,00
Termo Aditivo (Adição) da Licitação (Perfuração).....	R\$	11.000,00
Termo Aditivo (Supressão) da Licitação (Perfuração).....	R\$	2.350,00
Valor Total Utilizado.....	R\$	58.590,00

Item:

Realizada a Perfuração dos Poços Tubulares Profundos (Poços Artesianos)

Situação:

- Projeto concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

Valor.....R\$ 340.585,32

Item:

Implantação de 20 Módulos Sanitários





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Situação:

- Prestação de Contas complementada e enviada para análise.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Situação:

- Prestação de Contas Enviada para Análise.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SETOR DE ARQUITETURA

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 22 de julho de 2022 até 29 de julho de 2022;
- Visita para acompanhamento da obra e conferência das armaduras das fundações para posterior concretagem, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (29/07);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (29/07);
- Recebimento de arquivos, referente ao projeto referente a Croqui e Memorial Descritivo de a um desmembramento do lote urbano nº752, quadra nº 20, protocolo nº 1286/2022;
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (02/08);
- Visita para acompanhamento da obra e definição de tipo de execução de meio fio em curva, com prefeito e secretário do planejamento, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (02/08);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (02/08);
- Reanálise, após recebimento de novos arquivos, referente a Projeto de uma edificação em alvenaria, protocolo 939/2022;
- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros Imobiliários, de projeto de uma edificação em alvenaria, protocolo 939/2022;
- Aprovação e entrega ao Setor de Cadastros Imobiliários, de Projeto de regularização de edificação residencial unifamiliar (casa popular), protocolo nº 1324/2022;
- Reanalise após recebimento de novos arquivos, de projeto referente a Croqui e Memorial Descritivo de a um desmembramento do lote urbano nº752, quadra nº 20, protocolo nº 1286/2022;
- Aprovação e entrega ao Setor de Cadastros Imobiliários, de projeto referente a Croqui e Memorial Descritivo de a um desmembramento do lote urbano nº752, quadra nº 20, protocolo nº 1286/2022;
- Resposta ao contato de empresa responsável pela execução da obra de Pavimentação das Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial I, Estrada para Cel. Bicaco, Walter Perachi de Barcelos e Sinfrônio Julio Ribeiro, referente a solicitação de Termo de Recebimento da Obra;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Resposta ao contato de morador da cidade, e verificação com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a largura de passeio público em determinada localidade;
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 02 do Termo aditivo 01, da obra da Unidade de Acolhimento;
- Visita a obra de ampliação do Centro Administrativo, com prefeito e secretário, para definição de layout das divisórias a serem executadas, para posterior elaboração de planta baixa da mesma;
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, Relatório Fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (03/08);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (03/08);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, Relatório Fotográfico da obra, após concretagem das fundações, referente a Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (03/08);
- Resposta ao contato de funcionário da RBS, referente a solicitação do mesmo de reformas na torre de telefonia localizada na Praça Redenção;
- Elaboração de planta baixa com layout das divisórias a serem executadas na obra de Ampliação do Centro Administrativo, para viabilizar orçamento das mesmas;
- Elaboração de Planilha de Adição e Supressão, assim como, cálculos de quantitativos e Memorial de Cálculo, referente ao Aditivo 01 da Obra de Ampliação do Centro Administrativo;
- Assinatura de Alvarás de Construção;
- Visita na obra de Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia e auxílio na medição de vãos para a execução de portas de madeira do local (05/08);
- Resposta a empresa responsável pela execução da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli, referente a modelo e dimensões de postes decorativos especificados no projeto urbanístico e no orçamento;
- Elaboração de RRT, junto ao CAU/RS referente a fiscalização da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli, com 4.008,51 m²;
- Visita para acompanhamento e auxílio na localização de pontos de iluminação, assim como, Relatório Fotográfico da obra referente aos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (05/08);



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Conversa com empresa responsável pela execução da obra de ampliação do Centro Administrativo, para explicação de quantitativos e itens referentes ao Termo aditivo 01;
- Conversa com empresa responsável pela execução da obra de Revitalização dos canteiros para definição de modelo de postes decorativos e tipo de lâmpada a ser usada.
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 29 de julho de 2022 até 05 de agosto de 2022;
- Elaboração de planilha no Programa Excel, referente a planilha de itens e quantitativos elaborada na tabela da CAIXA/ Sinapi, para Termo Aditivo 01, referente a obra de Ampliação do Centro Administrativo;
- Conferência de valores da proposta da empresa responsável pela execução da obra, referente a Ampliação do Centro Administrativo, com os valores de aditivo e aplicação de desconto nos demais itens, não pertencentes a planilha orçamentária original;
- Conversa com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a Projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 1304/2022;
- Elaboração de planilha no Programa Excel referente a planilha de itens e quantitativos elaborada na tabela da CAIXA/ Sinapi, de aditivo de Supressão, referente a obra de Ampliação do Centro Administrativo;
- Aprovação de prancha de Projeto Arquitetônico, referente a Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo 1150/2022, aprovado em 19/07/2022 e entrega de uma cópia da mesma ao setor de Cadastros Imobiliários;
- Elaboração de Boletim de Medição 01 com conferência de itens especificados pela empresa responsável pela execução da obra, na Plataforma Mais Brasil, referente a Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019;
- Assinatura de Projeto de Mobiliário Urbano, Abrigo/Parada de ônibus para licitação do mesmo;
- Elaboração de Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, junto ao CAU/RS, referente ao projeto de mobiliário Urbano, Abrigo/Parada de Ônibus;
- Visita na obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019, para relatório fotográfico, assim como, conferência de armaduras especificadas no projeto, para posterior concretagem das vigas baldrame (11/08);
- Elaboração de boletim de Medição 17, referente a obra da Unidade de Acolhimento;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 01, da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019;
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de medição 17, da obra da Unidade de Acolhimento;
- Conversa com Setor de Cadastros Imobiliários, após análise do setor, referente ao Projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 1304/2022;
- Elaboração de parecer e envio ao responsável técnico do projeto, após análise do setor de Arquitetura e do Setor de Cadastros Imobiliários, referente ao Projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 1304/2022;
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (12/08);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (12/08);
- Visita para acompanhamento da obra, fiscalização de lastro de concreto magro no fundo das sapatas e Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (12/08);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Reforma do Hospital Santa Rita de Cássia (12/08);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (12/08);
- Conferência em Memorial de Cálculo do projeto de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert, referente ao espaçamento de estribos dos pilares especificados no mesmo;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 05 de agosto de 2022 até 12 de agosto de 2022;
- Recebimento de novos arquivos, após envio de parecer ao responsável técnico, referente a projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 1304/2022;
- Análise de formas de elaboração de Aditivo, referente a obra de Obra de Ampliação do Centro Administrativo;
- Elaboração de RRE, referente ao Boletim de Medição 01, da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (16/08);
- Contato com Corsan para definição referente aos pontos de água a serem distribuídos no decorrer dos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Locação, juntamente com eletricitista da empresa responsável pela execução da obra de Revitalização dos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli, dos postes decorativos;
- Reanálise, após recebimento de novos arquivos, referente a projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 1304/2022;
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 1304/2022;
- Aprovação de projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 1304/2022;
- Participação em curso, juntamente com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a implantação de plataforma Digital Workflow e uso da plataforma no recebimento de projetos para aprovação no município, assim como, etapas para andamento do mesmo, aprovação e posterior encaminhamento aos demais setores;
- Recebimento de arquivos, laudos e diário de obra, referente a obra de Pavimentação das Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial I, Estrada para Cel. Bicaco, Walter Perachi de Barcelos e Sinfrônio Julio Ribeiro;
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, conferência de armaduras utilizadas nos pilares do projeto, antes da concretagem e Relatório Fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (17/08);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (17/08);
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a solicitação de funcionário da Corsan, para conferência de situação de determinado lote, referente a urbanização do mesmo para viabilizar ligação de rede de água neste ponto do município;
- Conversa com Setor Jurídico, referente a elaboração de Aditivo de Supressão e Adição da Obra de Ampliação do Centro Administrativo;
- Resposta ao contato de morador da cidade, referente a distanciamento e recuos a serem respeitados de acordo com a legislação municipal, para residências e projetos de edificação comerciais;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Conversa com Setor de Cadastros Imobiliários referente a regularização de pavimento inferior de projeto, com área comercial e residencial;
- Conversa com empresa responsável pela Obra de Ampliação do Centro Administrativo, referente ao Aditivo da mesma;
- Conversa com Setor de Cadastros Imobiliários referente a trâmite de projetos com área de sala comercial;
- Assinatura de Cronograma de obra, referente a Projeto de Mobiliário Urbano, referente a execução de Abrigo/Parada de Ônibus;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 12 de agosto de 2022 até 19 de agosto de 2022;
- Elaboração de memorial descritivo referente a divisórias leves de Eucatex 35 mm, a serem executadas na obra de ampliação do centro administrativo;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (23/08);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (23/08);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (23/08);
- Análise de projeto de Edificação de Galpão Agrícola, protocolo nº 1476/2022;
- Análise de projeto para Retificação de lote urbano bem como de suas confrontações, referente descrição na matrícula nº 3.720, protocolo nº 1478/2022;
- Resposta ao contato de responsável técnico, referente a projeto para Retificação de lote urbano bem como de suas confrontações, referente descrição na matrícula nº 3.720, protocolo nº 1478/2022;
- Adequação no aditivo 01, referente a obra de ampliação do Centro Administrativo, referente a planilha de Adição e de Supressão de itens;
- Ajuste na planilha para elaboração de Boletim de Medição, referente a obra de ampliação do Centro Administrativo;
- Cálculos de percentual de execução, de acordo com memorial de cálculos, para elaboração de Boletim de Medição, referente a obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração de Boletim de Medição 02, referente obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 02 da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Envio ao setor de Licitações de planta baixa com layout de divisórias em Eucatex, referente a obra ampliação do centro administrativo;
- Resposta ao contato de morador da cidade, referente a Projeto de Edificação de Galpão Agrícola, protocolo nº 1476/2022;
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (25/08);
- Elaboração de Boletim de Medição 09, referente a obra de Ampliação do Centro Administrativo;
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 09, da obra de Ampliação do Centro Administrativo;
- Visita para acompanhamento da obra, conferência no início de pavimentação com pisos intertravados, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (26/08);
- Visita na obra de execução de rampa de acesso e passeio público na Brigada Militar (26/08);
- Visita na Vila São Sebastião, para medição de estradas do local, para viabilizar elaboração de projeto de Pavimentação com pedras irregulares no local (26/08);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, conferência na montagem de formas e armaduras utilizadas nas vigas superiores, antes da concretagem e Relatório Fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (26/08);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (26/08);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (26/08);
- Conversa com setor de Cadastros Imobiliários, referente a projeto de Edificação de Galpão Agrícola, protocolo nº 1476/2022;
- Elaboração de parecer após análise, e envio ao responsável técnico, referente a projeto de Edificação de Galpão Agrícola, protocolo nº 1476/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SETOR DE ENGENHARIA

- Organização de documentos – arquivos das obras em andamento;
- Montagem de notificação extrajudicial da obra de pavimentação em pedras irregulares;
- Continuação do projeto de acessibilidade de rampas e calçadas do prédio administrativo;
- Montagem e medição do boletim de medição 17 da unidade de acolhimento e ofício 304.
- Alteração da planilha orçamentaria do contrato 883914/2019 da obra de modernização do estádio municipal - vestiário com base à proposta da empresa vencedora da licitação;
- Alteração da planilha orçamentaria do contrato 883914/2019 da obra de modernização do estádio municipal com base à plataforma mais brasil para conferência de itens;
- Montagem da medição 01 da obra de modernização do estádio municipal do contrato 883914/2019 – vestiário;
- Análise da proposta à plataforma mais brasil com a proposta da empresa vencedora para unificar valores de medição que estão divergentes;
- Plotagem das folhas de projeto 01;02 e 03 de demolição construção e adequação do projeto de acessibilidade de rampas e calçadas do prédio administrativo;
- Montagem de Planilha Orçamentária com base na proposta vencedora do contrato 883914 da área de vestiário da obra de modernização do estádio municipal, montagem de planilha de QCI (quadro de composição de investimento), Cronograma de obra com base na plataforma + brasil, RRE (relatório resumo do empreendimento) e montagem do boletim de medição 01 das fundações (sapatas) .
- Montagem de Planilha Orçamentária com base na proposta vencedora do contrato 892538 da área social e pátio da obra de modernização do estádio municipal, montagem de planilha de QCI (quadro de composição de investimento), Cronograma de obra com base na plataforma + brasil, RRE (relatório resumo do empreendimento) e comparativo entre proposta vencedora e plataforma + brasil.
- Alteração de projeto de acessibilidade e calçadas da prefeitura municipal de Redentora;
- Alteração da planilha orçamentária do projeto de acessibilidade e calçadas da prefeitura de redentora;
- Visita na obra da escola maria belmont albert para verificar as instalações de estribos e ferragens dos pilares e vergas e andamento de obra;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita na obra da unidade de acolhimento para medição 17 de instalação de grama em placa e acabamentos;
- Visita na obra de modernização do estádio municipal para conferência de ferragens e caixarias do contrato 883914 do vestiário para liberação de concretagem;
- Visita na obra de modernização do estádio municipal para conferência de ferragens das fundações e arranque de pilares do contrato 892538 da área social e pórtico;
- Alteração da planilha orçamentária do projeto de acessibilidade e calçadas da prefeitura de Redentora;
- Visita na obra da escola Maria Belmont Albert para verificar as instalações de estribos e ferragens da cinta de amarração e andamento de obra;
- Visita na obra de modernização do estádio municipal do contrato 883914 do vestiário pós concretagem;
- Visita na Vila São Sebastião para medição e levantamento de áreas para recebimento de calçamento com pedras irregulares;
- Alteração de projeto de calçamento com pedras irregulares da vila São Sebastião;
- Alteração da planilha orçamentaria do calçamento com pedras irregulares da Vila São Sebastião;
- Memorial de Cálculo da planilha Orçamentária do calçamento com pedras irregulares da Vila São Sebastião;
- Visita na obra de Revitalização dos Canteiros municipais para verificar andamento de obra;
- Visita na obra da calçada em concreto armado na brigada militar;
- Montagem de cronograma físico-financeiro da ligação de subestação de 150 kva da obra de reforma e adequação do hospital de Redentora;

Redentora, 31 de agosto de 2022.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento
