



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

**JUNHO/2022**

**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**PROJETOS EM EXECUÇÃO**

**Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia**

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área a Ser Construída: **1.067,53m²**

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Valor da Licitação.....</b>                               | <b>R\$ 965.277,00</b>   |
| <b>Valor do 1º Termo Aditivo.....</b>                        | <b>R\$ 40.203,37</b>    |
| <b>Valor do 2º Termo Aditivo.....</b>                        | <b>R\$ 102.046,35</b>   |
| <b>Valor do 3º Termo Aditivo.....</b>                        | <b>R\$ 66.293,08</b>    |
| <b>Valor do 5º Termo Aditivo.....</b>                        | <b>R\$ 32.772,30</b>    |
| <b>Valor do 6º Termo Aditivo.....</b>                        | <b>R\$ 91.939,94</b>    |
| <b>Valor do Reequilíbrio Financeiro.....</b>                 | <b>R\$ 311.290,92</b>   |
| <b>Valor do 8º Termo Aditivo (Supressão de Valores).....</b> | <b>R\$ 129.899,19</b>   |
| <b>Valor do 10º Termo Aditivo.....</b>                       | <b>R\$ 31.133,89</b>    |
| <b>Valor Total.....</b>                                      | <b>R\$ 1.511.057,66</b> |
| <b>Valor Executado.....</b>                                  | <b>R\$ 1.390.665,42</b> |

% Acumulado Executado da Obra: **92,03%**

**Projeto Acessibilidade (Rampas e Calçadas)**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Valor da Licitação.....</b> | <b>R\$ 126.196,72</b> |
| <b>Valor Executado.....</b>    | <b>R\$ 80.474,73</b>  |

% Acumulado Executado da Obra: **63,77%**

**Valor Total**

|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Valor Total do Projeto Inicial Ajustado.....</b>                        | <b>R\$ 1.511.057,66</b> |
| <b>Valor do Projeto de Acessibilidade (Rampas e Passeio) Licitado.....</b> | <b>R\$ 126.196,72</b>   |
| <b>Valor Total Atualizado.....</b>                                         | <b>R\$ 1.637.254,38</b> |
| <b>Valor Executado.....</b>                                                | <b>R\$ 1.448.178,62</b> |

% Acumulado Executado da Obra: **89,85%**

**Atividades:**

- Iniciada a Obra de Acessibilidade (Rampas e Calçadas).
- Realizado Boletim de Medição nº 01 do 10º Termo Aditivo no valor de R\$ 31.133,89;
- Realizado Boletim de Medição nº 01 Referente à Obra de Acessibilidade (Rampas e Calçadas).
- Projeto de Aberturas (Portas e Janelas) Readequado no valor de projeto R\$ 276.057,80 aguardando encaminhamento ao Legislativo Suplementação de;
- Em fase de colocação do Piso Tátil nas Calçadas.

**Situação Atual da Obra:**

Em execução.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**



*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS*  
*Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

### Ampliação do Prédio do Centro Administrativo Municipal

Recurso: **Municipal**

**Valor do Projeto**.....R\$ **352.518,15**

**Valor da Licitação**.....R\$ **352.174,94**

**Valor Executado**.....R\$ **257.602,21**

#### Atividades:

- Em fase de colocação das janelas e Portas;
- Em fase de aplicação de massa corrida;
- Em fase de colocação do Piso Porcelanato;
- Em fase de Pintura das Paredes;
- Realizado Boletim de Medição nº 08 no Valor de R\$ 20.989,38

#### Situação:

- Executado **73,15%**.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

### Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**

Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....R\$ 450.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 359.373,53

Valor Executado.....R\$ 176.286,85

**Valor da Nova Licitação.....R\$ 264.705,84**

Saldo do Repasse a Ser Utilizado.....R\$ 264.451,46

Valor da Contrapartida a Ser Utilizado.....R\$ 254,38

**Valor Executado do Projeto Remanescente.....R\$ 158.063,83**

**Valor Total do Projeto (Projeto Inicial + Projeto Remanescente)....R\$ 440.992,69**

**Valor Total Executado (Projeto Inicial + Projeto Remanescente)....R\$ 334.596,30**

#### Atividades:

- Em fase de reboco e aplicação de massa fina nos muros e Concretagem das Calçadas;
- Realizado Boletim e Medição nº 15 no valor de R\$ 27.837,02;
- Em fase de reboco, calçadas e pintura.

#### Situação Atual da Obra:

- Executado (contrato atual) **59,71%**
- Executado (acumulado) **75,83%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

### Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Recurso: **Municipal**

**Valor Estimado.....R\$ 182.456,03**

**Valor da Licitação.....R\$ 149.554,87**

**Valor Executado.....R\$ 111.085,09**

#### Item:

#### **Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)**

Rua Erwin Mathaus Braun


Rua Sinfrônio Julio Ribeiro

#### Atividades:

- Em fase de Pavimentação da Rua Erwin Mathaus Braun
- Realizado Boletim de Medição nº 06 no valor de R\$ 16.374,33
- Realizado Boletim de Medição nº 07 no Valor de R\$ 12.183,17

#### Situação Atual da Obra:

- Executado **74,28%.**

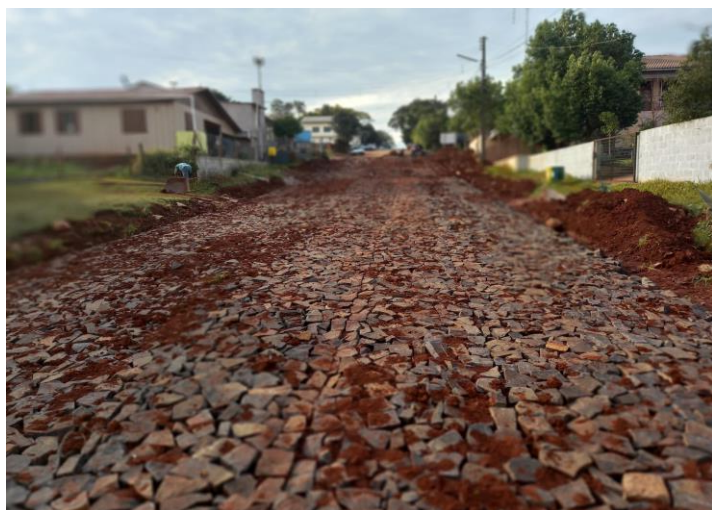



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada**

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

**Valor Total.....R\$ 101.000,00**

**Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00**

**Itens:**

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico.

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Agrícola

**Atividades:**

- Solicitado às empresas a entrega dos equipamentos;
- Recebido o item Distribuidor de Calcário e Adubo Orgânico Seco.



Roçadeira Agrícola



Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

## **Pavimentação Asfáltica – Perímetro Urbano**

Órgão Concedente: **Governo do Estado do Rio Grande do Sul.**

Recurso: **Programa Pavimenta**

Área a Ser Pavimentada: **8.588m<sup>2</sup>**

Área a Ser Pavimentada (Aditivo): **1.778,32m<sup>2</sup>**

Área Total Ser Pavimentada: **10.366,32m<sup>2</sup>**

Valor Repasse.....R\$ 701.948,40

Valor Contrapartida.....R\$ 218.306,38

**Valor da Licitação.....R\$ 920.254,78**

**Valor do Termo Aditivo.....R\$ 182.234,80**

**Valor Total da Obra.....R\$ 1.102.489,58**

### **Objeto:**

- Pavimentação Asfáltica

### **Atividades:**

- Em Fase de Limpeza das Ruas.
- Realizado Termo Aditivo no Valor de R\$ 182.234,80

### **Situação:**

- Em Execução





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

### **Construção de Um Galpão das Máquinas na Sub Prefeitura de São João**

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 108.024,60

**Valor da Licitação.....R\$ 94.895,25**

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 4.800,12

**Valor Total da Obra.....R\$ 99.695,37**

Descrição: **Construção de Um Galpão Para Máquinas na Subprefeitura de São João**

Área: **184,00m²**

#### **Atividades:**

- Realizado Termo Aditivo no Valor de R\$ 4.800,12 referente a alteração na altura dos pilares em 1,12 metros

#### **Situação:**

- Obra Iniciada.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**Ampliação da Escola Municipal Maria Belmont Albert**

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 449.232,00

**Valor da Licitação.....R\$ 449.232,00**

**Item:**

**Construção de 04 Salas de Aula e Sanitários**

**Atividades:**

- Obra Iniciada.

**Situação:**

- Em Execução





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada**

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

**Valor Total.....R\$ 101.000,00**

**Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00**

**Itens:**

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico.

02 (duas) Carretas Basculantes

01 (uma) Roçadeira Agrícola

**Atividades:**

- Solicitado às empresas a entrega dos equipamentos;
- Recebido pedido da Empresa (Item Carretas) de Reequilíbrio Financeiro.



Roçadeira Agrícola



Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada**

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **044467/2019**

Valor Repasse.....R\$ 146.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 4.800,00

**Valor Total.....R\$ 150.800,00**

**Valor da Licitação.....R\$ 149.150,00**

**Itens:**

02 (duas) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

**Situação:**

- Recurso Liberado
- Em fase de Entregas dos Equipamentos





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada**

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **023468/2021**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.100,00

**Valor Total.....R\$ 332.600,00**

**Valor da Licitação.....R\$ 332.500,00**

**Item:**

Aquisição de 02 Tratores Agrícolas (75cv)

**Situação:**

- Recurso Liberado





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**Modernização do Estádio Municipal**

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 45.484,02

**Valor da Licitação.....R\$ 295.484,02**

**Atividades:**

- Recurso Liberado em 30/06/2022
- Assinada Ordem de Início de Obras em 01/07/2022.

**Situação Atual da Obra:**

- Aguardando início da obra.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**Modernização do Estádio Municipal**

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Concedente**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 115.973,14

**Valor da Licitação.....R\$ 402.473,14**

**Atividades:**

- Recurso Liberado em 30/06/2022
- Assinada Ordem de Início de Obras em 01/07/2022.

**Situação Atual da Obra:**

- Aguardando início da obra.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**PROJETOS LICITADOS**

**Revitalização da Avenida Constante Luiz Gemelli**

Recurso: **Municipal**

**Valor**.....R\$ 513.969,56

**Valor da Licitação**.....R\$ 478.493,00

**Item:**


**Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli**

**Atividades:**

- Assinada Ordem de Início de Obras em 01/07/2022.

**Situação Atual da Obra:**

- Aguardando início da obra.

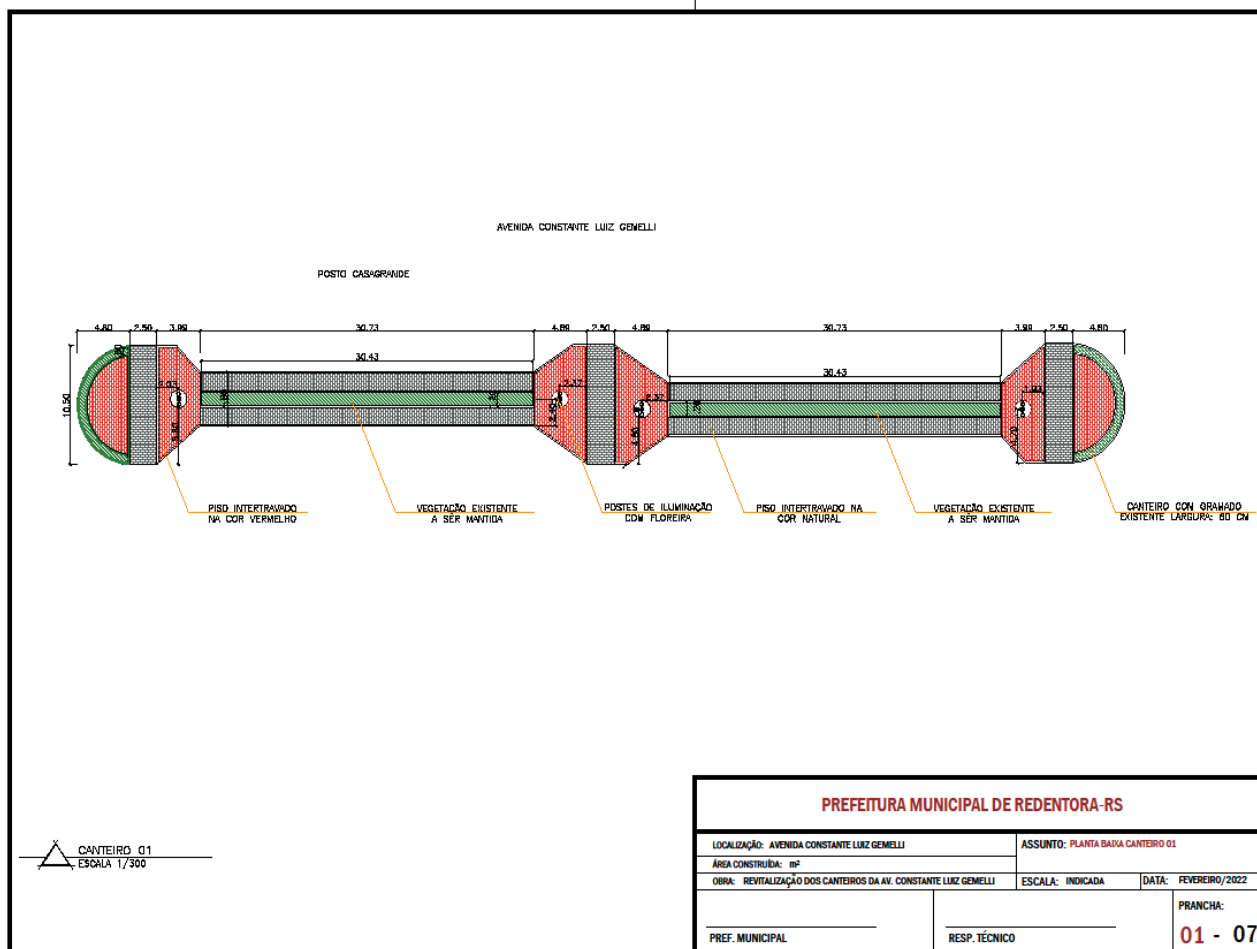



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**PROJETOS LICITADOS / Aguardando a Entrega dos Itens**

**Aquisição de Um Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido**

Recurso: **Municipal (Emendas Impositivas Vereadores)**

**Valor Total.....R\$ 72.333,33**

**Valor da Licitação.....R\$ 47.300,00**

**Itens:**

**Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido**

**Atividades:**

- Solicitado a empresa a entrega do equipamento.

**Situação:**

- Aguardando entrega do equipamento.

**Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira**

Recurso: **Municipal**

**Valor Total.....R\$ 466.666,67**

**Valor da Licitação.....R\$ 465.000,00**

**Itens:**

**Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira, 4x4, Motor com Potência Mínima de 85HP**

**Atividades:**

- Realizado o Processo de Licitação dia 27/06/2022

**Situação:**

- Aguardando a Homologação, Contratação com a Empresa e a Entrega da Máquina.

**PROJETOS EM FASE DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO**

**Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba**

Recurso: **Municipal**

**Valor Total.....R\$ 614.166,67**

**Itens:**

**Aquisição de 01 (um) Caminhão Equipado com Caçamba de no Mínimo 12m<sup>3</sup>**

**Atividades:**

- Processo de Licitação realizado e "deserto" não havendo empresas participantes

**Situação:**

- Aguardando republicação de novo edital de licitação



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento de Urgência**

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-003**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

**Valor Total.....R\$ 250.000,00**

**Item:**

- 01 (um) Equipamento Raio X Fixo Analógico;
- 01 (uma) Bomba de Infusão;
- 02 (dois) Carro de Emergência;
- 01 (um) Carro Maca Avançada;
- 01 (um) Desfibrilador Convencional;
- 01 (um) Eletrocardiógrafo;
- 01 (uma) Mesa de Cabeceira;
- 01 (um) Monitor Multiparâmetros;
- 01 (um) Aspirador de Secreção Elétrico Móvel;
- 01 (um) Computador.

**Atividades:**

- Encaminhado Projeto ao Setor de Licitações.

**Situação:**

- Aguardando realização do Certame.

**Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)**

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.256000/1220-02**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Lasier Martins**

Valor Repasse.....R\$ 80.000,00

**Valor Total.....R\$ 80.000,00**

**Item:**

**Equipamentos e Material Permanente**

- 06 Computador
- 01 Notebook
- 05 Impressora
- 03 Lanterna Clínica
- 01 Espaldar em Madeira
- 01 Detector Fetal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

01 Balança Digital Portátil  
01 Martelo de Reflexo  
02 Escada com 2 Degraus  
01 Estetoscópio  
02 Andador  
04 Mesa Ginecológica  
01 Biombo  
01 Goniômetro  
01 TENS e FES  
01 Ultrassom Fisioterapia  
01 Cama Elástica Proprioceptiva  
06 Exercitador de Mãos e Dedos  
03 Fotopolimerizador de Resinas

### **Atividades:**

- Encaminhado Projeto ao Setor de Licitações.

### **Situação:**

- Aguardando realização do Certame.

## **PROJETOS APROVADOS/RECURSO LIBERADO**

### **Aquisição de Insumos (Adubo)**

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....R\$ 35.374,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.036,00

**Valor Total.....R\$ 38.410,00**

### **Item:**

Aquisição de 262 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

### **Atividades:**

- Assinado Termo Aditivo de supressão de 462 sacas para 262 sacas

### **Situação:**

- Aguardando abertura do crédito no Orçamento 2022 para posterior realização da Licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

### **Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)**

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Saúde – Fundo a Fundo**

Valor Repasse.....R\$ 50.000,00

**Valor Total.....R\$ 50.000,00**

#### **Item:**

#### **Equipamentos e Material Permanente**

01 Câmara para Conservação de Vacinas, Medicamentos;

01 Eletrocardiógrafo;

01 Monitor de Sinais Vitais;

01 Cilindro para Oxigênio Medicinal 50 Litros

02 Cilindro para Oxigênio Medicinal 7 Litros

04 Cadeiras de Rodas Adulto Dobrável

05 Nebulizador Ultrassônico

#### **Atividades:**

- Recurso Liberado em 01/07/2022.

#### **Situação:**

- Aguardando abertura de crédito no orçamento vigente para posterior licitação.

### **PROPOSTAS/Recursos Liberados:**

#### **Custeio – Piso de Atenção Primária**

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4296492/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

**Valor Total.....R\$ 100.000,00**

#### **Item:**

#### **Incremento Custeio do Piso de Atenção Primária - PAP**

#### **Situação:**

- Recurso Liberado em 17/06/2022.

#### **Custeio – Piso de Atenção Primária**

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4619692/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 110.000,00

**Valor Total.....R\$ 110.000,00**

#### **Item:**

#### **Incremento Custeio do Piso de Atenção Primária - PAP**

#### **Situação:**

- Recurso Liberado em 18/06/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**Custeio – Piso de Atenção Primária**

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4601602/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 200.000,00

**Valor Total.....R\$ 200.000,00**

**Item:**

**Incremento Custeio do Piso de Atenção Primária - PAP**

**Situação:**

- Recurso Liberado em 24/06/2022.

**Custeio – Piso de Atenção Primária**

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.460112/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar:

Valor Repasse.....R\$ 150.000,00

**Valor Total.....R\$ 150.000,00**

**Item:**

**Incremento Custeio do Piso de Atenção Primária - PAP**

**Situação:**

- Recurso Liberado em 24/06/2022.

**Custeio – Piso de Atenção Primária**

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4658842/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Pompeo de Mattos**

**Valor Total.....R\$ 100.000,00**

**Item:**

**Incremento Custeio do Piso de Atenção Primária - PAP**

**Situação:**

- Recurso Liberado em 24/06/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**PROJETOS EM ANÁLISE (GOVERNO RS)**

**Aquisição de Insumos (Adubo)**

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**  
Recurso: **Consulta Popular 2018/2019**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Valor Repasse.....R\$       | 59.009,21        |
| Valor Contrapartida.....R\$ | 1.834,87         |
| <b>Valor Total.....R\$</b>  | <b>60.844,08</b> |

**Item:**

Aquisição de 418 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

**Atividades:**

- Projeto enviado dia 28/04/2021 para análise da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul.

**Situação:**

- Aguardando a Aprovação do Plano de Trabalho para posterior realização da Licitação.

**PROPOSTAS CADASTRADAS:**

**Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada**

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**  
Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Heitor Schuch**

Proposta SICONV: **002523/2022**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Valor Repasse.....R\$       | 143.250,00        |
| Valor Contrapartida.....R\$ | 2.750,00          |
| <b>Valor Total.....R\$</b>  | <b>146.000,00</b> |

**Itens:**

01 (uma) Grade Aradora  
01 (uma) Grade Niveladora  
01 (uma) Carreta Agrícola com Carroceria de Madeira  
01 (uma) Roçadeira Agrícola

**Situação:**

- Proposta Aprovada, em análise de Plano de Trabalho.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**PROJETO APROVADO (Aguardando Elaboração do Projeto de Engenharia)**

**Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)**

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **052170/2021**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

**Valor Total.....R\$ 239.750,00**

Objeto: **Pavimentação com Pedras Irregulares**

Local: **Localidade de Vila São Sebastião**

**Atividades:**

- Proposta Aprovada / Contrato de Repasse Assinado

**Situação:**

- Aguardando Solicitação da CEF para elaboração do Projeto de Engenharia.

**PROJETOS EM ELABORAÇÃO:**

**Ampliação do Galpão das Máquinas da Secretaria de obras**

Recurso: **Municipal**


**Item:**

**Ampliação Da Cobertura do Galpão da Secretaria de Obras**

Área Aproximada: 472,70m<sup>2</sup>

**Atividades:**

- Aguardando orçamentos das empresas.

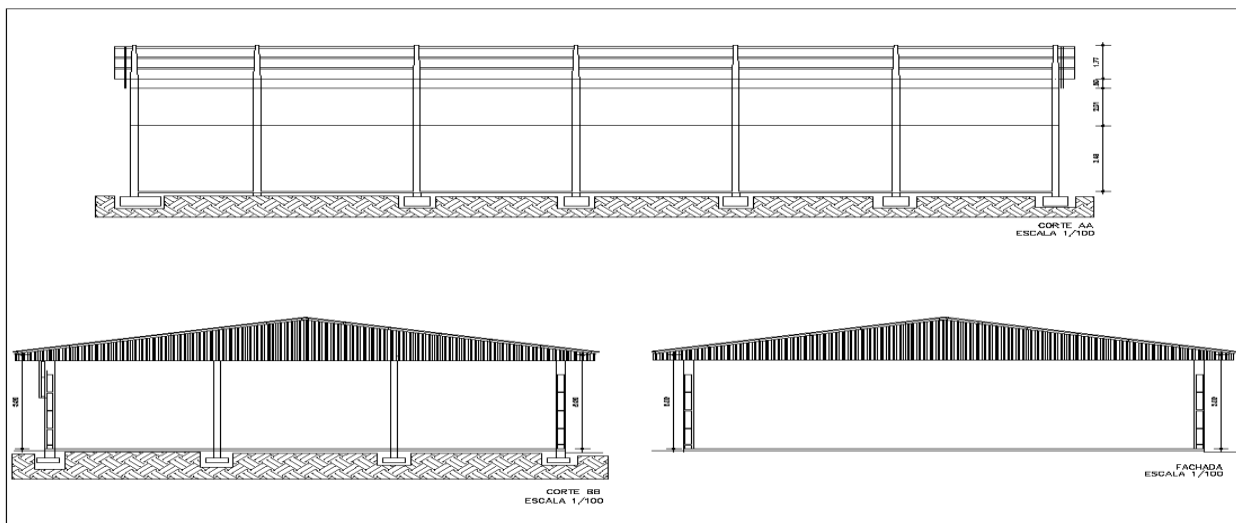



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

## **Ampliação do Perímetro Urbano**


Recurso: **Municipal**

### **Atividades:**

- Encaminhada Documentação ao Tabelionato para realizar a localização de parcela na Matrícula

### **Situação:**

- Em fase de elaboração dos mapas da ampliação do perímetro urbano

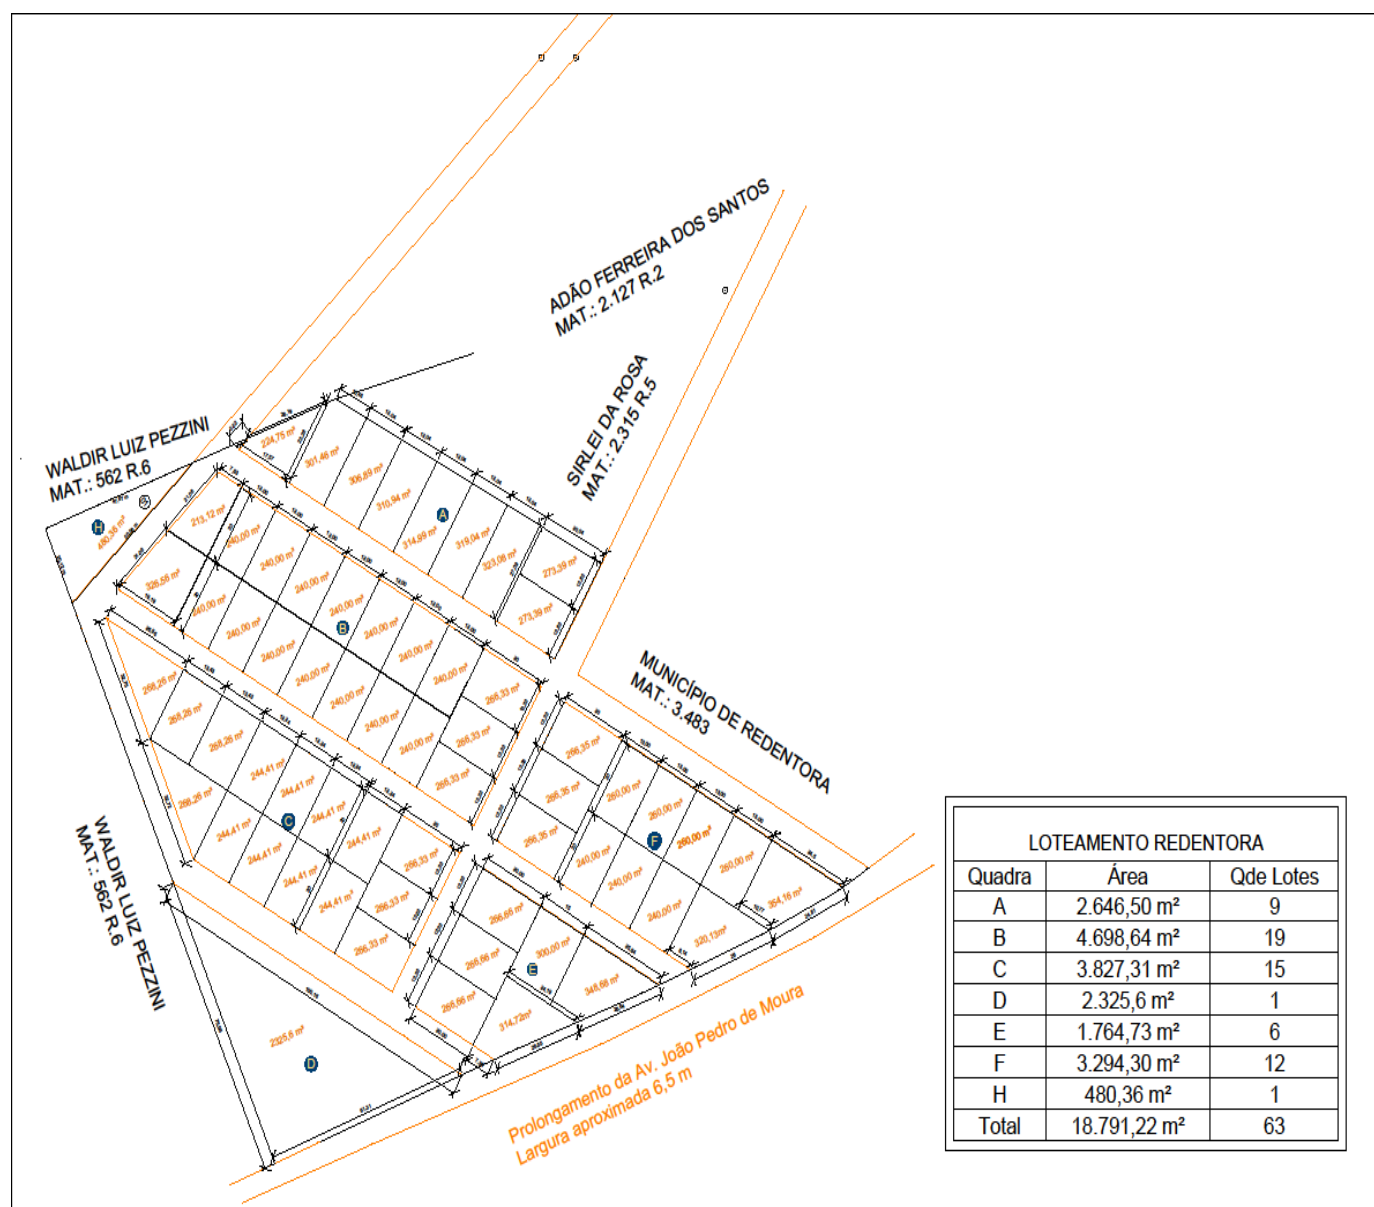




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

## **Construção de Um Pórtico no Acesso ao Bairro São José**

Recurso: **Municipal**

### **Atividades:**

- Projeto em elaboração

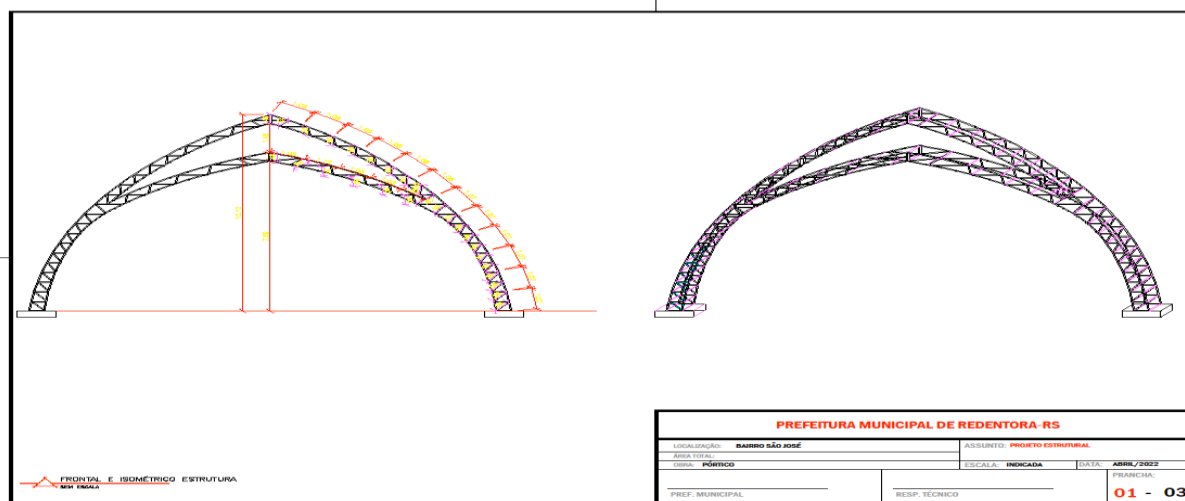

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada**

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

**Valor Total.....R\$ 122.617,42**

**Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00**

### **Itens:**

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

### **Situação:**

- Prestação de Contas complementada e enviada para análise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

### **Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada**

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

**Valor Total.....R\$ 132.350,00**

**Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00**

#### **Itens:**

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

#### **Situação:**

- Prestação de Contas Enviada para Análise.

### **Perfuração de Poços**

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

**Valor Total.....R\$ 70.000,00**

**Valor da Licitação (Geólogo).....R\$ 4.440,00**

**Valor da Licitação (Perfuração).....R\$ 45.500,00**

**Termo Aditivo (Adição) da Licitação (Perfuração).....R\$ 11.000,00**

**Termo Aditivo (Supressão) da Licitação (Perfuração).....R\$ 2.350,00**

**Valor Total Utilizado.....R\$ 58.590,00**

#### **Situação:**

- Prestação de Contas enviada para análise

### **Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares**

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

**Valor.....R\$ 340.585,32**

#### **Item:**

**Implantação de 35 Módulos Sanitários**

#### **Situação:**

- Prestação de Contas Aprovada pela FUNASA através do ofício nº 100/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**SETOR DE ARQUITETURA**

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 20 de maio de 2022 até 27 de maio de 2022;
- Elaboração de Boletim de Medição 06, referente a obra de reforma e adequação da antiga Creche Municipal (27/05);
- Elaboração de Boletim de Medição 04, referente a obra de Pavimentação com Pedras Irregulares e Drenagem Pluvial nas Ruas Ervin Mathaus Braun e Sinfrônio Júlio Ribeiro (27/05);
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 06, da obra de Reforma da Antiga Creche Municipal;
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 04 da obra de Pavimentação com Pedras Irregulares e Drenagem Pluvial nas Ruas Ervin Mathaus Braun e Sinfrônio Júlio Ribeiro;
- Reanálise do projeto, após parecer e recebimento de novos arquivos, referente ao Projeto de Estação de Rádio base para telefonia celular, situado no Distrito Cassemiro protocolo nº 878/2022;
- Reanálise do projeto, após parecer e recebimento de novos arquivos, referente ao Projeto de Estação de Rádio base para telefonia celular, situado na Vila São João protocolo nº 877/2022;
- Resposta ao contato da empresa Vale Engenharia, ganhadora da licitação para execução de Galpão para Máquinas na Sub Prefeitura do Sítio São João, com envio da localização e endereço do local do projeto;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (31/05);
- Conferência de medidas, após levantamento realizado anteriormente, referente a localização e dimensão das benfeitorias existentes na Praça Municipal;
- Visita para acompanhamento da obra e conferência de detalhes finais, assim como, relatório Fotográfico da obra de Reforma da Antiga Creche Municipal (31/05);
- Conversa com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a necessidade de elaboração de projeto de regularização a pessoas carentes, que possuem laudo da Assistência Social;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

- Elaboração de Planta de Situação/ Localização, após levantamento de medidas, referente a posição e dimensão das benfeitorias existentes na Praça Municipal, e entrega ao Setor de Cadastros Imobiliários, após solicitação dos mesmos;
- Termo de recebimento da Obra de Reforma da Antiga Creche Municipal;
- Reanálise de projeto, após envio de parecer e recebimento de novos arquivos, referente ao projeto de uma edificação em alvenaria, protocolo 939/2022;
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários, referente ao recebimento de novos arquivos do projeto de uma edificação em alvenaria, protocolo 939/2022;
- Atualização e elaboração de 3D no programa Sketchup, com o projeto da Escola Maria Belmont Albert finalizado, de modo a permitir entendimento referente ao Existente x Construído;
- Assinatura de documentação referente ao Termo Aditivo 01, da obra de Pavimentação;
- Resposta a contato de empresa Winity S.A., referente solicitação de protocolo com pedido de emissão de Certidão de Zoneamento; para fins de instalação de uma Estação de Rádio Base de Telefonia Celular no Imóvel localizado no Sítio Casemiro e São João;
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários e Secretaria do Meio Ambiente do Município, para entendimento referente a solicitação de Certidão de Zoneamento, feita pela empresa Winity S.A.;
- Assinatura referente ao Ofício de Resposta à Solicitação de aditivo da empresa, planilha de aditivo, relatório de aditivo e relatório fotográfico antes da reforma e após a reforma, referente a obra de Reforma da antiga Creche Municipal;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 27 de maio de 2022 até 03 de junho de 2022;
- Contato com responsável técnico referente ao Projeto de Edificação Residencial Multifamiliar, protocolo nº 799/2022;
- Contato como responsável técnico da empresa Winity S.A., referente aos projetos de Estação de Rádio Base de Telefonia Celular no Imóvel localizado no Sítio Casemiro e São João, protocolo 877/2022 e 878/2022;
- Elaboração e envio de parecer, após reanálise de projeto, referente ao Projeto de Edificação Residencial Multifamiliar, protocolo nº 799/2022;
- Elaboração e envio de parecer, após reanálise de projeto, referente ao Projeto de Estação de Rádio base para telefonia celular, situado no Distrito Cassemiro protocolo nº 878/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

- Elaboração de Boletim de Medição 05, referente a obra de Pavimentação com Pedras Irregulares e Drenagem Pluvial nas Ruas Ervin Mathaus Braun e Sinfrônio Júlio Ribeiro (07/06);
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 05 da obra de Pavimentação com Pedras Irregulares e Drenagem Pluvial nas Ruas Ervin Mathaus Braun e Sinfrônio Júlio Ribeiro;
- Visita para acompanhamento da obra de execução de rampas de acesso a pedestres e ambulância e das calçadas na Reforma do Hospital (07/06);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (07/06);
- Resposta ao contato do mestre de obras responsável pela execução da obra de ampliação do Centro Administrativo, referente a dúvidas quanto ao encanamento da drenagem pluvial;
- Alterações em planta baixa do projeto de Ampliação do Centro Administrativo, conforme solicitação por parte do prefeito de alterações no layout dos ambientes;
- Resposta ao contato da empresa Vale Engenharia, ganhadora da licitação para a execução do Galpão para Máquinas na Sub Prefeitura do São João, referente a terraplanagem e Ordem de Início da obra;
- Aprovação e entrega ao Setor de Cadastros Imobiliários, referente ao Projeto de Estação de Rádio base para telefonia celular, situado na Vila São João protocolo nº 877/2022;
- Pesquisa referente as atribuições de arquiteta para fiscalização de obras de Pavimentação Asfáltica;
- Assinatura de arquivos referentes ao Projeto de Pavimentação Asfáltica do Programa Pavimenta;
- Contato com setor de Cadastros Imobiliários referente a Certidão e Requerimento para Urbanização da área a ser feito posterior Loteamento Habitacional;
- Visita na Sub Prefeitura do Distrito São João para demarcação do local aonde será feito o galpão para máquinas, para viabilizar terraplanagem do terreno;
- Envio de arquivos, referentes ao Projeto de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert, após contato de empresa interessada em participar da Tomadas de Preços nº 006/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

- Conversa com prefeito referente ao pé direito do galpão a ser construído na Sub Prefeitura do São João e assinatura de certidão de urbanização para criação de loteamento habitacional;
- Visita para acompanhamento da obra e revisão dos itens finalizados para elaboração do Boletim de Medição, assim como, Relatório Fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (10/06);
- Elaboração de Boletim de Medição 08, referente a obra de Ampliação do Centro Administrativo (10/06);
- Assessoramento ao responsável técnico e requerente, referente ao item 1, do parecer do dia 06/05/2022, e contato com setor de Cadastros Imobiliários, para emissão de nova Certidão para atualização de matrícula, referente ao Projeto de Desmembramento, protocolo 721/2022;
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 08 da obra de Ampliação do Centro Administrativo (10/06);
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 03 de junho de 2022 até 10 de junho de 2022;
- Conversa com tesouraria referente a documentação da obra da Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal;
- Memorando a tesouraria em resposta a cláusula do contrato referente a obra da Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal;
- Envio de arquivos, referentes ao Projeto de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert, após contato de empresa interessada em participar da Tomadas de Preços nº 006/2022;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (14/06);
- Visita na obra de ampliação do Centro Administrativo para definição referente a paginação de piso porcelanato a ser colocado na área para divisórias;
- Conversa com setor de Cadastros Imobiliários e requerente do projeto, referente a Emissão de nova Certidão para atualização de matrícula do projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 721/2022;
- Análise de projeto de edificação em alvenaria, destinada ao uso Residencial Unifamiliar, protocolo nº 1072/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

- Resposta ao contato da empresa Winity, referente ao andamento na aprovação do projeto de torre de telefonia, a ser localizado no Distrito São João;
- Elaboração e envio de parecer ao responsável técnico, referente ao projeto de edificação em alvenaria, destinada ao uso Residencial Unifamiliar, protocolo nº 1072/2022;
- Elaboração de Boletim de Medição 01, referente ao Termo Aditivo 01, da obra de Adequação e Reforma da Antiga Creche Municipal;
- Visita in loco em residência de madeira, para levantamento de medidas, após recebimento de laudo social com pedido de projeto técnico para viabilizar ligação de luz e água;
- Visita para acompanhamento de execução das calçadas e rampas, assim como, relatório fotográfico do andamento da obra de Reforma do Hospital (15/06);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (15/06);
- Conferência de medidas, orientação solar e confrontantes, com setor de Cadastros Imobiliários referente a Emissão de nova Certidão para atualização de matrícula do projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 721/2022;
- Elaboração de desenho técnico, após medidas da visita in loco, com planta baixa, corte AA e corte BB, fachada e planta de cobertura, referente ao pedido do recebimento de laudo social e entrega ao Setor de Cadastros Imobiliários;
- Elaboração de Boletim de Medição 06, referente a obra de Pavimentação com Pedras Irregulares e Drenagem Pluvial nas Ruas Ervin Mathaus Braun e Sinfrônio Júlio Ribeiro (15/06);
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 06 da obra de Pavimentação com Pedras Irregulares e Drenagem Pluvial nas Ruas Ervin Mathaus Braun e Sinfrônio Júlio Ribeiro;
- Envio de arquivos, referentes ao Projeto de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert, após contato de empresa interessada em participar da Tomadas de Preços nº 006/2022;
- Elaboração de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU/RS, referente a Fiscalização de Execução da Obra de Pavimentação nas Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Rua Industrial e Estrada para Coronel Bicaco, 8.588,52 m².
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 10 de junho de 2022 até 17 de junho de 2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

- Elaboração de Relatório Fotográfico referente ao Boletim de Medição 01, do Termo Aditivo 01, da obra de Adequação e Reforma da Antiga Creche Municipal;
- Resposta ao contato de engenheiras referente a questionamento quanto a localização de fossa séptica e sumidouro permitido, conforme leis municipais;
- Envio de Ordem de Início do Galpão para Máquinas a ser construído na Sub Prefeitura do Distrito São João a empresa responsável pela execução do mesmo;
- Assinatura de Termo de Aditivo 01 referente à altura (pé direito) do Galpão para Máquinas a ser construído na Sub Prefeitura do Distrito São João;
- Resposta ao contato da empresa responsável pela execução do Galpão para Máquinas a ser construído na Sub Prefeitura do Distrito São João, referente a execução das fundações do mesmo;
- Análise de projeto com Croqui e Memorial Descritivo para retificação de lote urbano, inclusão do passeio público, referente a matrícula n 3.629, protocolo nº 1106/2022;
- Contato com setor de Cadastros Imobiliários referente ao projeto com Croqui e Memorial Descritivo para retificação de lote urbano, protocolo nº 1106/2022;
- Visita a obra do Centro Administrativo para conferência de medidas, após alterações na obra, para adequação do projeto em planta baixa, conforme executado;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (21/06);
- Alterações na planta baixa da Ampliação do Centro Administrativo;
- Alterações no Memorial de Cálculo para Aditivos da obra de Ampliação do Centro Administrativo, assim como, novos cálculos após alterações de determinados itens como muro, pisos, alvenarias, etc;
- Conversa com prefeito, engenheiro e secretário do planejamento para definições a serem consideradas em projeto de adequação de calçadas e acessos ao Centro Administrativo;
- Assinatura do prefeito, como confrontante responsável pelas ruas do município, para projeto de retificação de lote urbano, inclusão do passeio público, referente a matrícula n 3.629, protocolo nº 1106/2022;
- Conversa com prefeito referente a localização, disposição e medidas para layout dos setores do Centro Administrativo, para nova formatação em planta baixa com as divisórias;
- Conferência de Medidas de acessos do Centro Administrativo com engenheiro e sugestões em planta baixa referente a projeto de adequação de calçadas e acessos do espaço;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

- Elaboração de planta baixa, após contato com prefeito, referente ao layout das salas para os setores do Centro Administrativo, de forma a definir localização, dimensões e demais particularidades no prédio antigo e prédio novo;
- Resposta ao contato de engenheira referente a projeto protocolado anteriormente e recebimento de arquivos após parecer do setor para nova análise do mesmo;
- Aprovação e entrega ao Setor de Cadastros Imobiliários do projeto de Croqui e Memorial Descritivo para retificação do lote urbano, inclusão do passeio público, referente a matrícula n 3.629, protocolo nº 1106/2022;
- Conversa com prefeito e engenheiro Alterson, referente a projeto para Parada de Ônibus, sugestões e particularidades do mesmo;
- Análise de projeto de Retificação das Dimensões e da área Superficial de dois lotes urbanos, nº 268ª e nº 268B protocolo nº 1126/2022;
- Conversa com setor de Cadastros Imobiliários referente a largura da Rua Alberto Pasqualini, após recebimento de pedido referente ao assunto por parte da RGE;
- Contato com setor de Cadastros Imobiliários referente ao projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial, protocolo nº 1072/2022;
- Conversa com setor de Cadastros Imobiliários referente ao projeto de Retificação das Dimensões e da área Superficial de dois lotes urbanos, protocolo nº 1126/2022 e conferência do existente no Cadastro, assim como, lotes confrontantes;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 17 de junho de 2022 até 24 de junho de 2022;
- Auxílio ao Setor de Cadastros Imobiliários, referente ao Alvará de Construção do Projeto de Torre de Telefonia Sítio Cassemiro;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (24/06);
- Assinaturas de Alvarás de Construção;
- Assinaturas de Habite-se;
- Resposta ao contato da empresa responsável pela execução do Galpão para máquinas a ser construído no Distrito São João, referente ao desnível após terraplanagem;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

- Elaboração de placas de obras com informações referentes as obras de Ampliação da Escola Maria Belmont e Revitalização dos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Elaboração e envio de parecer ao responsável técnico, referente ao Projeto de Retificação das Dimensões e da Área superficial de dois lotes urbanos, protocolo nº 1126/2022;
- Elaboração e envio de parecer ao responsável técnico, referente ao Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1072/2022;
- Estudo nas leis Municipais, como Plano Diretor e Código de Edificações, referente as exigências na posição de Fossa Séptica;
- Elaboração de Boletim de Medição 07, referente a obra de Pavimentação com Pedras Irregulares e Drenagem Pluvial nas Ruas Ervin Mathaus Braun e Sinfrônio Júlio Ribeiro (28/06);
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 07 da obra de Pavimentação com Pedras Irregulares e Drenagem Pluvial nas Ruas Ervin Mathaus Braun e Sinfrônio Júlio Ribeiro;
- Visita na obra de Ampliação da Escola Maria Belmont, para locação da obra;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (29/06);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (29/06);
- Contato com gráfica para envio de modelos de placas a serem feitos nas obras;
- Resposta em e-mail referente a dúvida enviada pelo responsável técnico, após parecer enviado a este anteriormente, referente ao Projeto de Retificação das Dimensões e da Área superficial de dois lotes urbanos, protocolo nº 1126/2022;
- Visita a obra de ampliação do Centro Administrativo, para definição referente a colocação de piso na calçada de acesso a Garagem;
- Contato com setor de Cadastros Imobiliários, referente ao Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1150/2022;
- Contato com setor de Cadastros Imobiliários, referente a alteração de planta Hidrossanitária esgoto, em projeto aprovado anteriormente (p.a. 05/2022);



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

- Resposta ao contato da empresa Winity, após envio de novos arquivos para reanálise do Projeto de Torre de Telefonia na Linha Sítio Cassemiro;
- Contato com responsável técnico referente ao motivo de alteração de fossa séptica em projeto aprovado anteriormente;
- Reanálise do projeto, após recebimento de novos arquivos pós parecer, referente ao Projeto de Torre de Telefonia na Linha Sítio Cassemiro, protocolo 878/2022;
- Aprovação e entrega ao Setor de Cadastros Imobiliários, referente ao Projeto de Torre de Telefonia na Linha Sítio Cassemiro, protocolo nº 878/2022;
- Aprovação de alteração na prancha Hidrossanitária, referente ao projeto de Construção residencial em alvenaria, aprovação 05/2022;
- Recebimento de arquivos de projeto de edificação em alvenaria, protocolo 1072/2022, contato com responsável técnico e setor de cadastros Imobiliários;
- Elaboração de Ordem de Início referente a obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Elaboração de Ordem de Início referente a obra de Modernização do Estádio Municipal 883914/2019;
- Elaboração de Ordem de Início referente a obra de Modernização do Estádio Municipal 892538/2019;
- Elaboração de Ordem de Início referente a obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert, assim como, envio da mesma a empresa responsável pela execução;
- Reunião no gabinete do prefeito, referente a assinatura das Ordens de Início das obras e andamento de fiscalizações e projetos;
- Envio de imagens referentes a obra de Ampliação da Escola Maria Belmont, Modernização do estádio e revitalização dos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli.

### **SETOR DE ENGENHARIA**

- Plotagem de projeto dos passeios e rampas acessíveis da reforma e adequação do hospital municipal;
- Visita na obra da unidade de acolhimento para compatibilização de projeto de passeios e rampas acessíveis;
- Medição das Ruas Walter Perachi de Barcellos e Sinfrônio Júlio Ribeiro para montagem de aditivo;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

- Levantamento quantitativo das Ruas Walter Perachi de Barcellos e Sinfrônio Júlio Ribeiro para montagem de planilha orçamentária de aditivo do programa pavimentação;
- Projeto de asfalto em CBUC para verificar aditivo do programa pavimentação folhas 05 e 06 e folha de situação das ruas aditivadas;
- Ordem de Início para obra do programa pavimentação em asfalto CBUC;
- Montagem de Ofício de Solicitação de aditivo da construtora Machado para reforma e adequação da creche antiga;
- Montagem de Ofício de Solicitação de aditivo para unidade de acolhimento;
- Detalhamento de cotas de escada e rampa acessível para o mestre de obras na reforma e adequação do hospital municipal;
- Visita na reforma e adequação da creche antiga para conferência de itens finais de obra e limpeza;
- Termo de Recebimento da Creche Antiga;
- Montagem de aditivo do Asfalto em CBUC com preenchimento de PLE, PLQ, Planilha Orçamentária e Cronograma da Obra via SINAPI;
- Visita na Unidade de acolhimento para verificar a alteração de rampas com o novo mestre e muro Norte;
- Medição na praça das benfeitorias e dimensões da quadra para o setor de tributos;
- Ofício de Resposta ao pedido de termo aditivo da reforma da creche antiga;
- Atualização de Planilha Orçamentária do asfalto com Referência atual de 04-22 via SINAPI;
- Atualização de PLE, PLQ e Planilha Orçamentária do asfalto em CBUC via SINAPI com ref 04-22;
- Montagem de Resposta ao Ofício 02/2022 da reforma e adequação da creche antiga referente aos itens de aditivo;
- Montagem de Resposta ao Ofício 01/2022 da unidade de acolhimento referente aos itens de aditivo;
- Plotagem e cotas de projeto da creche gente miúda para confrontações de terreno com lote do vizinho para setor de Tributos;
- Solicitação de alteração de CND com contador da construtora Dionei Machado LTDA;
- Entrega ao setor de licitações do aditivo da reforma da creche antiga;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

- Resposta de Ofício ao Dionei Machado e memorando ao setor de licitações referente ao aditivo da reforma da creche antiga;
- Busca de comunicação interna no processo de módulos sanitários para entrega ao setor jurídico;
- Impressão deu uma via completa do aditivo da creche antiga, com relatório quantitativo e fotográfico, no total de 63 páginas;
- Resposta para solicitação de aditivo da unidade de acolhimento;
- Digitalização de convênios e projetos de aquisição de equipamentos agrícolas;
- Contato com o CAU-RS para verificar a questão de fiscalização de obras de pavimentação asfáltica para a kauhana;
- Visita no local da obra do galpão de máquinas no distrito São João para demarcação de local para terraplanagem;
- Levantamento dos Processos dos módulos sanitários e envio para o setor jurídico;
- Levantamento de metragem de projeto da obra de adequação de projeto acessível na reforma e adequação do hospital municipal para emissão de RT pela construtora;
- Simulação de aditivo para galpão de máquinas no distrito são joão;
- Montagem de planilha orçamentária em branco para cotação do projeto de esquadrias do hospital municipal;
- levantamento quantitativo de esquadrias em alumínio por itens unitários para cotação do projeto de esquadrias do hospital municipal;
- Reunião no gabinete para tratar do aditivo do galpão do distrito são joão e da abertura de cotação para projeto de esquadrias do hospital;
- Visita na obra de Reforma e ampliação do prédio administrativo para levantamento de medição;
- Memorando creche referente ao contrato;
- Alteração do piso tátil do projeto do passeio do prédio administrativo;
- Visita na obra de reforma e adequação do hospital municipal;
- Visita na remoção das rampas pelas ruas que receberão asfalto;
- Boletim de medição de pagamento do aditivo de revestimentos de porcelanatos;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

- Ordem de Início da obra das calçadas do hospital municipal;
- Atualização de planilha de controle de cargas para obra do asfalto;
- Montagem de planilha de medição da obra das calçadas e rampas acessíveis do hospital municipal;
- Montagem de relatório fotográfico da medição da obra das calçadas e rampas acessíveis do hospital municipal;
- Medição da casa do senhor João Carvalho para atendimento de requisição de regularização de numeração de imóvel;
- Memorando 05 de 13 de junho referente ao contrato de reforma e adequação do prédio da antiga creche referente à requisição de laudo de acessibilidade da obra;
- Início do projeto de calçadas e rampas acessíveis do prédio administrativo;
- Montagem de planilha de aditivo referente à obra do galpão metálico no distrito vila são joão;
- Montagem de planilha de desconto contratual referente à obra do galpão metálico no distrito vila são joão;
- Atualização de planilha de Esquadrias por itens unitários para cotações, referente à reforma e adequação do hospital municipal;
- Contato com empresas de Esquadrias para cotação de planilha orçamentária referente às esquadrias da reforma e adequação do hospital municipal;
- Verificação de memorial descritivo de ponto de ônibus para secretaria da educação;
- Montagem de termo aditivo do galpão do distrito são joão;
- Visita na obra das calçadas e rampas acessíveis da obra de reforma e adequação do hospital municipal no dia 20/06;
- Visita na escola Maria Belmonte com representante da construtora palmintinho onde será construída salas de aula;
- Laudo Social com memorial descrito para construção de banheiro, fossa filtro e sumidouro para Senhora Isabel Rolim Fontana ;
- Medição para pagamento 02 das calçadas e rampas acessíveis da reforma e adequação do hospital municipal;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

- Montagem de proposta de orçamento pelo padrão do município para licitação das esquadrias do hospital;
- Montagem de relatório fotográfico do boletim de medição 02 da obra das calçadas e rampas acessíveis da obra de reforma e adequação do hospital municipal;
- medição do prédio administrativo das rampas, escadas e análise para montagem de projeto de adequação conforme NBR 9050;
- Início do projeto de adequação das calçadas, rampas e escadas do prédio administrativo;
- Visita na obra das calçadas e rampas acessíveis da obra de reforma e adequação do hospital municipal no dia 21/06;
- Contato com empresa de esquadrias bigolin de ijuí para detalhamento do orçamento para licitar esquadrias;
- Alteração do projeto das Calçadas do Prédio Administrativo;
- Alteração do projeto de ponto de ônibus com reforço de estrutura e definição de pintura das paradas;
- Digitalização de processo para arquivo do setor de planejamento de aditivos da obra da creche antiga;
- Análise de proposta de Orçamento da empresa ELOSUL para construção de pontos de ônibus;
- Alteração da planilha orçamentária do projeto de ponto de ônibus;
- Continuação do projeto de adequação do prédio administrativo com montagem de corrimãos de rampas e escadas.

### **SETOR CONVÊNIOS E PARCERIAS**

- Realização de Cadastro no SEI - Correios;
- Contrato Correios;
- Envio de ofícios/documentos via Sedex;
- Impressão e Digitalização de documentos de Projetos de Aquisição de equipamentos Agrícolas;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA**

- Elaboração 7º aditivo ao Termo de Fomento da APAE.
- Organização pastas Comodatos e Cessão de Uso;
- Digitalização de documentos Comodatos/Cessão de Uso;
- Organização pastas Convênios e Parcerias;
- Digitalização documentos dos Convênios e Parcerias;
- Organização e preenchimento dos documentos para renovação do Termo de Cooperação com IGP;

Redentora, 01 de julho de 2022.

**LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN**  
Secretário Municipal de Planejamento
