



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JANEIRO/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área a Ser Construída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....	R\$ 965.277,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$ 40.203,37
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$ 102.046,35
Valor do 3º Termo Aditivo.....	R\$ 66.293,08
Valor do 5º Termo Aditivo.....	R\$ 32.772,30
Valor do 6º Termo Aditivo.....	R\$ 91.939,94
Valor do Reequilíbrio Financeiro.....	R\$ 311.290,92
Valor do 8º Termo Aditivo (Supressão de Valores).....	R\$ 129.899,19
Valor do 10º Termo Aditivo.....	R\$ 31.133,89
Valor do Aditivo (Supressão de Valores Final).....	R\$ 24.796,15
Valor do Aditivo (Supressão de Valores Final/Reequilíbrio).....	R\$ 1.697,86
Valor Total.....	R\$ 1.484.563,65
Valor Executado.....	R\$ 1.484.563,65

% Acumulado Executado da Obra: **100,00%**

Projeto Acessibilidade (Rampas e Calçadas)

Recurso: **Municipal**

Valor da Licitação.....	R\$ 126.196,72
Valor Executado.....	R\$ 126.196,72

% Acumulado Executado da Obra: **100,00%**

Projeto Esquadrias (Portas e Janelas)

Recurso: **Municipal**

Valor da Licitação.....	R\$ 276.057,80
Valor Executado.....	R\$ 231.597,69

% Acumulado Executado da Obra: **83,89%**

Valor Total

Valor Total Atualizado.....	R\$ 1.886.818,17
Valor Executado.....	R\$ 1.842.358,06

% Acumulado Executado da Obra: **97,64%**

Situação:

- Aguardando a Instalação das Telas de Proteção das Janelas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Ampliação da Escola Municipal Maria Belmont Albert

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 449.232,00

Valor da Licitação.....R\$ 449.036,77

Valor Executado.....R\$ 351.056,73

Percentual Executado: 78,18%

Item:

Construção de 04 Salas de Aula e Sanitários

Situação:

- Em fase de pintura interna e externa.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 45.484,02

Valor da Licitação.....R\$ 295.484,02

Valor Executado.....R\$ 117.614,51

Percentual Executado: 39,80%

Situação Atual da Obra:

- Em fase de colocação das portas e janelas.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Concedente**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 115.973,14

Valor da Licitação.....R\$ 402.473,14

Valor Executado.....R\$ 134.153,68

Percentual Executado: 33,33%

Situação:

- Em fase de levantamento das platibandas e colocação da estrutura do telhado.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Revitalização da Avenida Constante Luiz Gemelli

Recurso: **Municipal**

Valor.....R\$ 513.969,56

Valor da Licitação.....R\$ 478.493,00

Valor Executado.....R\$ 182.001,41

Percentual Executado: 38,04%

Atividades:

- Em Execução dos Canteiros 01, 02, 03 e 04.
- Realizado Boletim de Medição nº 03 no Valor de R\$ 84.086,20

Quadra 01 – Em Frente à Escola Feliciano Jorge Albert



Quadra 02 – Em Frente à Praça Arnaldo Roever





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Quadra 03 – Em Frente à Agência do Banco do Brasil



Quadra 04 – Em Frente à Assistência Social





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Quadra 05 – Em Frente ao Banrisul





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado.....R\$ **182.456,03**

Valor da Licitação.....R\$ **149.554,87**

Valor Executado.....R\$ **111.085,09**

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Erwin Mathaus Braun

Rua Sinfrônio Julio Ribeiro

Situação:

- Aguardando a Colocação dos Meio Fio e pó de brita, Conclusão das bocas de lobo.
- Executado **74,28%.**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de Paradas de Ônibus

Recurso: **Municipal**

Quantidade: **10 Unidades + 02 Unidades (Aditivo): Total 12 Unidades**

Valor.....R\$ 75.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 52.300,00

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 10.460,00

Valor da Licitação.....R\$ 62.760,00

Situação:

- Projeto Concluído.



Escola Municipal São José



Escola Municipal Maria Belmont Albert



Escola Municipal Gente Miúda



Escola Municipal Menino Jesus



Escola Municipal Assis Brasil



Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



Rua Wanderlei de Oliveira Pereira



Rua Major Feliciano



Localidade de São Sebastião



Setor Indígena de Estiva



Distrito de São João



Linha Mânica



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00

Itens:

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico (Já Entregue);

01 (uma) Roçadeira Agrícola (Já Entregue);

01 (uma) Carreta Agrícola Metálica Basculante;

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes.

Situação:

- Solicitado às empresas a entrega dos equipamentos restantes.



Roçadeira Agrícola



Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânica



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **013316/2020**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Bohn Gass**

Valor Repasse.....R\$ 171.900,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.100,00

Valor Total.....R\$ 174.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 171.650,00

Itens:

01 (uma) Roçadeira Agrícola Articulada;

01 (uma) Plantadeira Plantio Direto 05 Linhas.

Situação:

- Licitação Aprovada, Aguardando a liberação do recurso pelo Ministério da Agricultura.

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Heitor Schuch**

Proposta SICONV: **002523/2022**

Valor Repasse.....R\$ 143.250,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.750,00

Valor Total.....R\$ 146.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 144.150,00

Itens:

01 (uma) Grade Aradora

01 (uma) Grade Niveladora

01 (uma) Carreta Agrícola com Carroceria de Madeira

01 (uma) Roçadeira Agrícola

Situação:

- Licitação Aprovada, Aguardando a liberação do recurso pelo Ministério da Agricultura.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Saúde – Fundo a Fundo**

Valor Repasse.....R\$ 50.000,00

Valor Total.....R\$ 50.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 38.501,16

Item:

Equipamentos e Material Permanente

01 Câmara para Conservação de Vacinas, Medicamentos;

01 Eletrocardiógrafo;

01 Monitor de Sinais Vitais;

01 Cilindro para Oxigênio Medicinal 50 Litros

02 Cilindro para Oxigênio Medicinal 7 Litros

04 Cadeiras de Rodas Adulto Dobrável

05 Nebulizador Ultrassônico

Atividades:

- Em fase de entrega dos equipamentos.



Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 765.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 758.000,00

Aquisição de 01 (um) Caminhão Equipado com Caçamba de no Mínimo 12m³

Situação:

- Licitação realizada, aguardando a entrega do Veículo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Execução de Piso de Concreto e Drenagem na Quadra de Esportes

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado do Projeto.....R\$ 126.308,17


Valor da Licitação.....R\$ 105.840,50

Objeto:

- Execução de Piso de Concreto na Quadra de Esportes da Praça Arnaldo Roever.

Situação:

- Emitida Ordem de Início de Obras em 10/01/2023, aguardando início das obras.

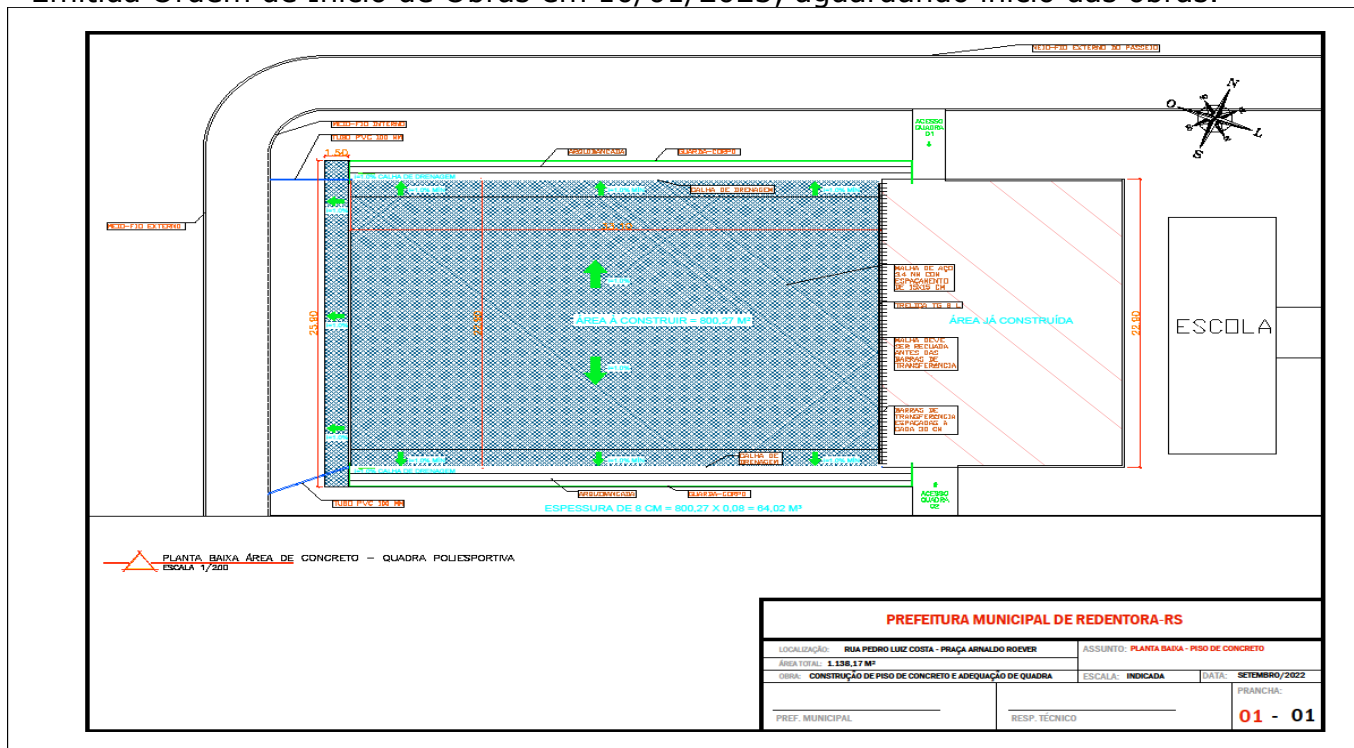

Aquisição de 01 (um) Veículo Tipo VAN Passageiros

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 365.957,67

Valor da Licitação.....R\$ 365.957,67

Itens:

Aquisição de 01 (um) Veículo Tipo VAN com no mínimo 21 Lugares

Situação:

- Em fase de Licitação, Certame previsto para o dia 06/02/2023.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **052170/2021**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 239.750,00


Objeto: **Pavimentação com Pedras Irregulares na Localidade de Vila São Sebastião**

Atividades:

- Proposta Aprovada / Contrato de Repasse Assinado

Situação:

- Em fase de Licitação, data prevista do certame dia 06/02/2023.

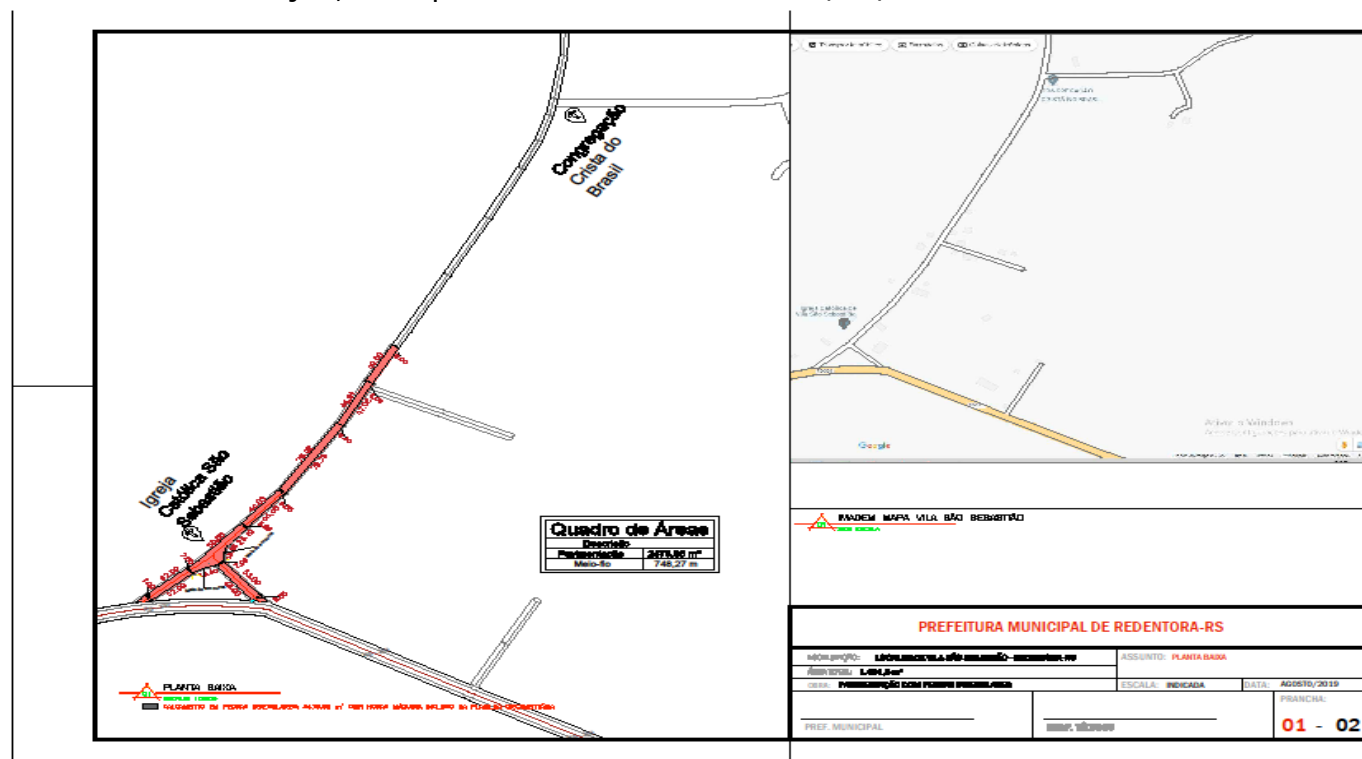



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETO CONCLUÍDO – Aguardando Liberação

Pavimentação Asfáltica (Pavimenta)

Órgão Concedente: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.**

Recurso: **Programa Pavimenta**

Objeto:

Pavimentação Asfáltica

- Trecho da Rua Acelyno Lutz Pinheiro
- Estrada Saída para Coronel Bicaco
- Rua Industrial I

Área a Ser Pavimentada: **8.588m²**

Área a Ser Pavimentada (Aditivo): **1.778,32m²**

Área Total Ser Pavimentada: **10.366,32m²**

Valor Repasse.....R\$ 701.948,40

Valor Contrapartida.....R\$ 218.306,38

Valor da Licitação.....R\$ 920.254,78

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 182.234,80

Valor Total da Obra.....R\$ 1.102.489,58

Percentual Executado do Total da Obra: 100,00%

Valor Total Pago a Empresa.....R\$ 821.125,70

Valor a Pagar a Empresa.....R\$ 281.363,88

Situação:

- Obra Concluída, Aguardando Liberação da 3ª Parcelas do Recurso.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS EM ANÁLISE (GOVERNO RS)

Aquisição de Veículo

Órgão Concedente: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano/RS.**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Patrícia Alba**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 12.665,00

Valor Total.....R\$ 112.665,00

Item:

Aquisição de Um Veículo de Pequeno Porte

Situação:

- Projeto enviado para análise.

PROJETOS EM ELABORAÇÃO:

Adequação do Entorno da Escola Municipal Maria Belmont Albert

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto Estimado.....R\$ 300.000,00

Descrição:

Muro, Grades, Passeio Público, Calçadas, Rampas de Acesso.

Situação:

- Em Elaboração.

DEMAIS ATIVIDADES:

- Análises de Projetos de Construção;
- Levantamento dos Itens Faltantes de Prevenção de Incêndio nas Escolas;
- Visitas para análise e Elaboração de Projetos de Auxílios Sociais;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Perfuração de Poços

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

Valor Total.....	R\$	70.000,00
Valor da Licitação (Geólogo).....	R\$	4.440,00
Valor da Licitação (Perfuração).....	R\$	45.500,00
Termo Aditivo (Adição) da Licitação (Perfuração).....	R\$	11.000,00
Termo Aditivo (Supressão) da Licitação (Perfuração).....	R\$	2.350,00
Valor Total Utilizado.....	R\$	58.590,00

Item:

Realizada a Perfuração dos Poços Tubulares Profundos (Poços Artesianos)

Situação:

- Projeto concluído.



Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....	R\$	35.374,00
Valor Contrapartida.....	R\$	3.036,00
Valor Total.....	R\$	38.410,00

Item:

Aquisição de 262 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Situação:

- Não Executado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Situação:

- Prestação de Contas complementada e enviada para análise.

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Situação:

- Prestação de Contas Enviada para Análise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

RELATÓRIOS

SETOR DE ARQUITETURA

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 23 de Dezembro de 2022 até 30 de Dezembro de 2022;
- Resposta ao contato de empresa responsável pela execução da obra de Reforma da Quadra de Esportes na Praça Arnaldo Roever, para esclarecimento de dúvidas referente ao projeto;
- Resposta ao contato de secretária da educação, referente à solicitação de elaboração de Projetos de cobertura de acesso nas Escolas Municipais Assis Brasil, São José e Gente Miúda;
- Esclarecimento de dúvidas e assessoramento a responsável técnico, referente à aprovação de planta baixa, para anexo a projeto aprovado anteriormente;
- Assinatura de Alvarás de Construção, Cartas de Vistoria e Habite-se;
- Resposta ao contato de responsável técnico, referente à aprovação de mais uma via de Projeto de Regularização residencial e comercial, aprovação 40/2022;
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, medição do espaço necessário para elaboração de projeto de entorno e acessos (rampa e escada) na obra da Escola Maria Belmont Albert;
- Análise de Projeto de Regularização Residencial na Matrícula 1.679, protocolo nº 2284/2022;
- Elaboração e envio ao responsável técnico, referente à análise de Projeto de Regularização Residencial na Matrícula 1.679, protocolo nº 2284/2022;
- Aprovação e entrega ao responsável técnico, de mais uma via, referente à Projeto de Regularização residencial e comercial, aprovação 40/2022;
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários, referente ao requerimento de aprovação de planta baixa para comprovação de existência de benfeitoria, protocolo nº 21/2023;
- Contato com responsável técnico, referente à necessidade de envio de matrícula atualizada, referente ao requerimento, protocolo nº 21/2023;
- Contato com prefeito, referente à necessidade de remoção de vegetação em contato com fiação elétrica, no Projeto de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra e conferência de vegetação a ser removido no Projeto de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (05/01);
- Atualização em planta baixa nas pranchas de projeto, (canteiros 01 e 02) após execução, para viabilizar a elaboração de aditivo 01 da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Nova análise, após recebimento de matrícula atualizada, e contato com setor de cadastros Imobiliários, referente ao protocolo nº 21/2023;
- Definição com responsável técnico e Setor de Cadastros Imobiliários, referente à necessidade de pedido de Habite-se para aprovação de planta baixa para comprovação de existência de benfeitoria, protocolo nº 21/2023;
- Definição com Setor de Cadastros Imobiliários de base para reajuste de valores 2023 na avaliação de imóveis e terrenos assim como, montagem de tabela a partir deste;
- Auxílio a responsável técnico, referente à Análise de Projeto de Retificação de lote urbano, para inclusão de passeio público;
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários, referente a formas de dar seguimento e aprovação ao Projeto de Retificação de lote urbano, para inclusão de passeio público;
- Contato com responsável técnico, referente a assessoramento no Projeto de Retificação de lote urbano, para inclusão de passeio público;
- Resposta ao contato de Setor Jurídico, e entrega de Boletins de Medição e Ordem de Início, para resposta referente à prorrogação de prazo da Obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 e obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019;
- Resposta ao contato da empresa responsável pela execução da obra das Paradas de ônibus, referente à localização dos pontos a serem instalados os mesmos;
- Contato com prefeito referente à solicitação de empresa para definição e fotos referente à localização de instalação das paradas de ônibus;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 30 de Dezembro de 2022 até 06 de Janeiro de 2022;
- Resposta ao contato de empresa responsável pela execução da Obra de Execução de Instalações de Abrigo de Parada de Ônibus, referente à alteração na altura total da mesma e solicitação de imagens em alta resolução do Brasão do Município e logomarca da gestão para adesivagem conforme projeto;
- Solicitação do prefeito e setor de licitações, de mapa com demarcação/ localização de instalação de rotatória na esquina entre a Avenida Constante Luiz Gemelli e Rua Major Feliciano (em diagonal com a Praça Arnaldo Roever);



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

- Elaboração de Ordem de Início referente à Obra de Adequação da Quadra Poliesportiva localizada na Praça Arnaldo Roever, com execução de piso em concreto e drenagem;
- Assinaturas de Alvarás de Construção, Cartas de Vistoria e Habite-se;
- Aprovação de planta baixa para comprovação de existência de benfeitoria, protocolo nº 21/2023, aprovação 01/2023;
- Contato com responsável técnico, referente à aprovação de planta baixa para comprovação de existência de benfeitoria, protocolo nº 21/2023;
- Contato com empresa responsável pela Obra de Adequação da Quadra Poliesportiva localizada na Praça Arnaldo Roever, com execução de piso em concreto e drenagem, para envio de Ordem de Início;
- Conferência de arquivos para abertura de Processo de Licitação, referente a Obras de Calçamento estradas Vicinais na Vila São Sebastião;
- Elaboração de mapa com demarcação de rotatória com tachão bidirecional amarelo com elemento refletivo, no cruzamento entre a Avenida Constante Luiz Gemelli e Rua Major Feliciano;
- Contato com empresa para solicitação de orçamento referente à compra de 100 unidades de tachão bidirecional amarelo com elemento refletivo e cola para fixação;
- Reunião com prefeito e empresa responsável pela execução do Hospital Santa Rita de Cássia, para alinhamento dos últimos ajustes para entrega da obra de reforma;
- Visita para acompanhamento da obra, com prefeito e empresa responsável pela execução, na obra de Reforma do Hospital Santa Rita de Cássia, para conferência de pontos a serem melhorados e finalizados para entrega da mesma; (11/01)
- Visita para acompanhamento da obra, com prefeito e empresa responsável pela execução, na obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert; (11/01)
- Assinaturas de Alvarás de Construção, Cartas de Vistoria e Habite-se;
- Entrega ao Setor de Compras e licitações de Mapa com indicação de local de rotatório com tachões e orçamentos referentes à compra dos mesmos;
- Solicitação de documentação a empresa responsável pelo fornecimento dos tachões para viabilizar compra;
- Adequação em planta baixa e estudo em planilha para viabilizar elaboração de Aditivo 01, referente à Obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

- Adequação em planta baixa e estudo em planilha para viabilizar elaboração de Aditivo 01, referente à Obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Resposta ao contato de empresa responsável pela execução da Obra das Paradas de ônibus, referente à localização das mesmas;
- Reunião com secretário do planejamento e prefeito referente à definição de local de execução das paradas de ônibus;
- Confirmação com empresa referente à marcação das paradas de ônibus e início de execução de fundações;
- Reunião com secretário do planejamento, prefeito e motorista dos ônibus escolares, referente à definição de localização das paradas de ônibus;
- Visita in loco nos pontos definidos para execução das paradas de ônibus, para marcação das mesmas com empresa responsável pela execução.

Redentora, 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento
