



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

NOVEMBRO/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área a Ser Construída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....	R\$ 965.277,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$ 40.203,37
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$ 102.046,35
Valor do 3º Termo Aditivo.....	R\$ 66.293,08
Valor do 5º Termo Aditivo.....	R\$ 32.772,30
Valor do 6º Termo Aditivo.....	R\$ 91.939,94
Valor do Reequilíbrio Financeiro.....	R\$ 311.290,92
Valor do 8º Termo Aditivo (Supressão de Valores).....	R\$ 129.899,19
Valor do 10º Termo Aditivo.....	R\$ 31.133,89
Valor Total.....	R\$ 1.511.057,66
Valor Executado.....	R\$ 1.390.665,42

% Acumulado Executado da Obra: **92,03%**

Projeto Acessibilidade (Rampas e Calçadas)

Valor da Licitação.....	R\$ 126.196,72
Valor Executado.....	R\$ 100.256,85

% Acumulado Executado da Obra: **79,44%**

Projeto Esquadrias (Portas e Janelas)

Valor da Licitação.....	R\$ 276.057,80
Valor Executado.....	R\$ 231.597,69

% Acumulado Executado da Obra: **83,89%**

Projeto de Entrada de Energia Elétrica

Valor da Licitação.....	R\$ 68.800,00
Valor Executado.....	R\$ 0,00

% Acumulado Executado da Obra: **0,00%**

Valor Total

Valor Total Atualizado.....	R\$ 1.982.112,18
Valor Executado.....	R\$ 1.722.519,96

% Acumulado Executado da Obra: **86,90%**

Atividades:

- Em fase de Instalações das Portas e Janelas Externas e acabamentos das calçadas;
- Realizado Boletim de Medição nº 03 das Portas e Janelas no Valor de R\$ 96.681,56;
- Em fase de Instalações dos Corrimãos nas Rampas de Acesso;
- Em fase de Instalação da Entrada de Energia Elétrica.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**

Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....R\$ 450.000,00

Valor Executado pela 1ª Empresa.....R\$ 176.286,85

Valor do Projeto Remanescente.....R\$ 264.705,84

Valor Executado do Projeto Remanescente.....R\$ 264.705,84

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 35.914,94

Valor Executado do Termo Aditivo.....R\$ 35.914,94

Valor Total do Projeto (Projeto Inicial + Projeto Novo + Aditivo)....R\$ 476.653,25

Valor Total Executado (Projeto Inicial + Projeto Novo + Aditivo)....R\$ 476.653,25

Atividades:

- Realizado Boletim de Medição Final da Obra no Valor de R\$ 36.445,33;
- Realizada dia 07/11/2022 a Vistoria Final da Obra pelo Fiscal da Caixa Econômica Federal;
- Realizado o Pagamento Final a Empresa.

Situação Atual da Obra:


- Executado (acumulado) **100,00%**



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

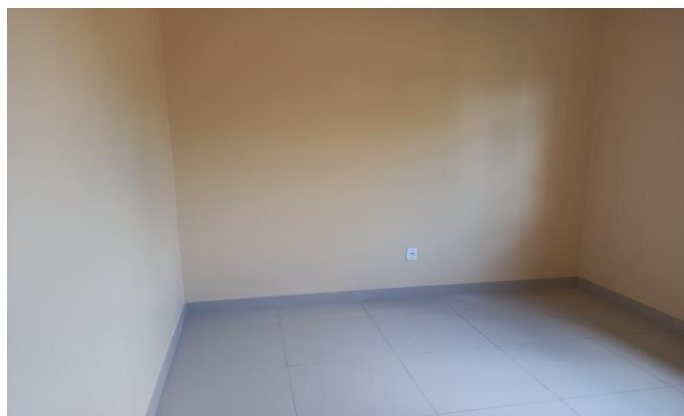

Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação da Escola Municipal Maria Belmont Albert

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 449.232,00

Valor da Licitação.....R\$ 449.232,00

Valor Executado.....R\$ 293.245,86

Percentual Executado: 65,31%

Item:

Construção de 04 Salas de Aula e Sanitários

Atividades

- Em fase de reboco das paredes externas e internas e Colocação das Janelas e contrapiso;
- Realizado Boletim de Medição nº 05 no valor de R\$ 44.610,56





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 45.484,02

Valor da Licitação.....R\$ 295.484,02

Valor Executado.....R\$ 97.223,08

Percentual Executado: 32,90%

Atividades:

- Emitido Boletim de Medição nº 04 no valor de R\$ 21.594,32;
- Em fase de reboco e massa fina.

Situação Atual da Obra:

- Em Execução.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Concedente**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 115.973,14

Valor da Licitação.....R\$ 402.473,14

Valor Executado.....R\$ 79.532,90

Percentual Executado: 19,76%

Atividades:

- Em fase de levantamento das paredes;
- Realizado Boletim de Medição nº 03 no Valor de R\$ 21.054,88

Situação Atual da Obra:

- Em Execução.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Revitalização da Avenida Constante Luiz Gemelli

Recurso: **Municipal**

Valor.....R\$ 513.969,56

Valor da Licitação.....R\$ 478.493,00

Valor Executado.....R\$ 26.178,35

Valor Executado.....R\$ 97.915,21

Percentual Executado: 20,47%

Atividades:

- Em Execução dos Canteiros 01, 02 e 03.

Quadra 01 – Em Frente à Escola Feliciano Jorge Albert



Quadra 02 – Em Frente à Praça Arnaldo Roever





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Quadra 03 – Em Frente à Agência do Banco do Brasil





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado.....R\$ 182.456,03

Valor da Licitação.....R\$ 149.554,87

Valor Executado.....R\$ 111.085,09

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Erwin Mathaus Braun

Rua Sinfrônio Julio Ribeiro

Atividades:

- Iniciada a Colocação dos Meio Fio.

Situação Atual da Obra:

- Executado **74,28%.**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Paradas de Ônibus

Recurso: **Municipal**


Quantidade: **10 Unidades + 02 Unidades (Aditivo): Total 12 Unidades**

Valor.....R\$ 75.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 52.300,00

Atividades:

- Realizado o Processo de Licitação;
- Realizado o Aditivo de mais 02 Unidades em virtude da sobra de recurso da licitação;
- Aguardando a Definição dos Locais para instalação.

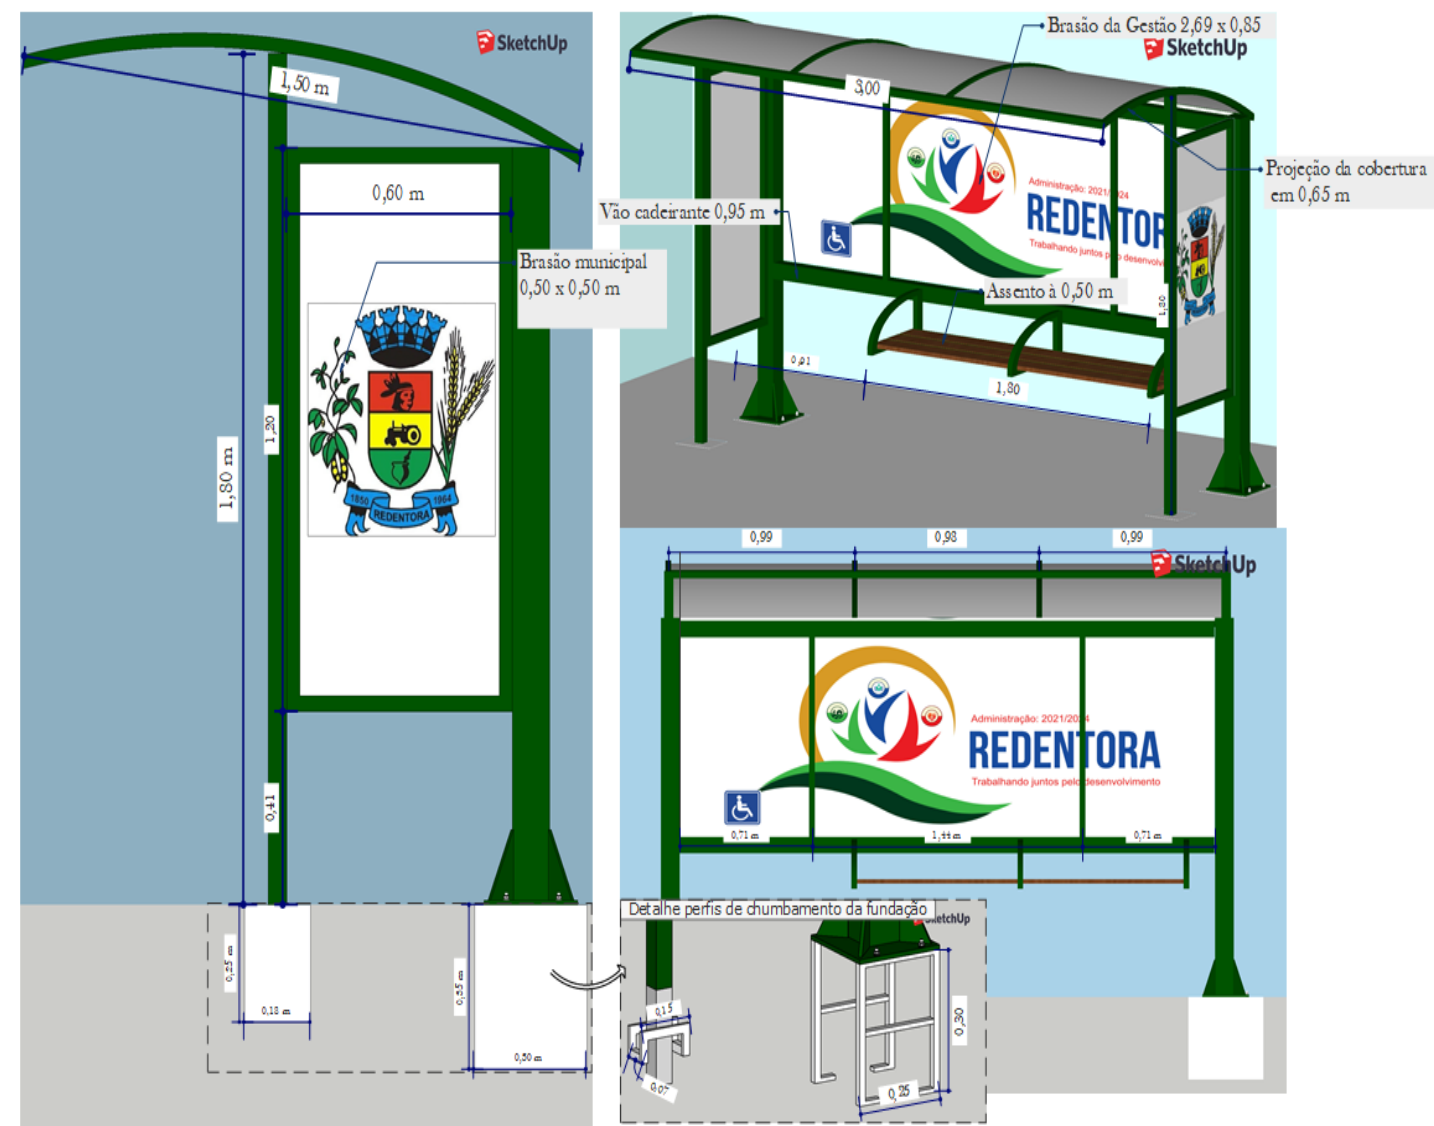



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Execução de Entrada de Energia Elétrica – Hospital Municipal


Recurso: **Municipal**

Valor.....R\$ **75.121,00**

Valor da Licitação.....R\$ **68.800,00**

Atividades:

- Emitida Ordem de Início da Obra;
- Iniciada a obra em 25/11/2022 pela empresa.

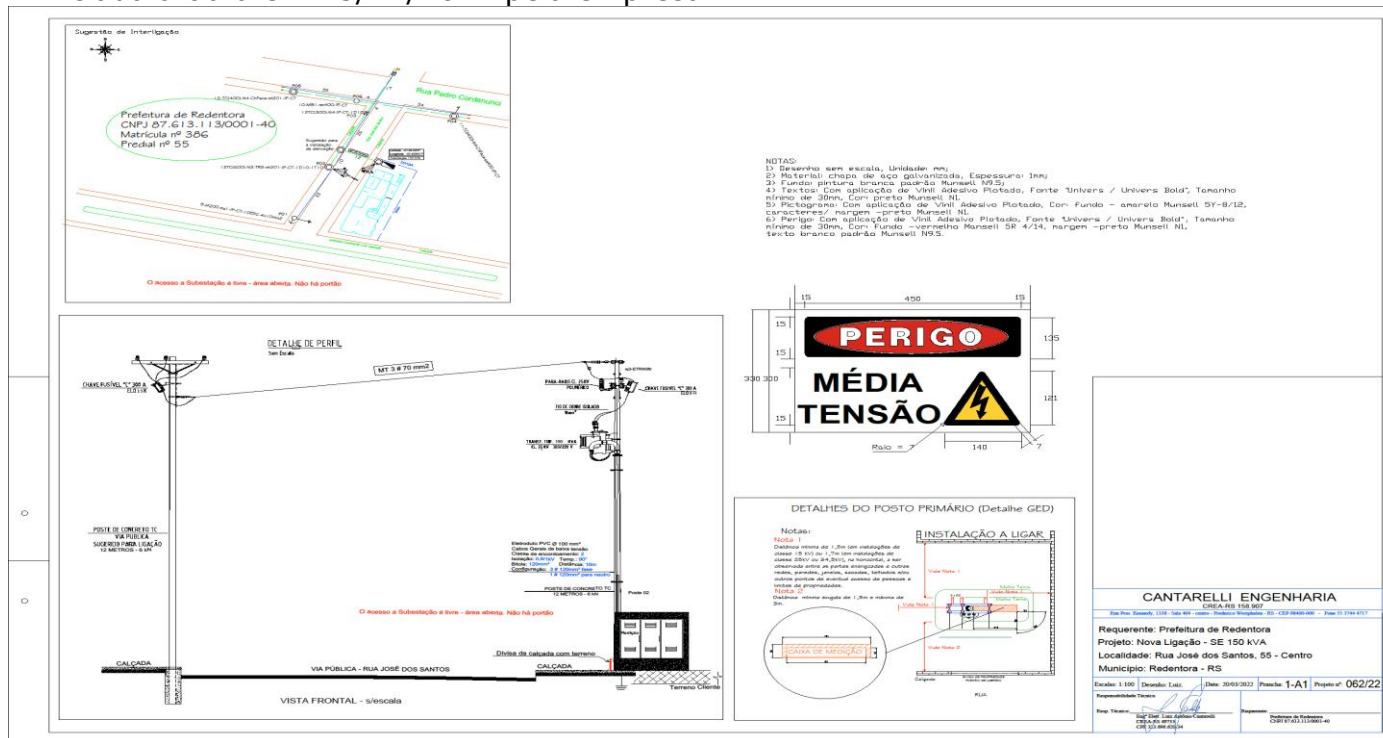

Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento de Urgência

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-003**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Item:

- 01 (um) Equipamento Raio X Fixo Analógico;
- 01 (um) Eletrocardiógrafo;
- 01 (um) Monitor Multiparâmetros;
- 01 (um) Desfibrilador Convencional;
- 01 (uma) Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica;
- 03 (três) Carro de Emergência;
- 01 (um) Carro Maca Avançada;
- 01 (uma) Bomba de Infusão;
- 01 (um) Aspirador de Secreção Elétrico Móvel;
- 01 (um) Carro de Curativos;
- 01 (um) Bebedouro;
- 01 (uma) Mesa de Cabeceira;
- 02 (dois) Computador.
- 07 (sete) Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica (Adquirido com Saldo do Repasse).

Atividades:

- Em fase de entrega dos equipamentos.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.256000/1220-02**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Lasier Martins**

Valor Repasse.....R\$ 80.000,00

Valor Total.....R\$ 80.000,00


Item:

Equipamentos e Material Permanente

06 Computador
01 Notebook
05 Impressora
03 Lanterna Clínica
01 Espaldar em Madeira
01 Detector Fetal
01 Balança Digital Portátil
01 Martelo de Reflexo
02 Escada com 2 Degraus
01 Estetoscópio
02 Andador
04 Mesa Ginecológica
01 Biombo
01 Goniômetro
01 TENS e FES
01 Ultrassom Fisioterapia
01 Cama Elástica Proprioceptiva
06 Exercitador de Mãos e Dedos
03 Fotopolimerizador de Resinas
01 Computador (Aditivo)

Atividades:

- Em fase de entrega dos equipamentos.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00

Itens:

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico (Já Entregue);

01 (uma) Roçadeira Agrícola (Já Entregue);

01 (uma) Carreta Agrícola Metálica Basculante;

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes.

Atividades:

- Em fase de Licitação dos equipamentos não adquiridos no 1º Processo de Licitação.



Roçadeira Agrícola



Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânica



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **013316/2020**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Bohn Gass**

Valor Repasse.....R\$ 171.900,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.100,00

Valor Total.....R\$ 174.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 171.650,00

Item:

01 (uma) Roçadeira Agrícola Articulada;

01 (uma) Plantadeira Plantio Direto 05 Linhas.

Situação:

- Aguardando Aprovação pelo Ministério da Agricultura do Processo de Licitação.



Imagens Ilustrativas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Heitor Schuch**

Proposta SICONV: **002523/2022**

Valor Repasse.....R\$	143.250,00
Valor Contrapartida.....R\$	2.750,00
Valor Total.....R\$	146.000,00

Itens:

- 01 (uma) Grade Aradora
- 01 (uma) Grade Niveladora
- 01 (uma) Carreta Agrícola com Carroceria de Madeira
- 01 (uma) Roçadeira Agrícola

Situação:

- Em fase de Licitação.

Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Saúde – Fundo a Fundo**

Valor Repasse.....R\$	50.000,00
Valor Total.....R\$	50.000,00

Item:

Equipamentos e Material Permanente

- 01 Câmara para Conservação de Vacinas, Medicamentos;
- 01 Eletrocardiógrafo;
- 01 Monitor de Sinais Vitais;
- 01 Cilindro para Oxigênio Medicinal 50 Litros
- 02 Cilindro para Oxigênio Medicinal 7 Litros
- 04 Cadeiras de Rodas Adulto Dobrável
- 05 Nebulizador Ultrassônico

Atividades:

- Em fase de Licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 765.000,00

Aquisição de 01 (um) Caminhão Equipado com Caçamba de no Mínimo 12m³

Atividades:

- Encaminhado ao Setor de Licitação

Aquisição de Máquinas Pesadas

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 1.580.000,00

01 (uma) Escavadeira Hidráulica com Peso Operacional Mínimo de 14.000 kg

01 (uma) Pá Carregadeira com Peso Operacional Mínimo de 10.800 kg

Atividades:

- Encaminhado ao Setor de Licitação



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS CONCLUÍDOS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Prédio do Centro Administrativo Municipal

Recurso: **Municipal**

Valor da Licitação.....	R\$ 352.174,94
Valor do Aditivo de Supressão.....	R\$ 52.131,03
Valor Atualizado do Projeto.....	R\$ 300.043,91
Valor Executado.....	R\$ 300.043,91
Valor do Termo Aditivo	R\$ 74.726,40
Valor Total da Obra.....	R\$ 374.770,31

Percentual Executado: **100,00%.**

Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação Asfáltica – Perímetro Urbano

Órgão Concedente: **Governo do Estado do Rio Grande do Sul.**

Recurso: **Programa Pavimenta**

Objeto:

Pavimentação Asfáltica

- Trecho da Rua Acelyno Lutz Pinheiro
- Estrada Saída para Coronel Bicaco
- Rua Industrial I

Área a Ser Pavimentada: **8.588m²**

Área a Ser Pavimentada (Aditivo): **1.778,32m²**

Área Total Ser Pavimentada: **10.366,32m²**

Valor Repasse.....R\$ 701.948,40

Valor Contrapartida.....R\$ 218.306,38

Valor da Licitação.....R\$ 920.254,78

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 182.234,80

Valor Total da Obra.....R\$ 1.102.489,58

Percentual Executado do Total da Obra: 100,00%

Valor Total Pago a Empresa.....R\$ 609.529,70

Situação:

- Obra Concluída
- Aguardando Liberação da 2ª e 3ª Parcelas do Recurso.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Um Galpão das Máquinas na Sub Prefeitura de São João

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 108.024,60

Valor da Licitação.....R\$ 94.895,25

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 4.800,12

Valor Total da Obra.....R\$ 99.695,37

Descrição: **Construção de Um Galpão Para Máquinas na Subprefeitura de São João**

Área: **184,00m²**

Atividades:

- Realizado o Pagamento do valor referente o contrato inicial no valor de R\$ 94.895,25.

Situação:

- Obra Concluída.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Recurso: **Municipal**

Item:

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Valor do Projeto.....R\$ 106.678,63

Valor da Licitação.....R\$ 106.635,75

Valor Executado.....R\$ 106.635,75

Atividades:

- - Em fase de elaboração do Termo Aditivo da Obra R\$ 21.317,39

Situação Atual da Obra:

- Executado **100,00%.**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

Valor.....R\$ 340.585,32

Item:

Implantação de 20 Módulos Sanitários





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 466.666,67

Valor da Licitação.....R\$ 465.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira, 4x4, Motor com Potência Mínima de 85HP

Atividades:

- Equipamento Entregue dia 07/07/2022.

Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **044467/2019**

Valor Repasse.....R\$ 146.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 4.800,00

Valor Total.....R\$ 150.800,00

Valor da Licitação.....R\$ 149.150,00

Itens:

02 (duas) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

Situação:

- Concluído





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **023468/2021**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.100,00

Valor Total.....R\$ 332.600,00

Valor da Licitação.....R\$ 332.500,00

Item:

Aquisição de 02 Tratores Agrícolas (75cv)

Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Um Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido

Recurso: **Municipal (Emendas Impositivas Vereadores)**

Valor Total.....R\$ 72.333,33

Valor da Licitação.....R\$ 47.300,00

Itens:

Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido

Atividades:

- Equipamento Entregue pela Empresa.

Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 614.166,67

Valor da Licitação.....R\$ 614.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (um) Caminhão Equipado com Caçamba de no Mínimo 12m³

Atividades:

- Veículo entregue dia 10/10/2022

Situação:

- Concluído





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM ELABORAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM ANÁLISE (GOVERNO RS)

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2018/2019**

Valor Repasse.....R\$ 59.009,21

Valor Contrapartida.....R\$ 1.834,87

Valor Total.....R\$ 60.844,08

Item:

Aquisição de 418 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Situação:

- Aguardando a Aprovação do Plano de Trabalho para posterior realização da Licitação.

Aquisição de Veículo

Órgão Concedente: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano/RS.**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Patrícia Alba**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 12.665,00

Valor Total.....R\$ 112.665,00

Item:

Aquisição de Um Veículo de Pequeno Porte

Atividades:

- Projeto enviado para análise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM ELABORAÇÃO:

Ampliação do Perímetro Urbano


Recurso: **Municipal**

Atividades:

- Encaminhada Documentação ao Tabelionato para realizar a localização de parcela na Matrícula

Situação:

- Em fase de elaboração dos mapas da ampliação do perímetro urbano

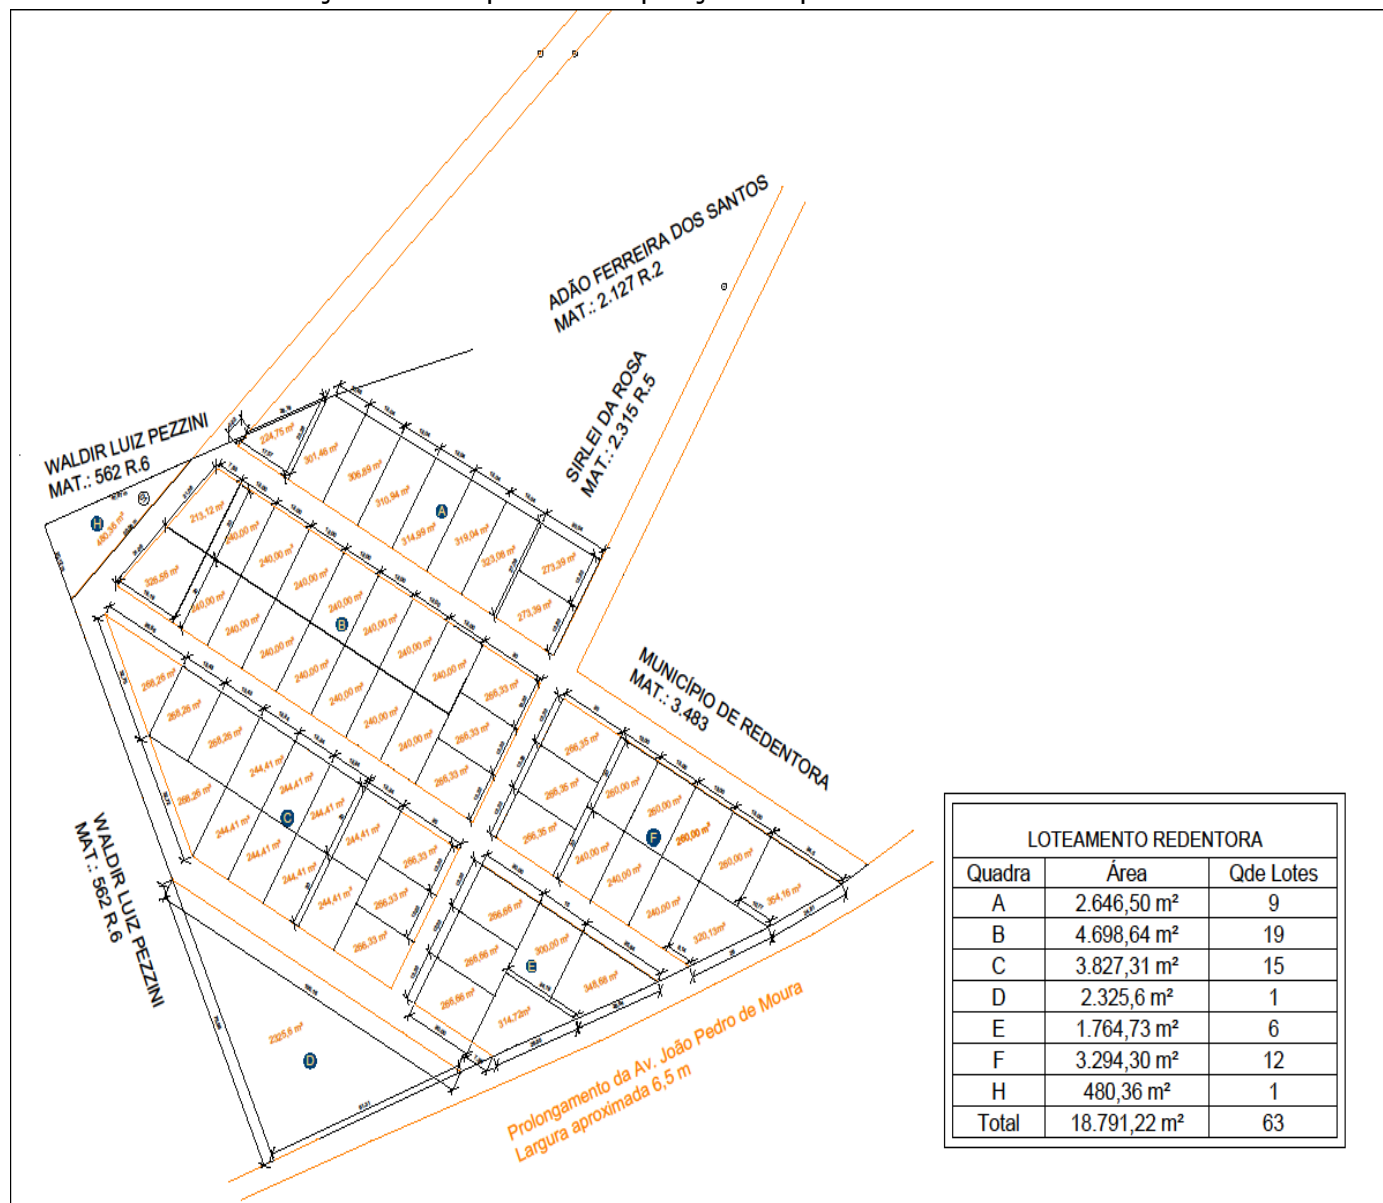



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Revitalização das Calçadas do Prédio do Centro Administrativo

Recurso: **Municipal**


Valor Total.....R\$ **79.971,77**

Objeto:

- Revitalização das Calçadas e Acessos ao Prédio do Centro Administrativo.

Atividades:

- Projeto em elaboração

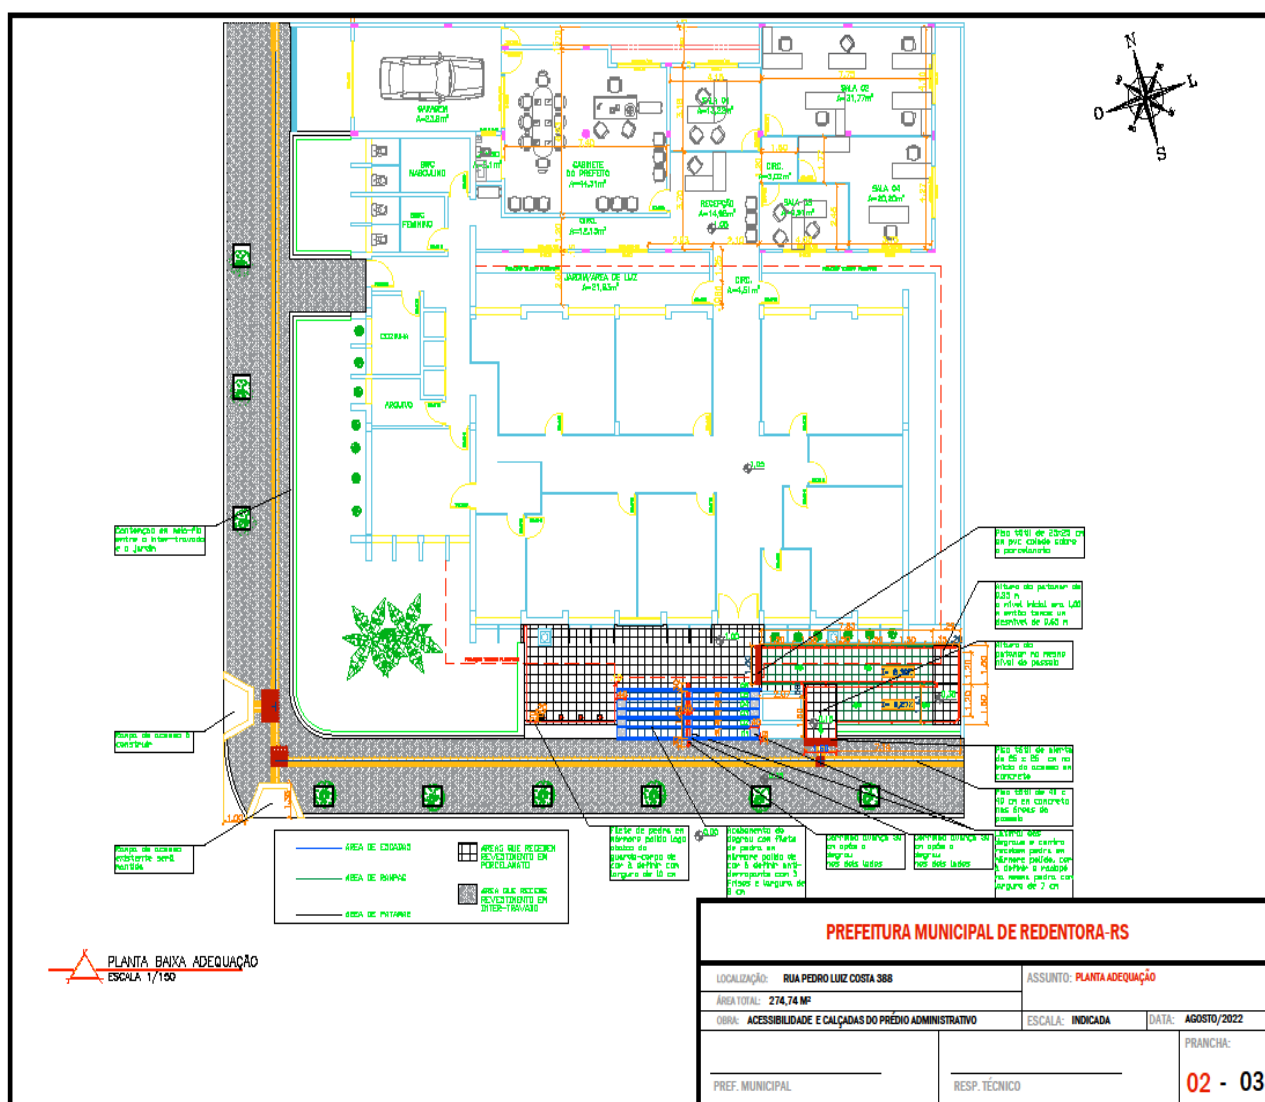



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Perfuração de Poços

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

Valor Total.....	R\$	70.000,00
Valor da Licitação (Geólogo).....	R\$	4.440,00
Valor da Licitação (Perfuração).....	R\$	45.500,00
Termo Aditivo (Adição) da Licitação (Perfuração).....	R\$	11.000,00
Termo Aditivo (Supressão) da Licitação (Perfuração).....	R\$	2.350,00
Valor Total Utilizado.....	R\$	58.590,00

Item:

Realizada a Perfuração dos Poços Tubulares Profundos (Poços Artesianos)

Situação:

- Projeto concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Situação:

- Prestação de Contas complementada e enviada para análise.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Situação:

- Prestação de Contas Enviada para Análise.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....R\$ 35.374,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.036,00

Valor Total.....R\$ 38.410,00

Item:

Aquisição de 262 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Situação:

- Não Executado.

RELATÓRIOS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SETOR DE ARQUITETURA

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 18 de Novembro de 2022 até 25 de Novembro de 2022;
- Elaboração de Termo de Início de Serviço e Termo de Recebimento de Serviço referente ao Termo Aditivo 01 da execução de divisórias no Centro Administrativo;
- Resposta referente ao contato de empresa, sobre torre de telefonia existente e procedimentos para regularização desta;
- Resposta ao contato de engenheira, referente a andamento na documentação para aprovação de projeto protocolado anteriormente;
- Termo de Início referente à Obra de Execução de Paradas de Ônibus;
- Resposta ao contato de diretor de escola, referente ao PPCI existente na mesma;
- Contato com engenheira responsável pela elaboração de projeto de PPCI das escolas, referente a dúvida anterior do diretor e resposta a ele;
- Entrega de matrícula anexada em projeto protocolado anteriormente para aprovação, após solicitação do Setor de Tributos;
- Elaboração de ideias para Projeto de placa/letreiro com denominação na Praça Arnaldo Roever;
- Reunião com secretário, engenheiro e prefeito, referente ao andamento no projeto da Escola Maria Belmont Albert e decisão de não execução de muro incluído no projeto original;
- Visita para acompanhamento e contato com mestre de obras e diretora da escola, referente as alterações definidas com prefeito, assim como, relatório fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (30/11);
- Auxílio referente às planilhas de aditivo e boletins de medição da obra de Reforma do Hospital Santa Rita de Cássia;
- Reunião com secretário, engenheiro, prefeito e empresa responsável pela execução da obra de Reforma do Hospital Santa Rita de Cássia, a fim de definir pontos de andamento para término da mesma;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita na obra de Reforma do Hospital Santa Rita de Cássia, com secretário, engenheiro, prefeito e empresa responsável pela execução da obra, para acompanhamento e verificação de pontos a serem finalizados e feitos na obra;
- Resposta ao contato de eletricitista responsável pela execução da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli, referente a dúvidas do mesmo;
- Resposta ao contato do Ministério da Cidadania, referente ao andamento da Obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019;
- Resposta ao contato do Ministério da Cidadania, referente ao andamento da Obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019;
- Reanálise após recebimento de novos arquivos e envio de parecer, de Projeto de ampliação Residencial Unifamiliar, protocolo nº 1475/2022;
- Aprovação e entrega ao Setor de Cadastros Imobiliários de Projeto de ampliação Residencial Unifamiliar, protocolo nº 1475/2022;
- Contato com Setor de Cadastros imobiliários, referente a protocolo de pedido de abertura de rua feito por morador, para localização do acesso;
- Visita para acompanhamento e análise de itens executados para elaboração de Boletim de Medição 06, assim como, relatório fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (02/12);
- Visita para acompanhamento e análise de itens executados para elaboração de Boletim de Medição 03, assim como, relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (02/12);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (02/12);
- Cálculo de percentual de itens executados para viabilizar elaboração de Boletim de Medição 06, referente a obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Elaboração de Boletim de Medição 06, referente a obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Análise de itens e aprovação, na Plataforma mais brasil, de Boletim de Medição 03, referente a obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SETOR DE ENGENHARIA

- Visita na obra do estádio municipal para verificar andamento de serviços do contrato 892538 área social e pórtico;
- Visita na obra da reforma e adequação dos canteiros da avenida constante luiz gemelli para verificar andamento do 3º canteiro;
- Visita na obra de reforma e adequação do hospital municipal com o representante da construtora palmitinho para verificar os serviços de acabamento do prédio e verificar itens em aberto da planilha original para encerramento de contrato;
- Reunião com o prefeito municipal para tratar das obras em aberto do município e andamento dos serviços;
- Revisão de planilha orçamentária do contrato 056/2020 do hospital municipal para encerramento de contrato;
- Revisão dos Boletins de medição do 01º ao 12º BM do contrato 056/2020 do hospital municipal para encerramento de contrato;
- Levantamento de mudas para plantio nos canteiros do ano de 2022.

Redentora, 30 de novembro de 2022.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento
