



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

OUTUBRO/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área a Ser Construída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....	R\$ 965.277,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$ 40.203,37
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$ 102.046,35
Valor do 3º Termo Aditivo.....	R\$ 66.293,08
Valor do 5º Termo Aditivo.....	R\$ 32.772,30
Valor do 6º Termo Aditivo.....	R\$ 91.939,94
Valor do Reequilíbrio Financeiro.....	R\$ 311.290,92
Valor do 8º Termo Aditivo (Supressão de Valores).....	R\$ 129.899,19
Valor do 10º Termo Aditivo.....	R\$ 31.133,89
Valor Total.....	R\$ 1.511.057,66
Valor Executado.....	R\$ 1.390.665,42

% Acumulado Executado da Obra: **92,03%**

Projeto Acessibilidade (Rampas e Calçadas)

Valor da Licitação.....	R\$ 126.196,72
Valor Executado.....	R\$ 100.256,85

% Acumulado Executado da Obra: **79,44%**

Projeto Esquadrias (Portas e Janelas)

Valor da Licitação.....	R\$ 276.057,80
Valor Executado.....	R\$ 134.916,13

% Acumulado Executado da Obra: **48,87%**

Projeto de Entrada de Energia Elétrica

Valor da Licitação.....	R\$ 68.800,00
Valor Executado.....	R\$ 0,00

% Acumulado Executado da Obra: **0,00%**

Valor Total

Valor Total do Projeto Inicial Ajustado.....	R\$ 1.511.057,66
Valor do Projeto de Acessibilidade (Rampas e Passeio).....	R\$ 126.196,72
Valor do Projeto de Esquadrias (Portas e Janelas).....	R\$ 276.057,80
Valor do Projeto de Entrada de Energia Elétrica.....	R\$ 68.800,00
Valor Total Atualizado.....	R\$ 1.982.112,18
Valor Executado.....	R\$ 1.625.838,40

% Acumulado Executado da Obra: **82,03%**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**

Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....R\$ 450.000,00

Valor Executado pela 1ª Empresa.....R\$ 176.286,85

Valor do Projeto Remanescente.....R\$ 264.705,84

Valor Executado do Projeto Remanescente.....R\$ 264.705,84

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 35.914,94

Valor Executado do Termo Aditivo.....R\$ 35.914,94

Valor Total do Projeto (Projeto Inicial + Projeto Novo + Aditivo)....R\$ 476.653,25

Valor Total Executado (Projeto Inicial + Projeto Novo + Aditivo)....R\$ 476.653,25

Atividades:

- Realizado Boletim de Medição Final da Obra.


Situação Atual da Obra:

- Executado (acumulado) **100,00%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

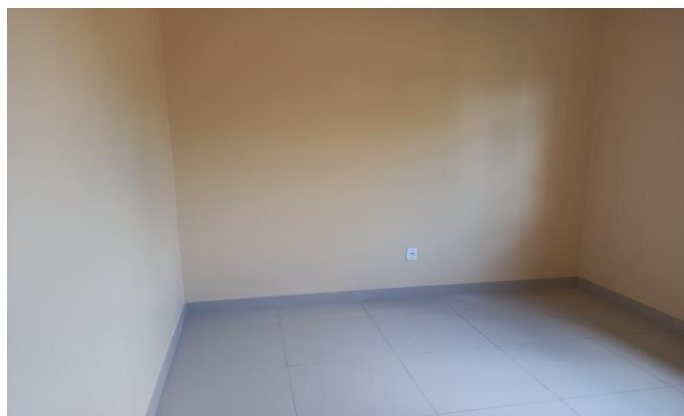

Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação da Escola Municipal Maria Belmont Albert

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 449.232,00

Valor da Licitação.....R\$ 449.232,00

Valor Executado.....R\$ 189.444,69

Percentual Executado: 42,19%

Item:

Construção de 04 Salas de Aula e Sanitários

Atividades

- Em fase de colocação da cobertura e reboco das paredes externas.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 45.484,02

Valor da Licitação.....R\$ 295.484,02

Valor Executado.....R\$ 75.628,76

Percentual Executado: 25,59%

Atividades:

- Em fase de Concretagem da Viga Superior e Lage Superior;
- Emitido Boletim de Medição nº 03 no valor de R\$ 32.410,26

Situação Atual da Obra:

- Em Execução.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Concedente**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 115.973,14

Valor da Licitação.....R\$ 402.473,14

Valor Executado.....R\$ 58.478,02

Percentual Executado: 12,59%

Atividades:

- Em fase de levantamento das paredes.

Situação Atual da Obra:

- Em Execução.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Revitalização da Avenida Constante Luiz Gemelli

Recurso: **Municipal**

Valor.....R\$ 513.969,56

Valor da Licitação.....R\$ 478.493,00

Valor Executado.....R\$ 26.178,35

Percentual Executado: 5,47%

Atividades:

- Obra em execução;





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado.....R\$ **182.456,03**

Valor da Licitação.....R\$ **149.554,87**

Valor Executado.....R\$ **111.085,09**

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Erwin Mathaus Braun


Rua Sinfrônio Julio Ribeiro

Atividades:

- Notificada a empresa, previsão de retorno das obras em 01/11/2022.

Situação Atual da Obra:

- Executado **74,28%**.

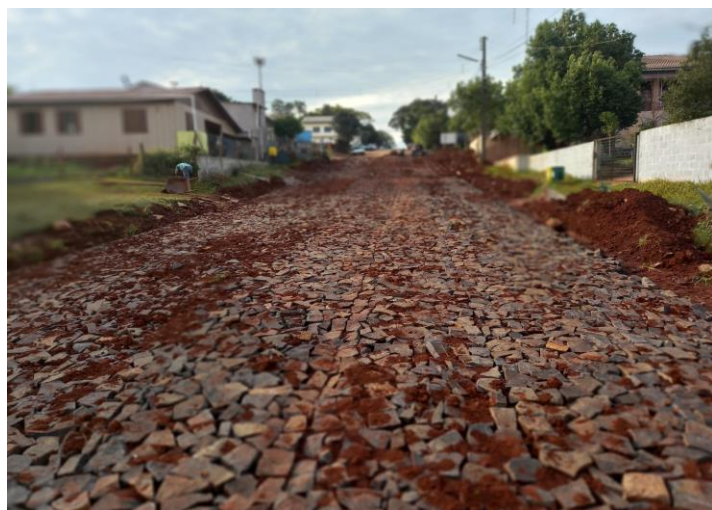



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Prédio do Centro Administrativo Municipal

Recurso: **Municipal**

Valor da Licitação.....	R\$ 352.174,94
Valor do Aditivo de Supressão.....	R\$ 52.131,03
Valor Atualizado do Projeto.....	R\$ 300.043,91
Valor Executado.....	R\$ 300.043,91
Valor do Termo Aditivo	R\$ 74.726,40
Valor Total da Obra.....	R\$ 374.770,31

Percentual Executado: **100,00%.**


Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

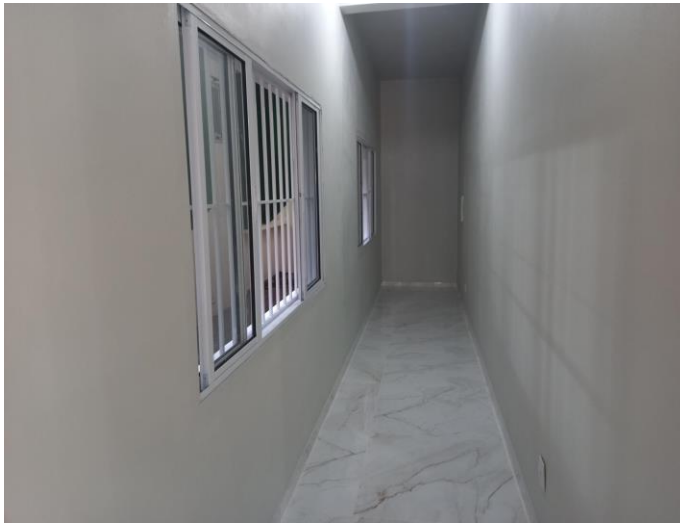

*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação Asfáltica – Perímetro Urbano

Órgão Concedente: **Governo do Estado do Rio Grande do Sul.**

Recurso: **Programa Pavimenta**

Objeto:

Pavimentação Asfáltica

- Trecho da Rua Acelyno Lutz Pinheiro
- Estrada Saída para Coronel Bicaco
- Rua Industrial I

Área a Ser Pavimentada: **8.588m²**

Área a Ser Pavimentada (Aditivo): **1.778,32m²**

Área Total Ser Pavimentada: **10.366,32m²**

Valor Repasse.....R\$ 701.948,40

Valor Contrapartida.....R\$ 218.306,38

Valor da Licitação.....R\$ 920.254,78

Valor Executado.....R\$ 897.069,53

Valor Pago a Empresa.....R\$ 428.306,38

Percentual Executado do Projeto: 100,00%

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 182.234,80

Valor Executado do Termo Aditivo.....R\$ 182.234,80

Valor Pago a Empresa.....R\$ 181.223,32

Percentual Executado do Termo Aditivo: 100,00%

Valor Total da Obra.....R\$ 1.102.489,58

Valor Total Executado.....R\$ 1.102.489,58

Valor Total Pago a Empresa.....R\$ 609.529,70

Percentual Executado do Total da Obra: 100,00%

Atividades:

- Recebido os Laudos referente as amostras;
- Aguardando Liberação da 2ª e 3ª Parcelas do Recurso.

Situação:

- Obra Concluída



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Um Galpão das Máquinas na Sub Prefeitura de São João

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 108.024,60

Valor da Licitação.....R\$ 94.895,25

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 4.800,12

Valor Total da Obra.....R\$ 99.695,37

Descrição: **Construção de Um Galpão Para Máquinas na Subprefeitura de São João**

Área: **184,00m²**

Atividades:

- Realizado o Pagamento do valor referente o contrato inicial no valor de R\$ 94.895,25.

Situação:

- Obra Concluída.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Recurso: **Municipal**

Item:

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Valor do Projeto.....R\$ 106.678,63

Valor da Licitação.....R\$ 106.635,75

Valor Executado.....R\$ 106.635,75

Situação Atual da Obra:

- Executado **100,00%.**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00

Itens:

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico (Já Entregue);

01 (uma) Roçadeira Agrícola (Já Entregue);

01 (uma) Carreta Agrícola Metálica Basculante;

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes.

Atividades:

- Realizado a Alteração do Plano de Trabalho, aguardando abertura de Dotação Orçamentária no Orçamento para realizar novo Processo de Licitação.



Roçadeira Agrícola



Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânica



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 466.666,67

Valor da Licitação.....R\$ 465.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira, 4x4, Motor com Potência Mínima de 85HP

Atividades:

- Equipamento Entregue dia 07/07/2022.

Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **044467/2019**

Valor Repasse.....R\$ 146.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 4.800,00

Valor Total.....R\$ 150.800,00

Valor da Licitação.....R\$ 149.150,00

Itens:

02 (duas) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

Situação:

- Concluído





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **023468/2021**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.100,00

Valor Total.....R\$ 332.600,00

Valor da Licitação.....R\$ 332.500,00

Item:

Aquisição de 02 Tratores Agrícolas (75cv)

Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Um Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido

Recurso: **Municipal (Emendas Impositivas Vereadores)**

Valor Total.....R\$ 72.333,33

Valor da Licitação.....R\$ 47.300,00

Itens:

Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido

Atividades:

- Equipamento Entregue pela Empresa.

Situação:

- Concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS LICITADOS / Aguardando a Entrega dos Itens

Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 614.166,67

Valor da Licitação.....R\$ 614.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (um) Caminhão Equipado com Caçamba de no Mínimo 12m³

Atividades:

- Veículo entregue dia 10/10/2022

Situação:

- Concluído





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM FASE DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO

Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento de Urgência

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-003**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Total.....R\$ 250.000,00

Item:

- 01 (um) Equipamento Raio X Fixo Analógico;
- 01 (uma) Bomba de Infusão;
- 02 (dois) Carro de Emergência;
- 01 (um) Carro Maca Avançada;
- 01 (um) Desfibrilador Convencional;
- 01 (um) Eletrocardiógrafo;
- 01 (uma) Mesa de Cabeceira;
- 01 (um) Monitor Multiparâmetros;
- 01 (um) Aspirador de Secreção Elétrico Móvel;
- 01 (um) Computador.

Atividades:

- Processo de Licitação realizado;
- Em fase de realização de nova licitação, em virtude de saldo das licitações anteriores.



Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)

*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.256000/1220-02**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Lasier Martins**

Valor Repasse.....R\$ 80.000,00

Valor Total.....R\$ 80.000,00


Item:

Equipamentos e Material Permanente

06 Computador	01 Notebook
05 Impressora	03 Lanterna Clínica
01 Espaldar em Madeira	01 Detector Fetal
01 Balança Digital Portátil	01 Martelo de Reflexo
02 Escada com 2 Degraus	01 Estetoscópio
02 Andador	04 Mesa Ginecológica
01 Biombo	01 Goniômetro
01 TENS e FES	01 Ultrassom Fisioterapia
01 Cama Elástica Proprioceptiva	06 Exercitador de Mãos e Dedos
03 Fotopolimerizador de Resinas	

Atividades:

- Licitação realizada, em fase de entrega dos equipamentos.

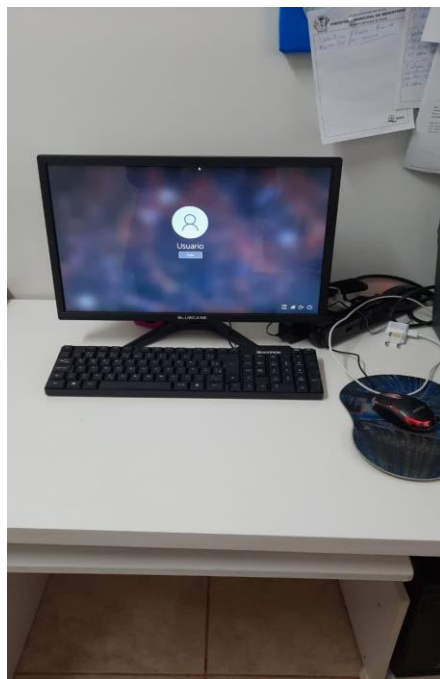



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Paradas de Ônibus

Recurso: **Municipal**


Quantidade: **10 Unidades**

Valor.....R\$ **75.000,00**

Valor da Licitação.....R\$ 52.300,00

Atividades:

- Realizado o Processo de Licitação, aguardando contratação.

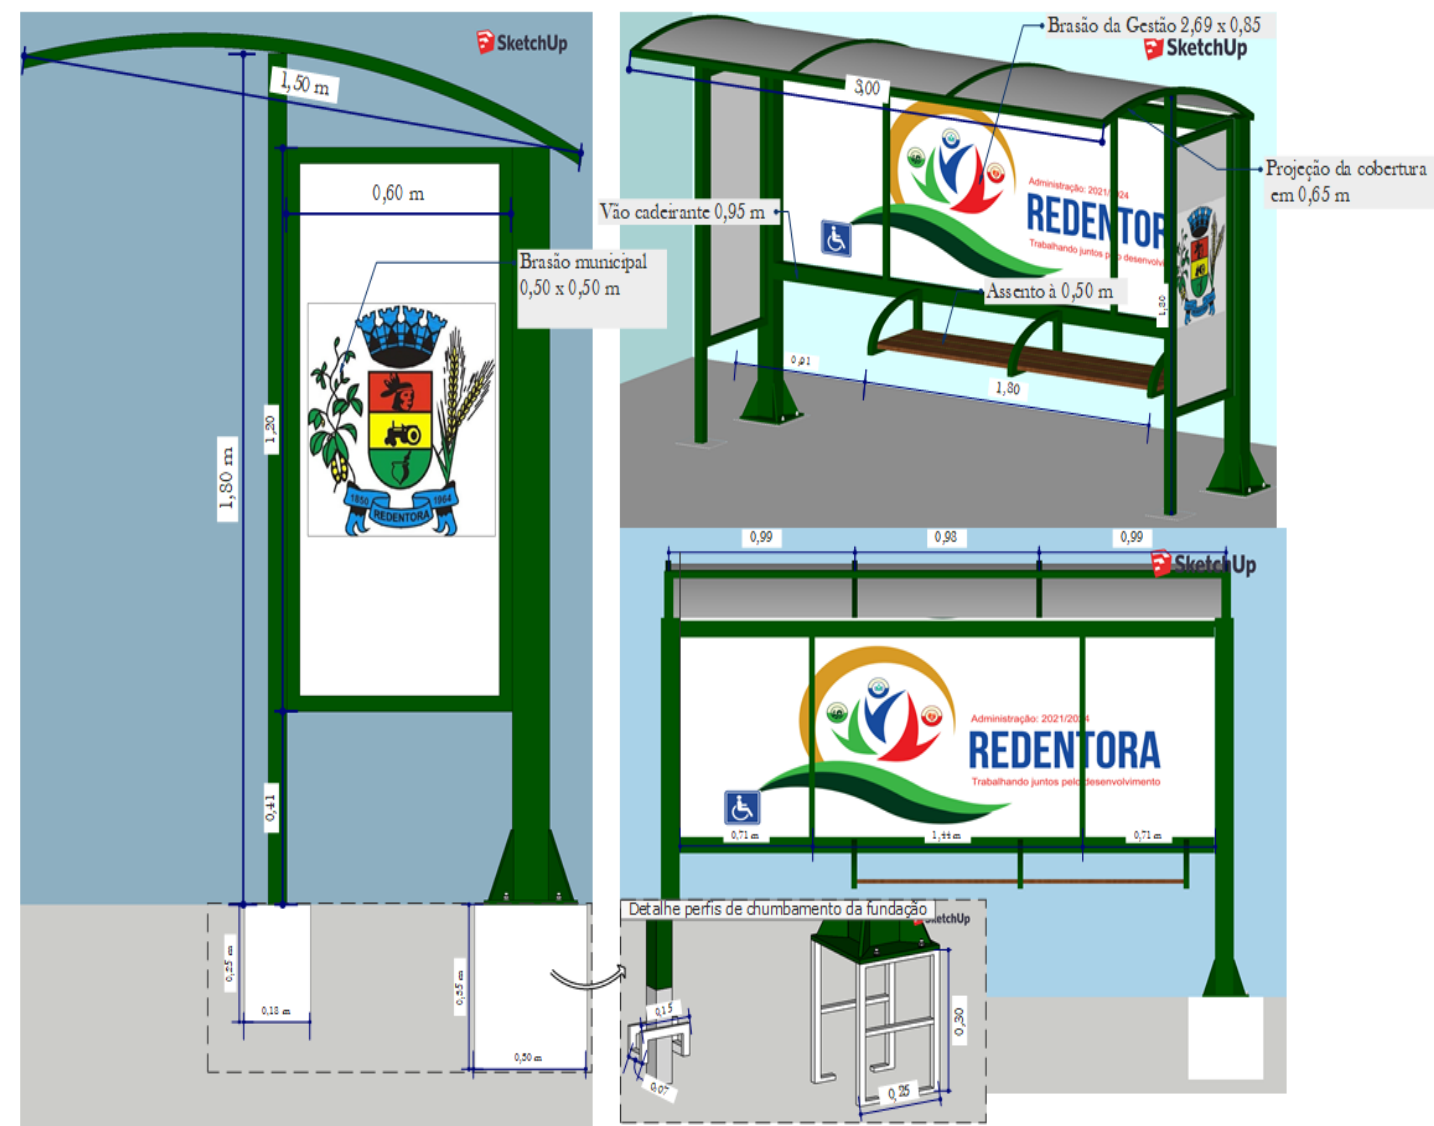



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Execução de Entrada de Energia Elétrica – Hospital Municipal


Recurso: **Municipal**

Valor.....**R\$ 75.121,00**



Valor da Licitação.....**R\$ 68.800,00**

Atividades:

- Realizado o Processo de Licitação, aguardando contratação.

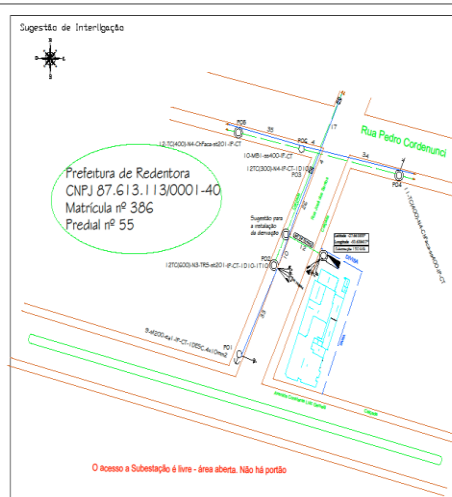

NOTAS:
1) Desenho sem escala, Unidade: mm;
2) Material: chapa de aço galvanizada, Espessura: 1mm;
3) Fundo: pintura branca padrão Munsell N95;
4) Textos: Com aplicação de Vinil Adesivo Plottado, Fonte 'Univers / Univers Bold', Tamanho mínimo de 30mm, Cor: preto Munsell NL;
5) Pictograma: Com aplicação de Vinil Adesivo Plottado, Cor: fundo - amarelo Munsell 5Y-8/12, caracteres/ margem - preto Munsell NL;
6) Perigo: Com aplicação de Vinil Adesivo Plottado, Fonte 'Univers / Univers Bold', Tamanho mínimo de 30mm, Cor: fundo - vermelho Munsell SR 4/14, margem - preto Munsell NL, texto branco padrão Munsell N95.

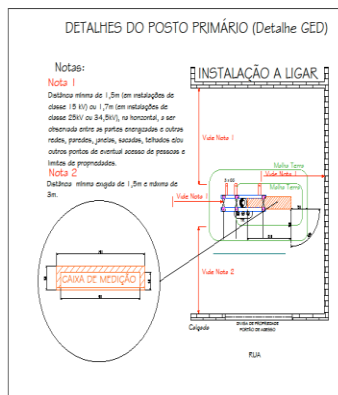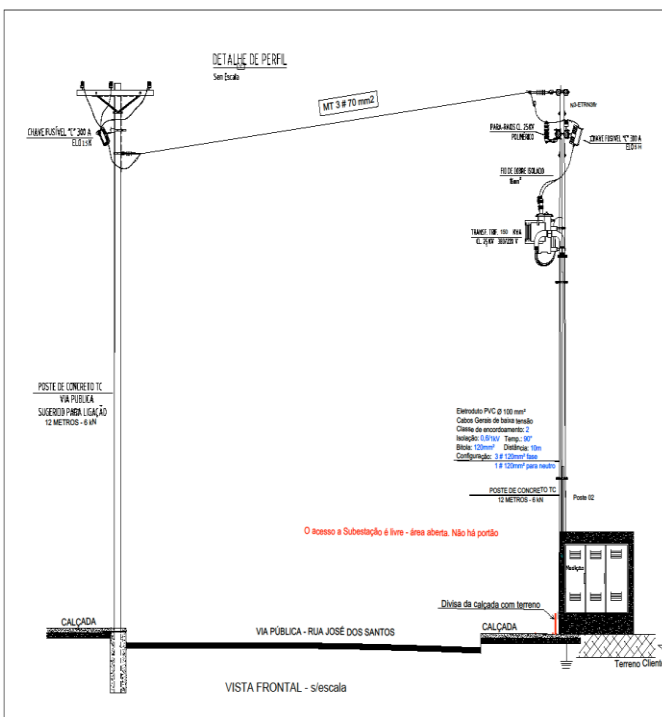

CANTARELLI ENGENHARIA			
CRS-AR 158 907			
Rua Prof. Euzébio, 1118 - Sala 604 - Centro - Redentora - RS - CEP 98550-000 - Fone 51 3144 4117			
Requerente: Prefeitura de Redentora			
Projeto: Nova Ligação - SE 150 kVA			
Localidade: Rua José dos Santos, 55 - Centro			
Município: Redentora - RS			
Escala: 1:100	Desenho: Luiz	Data: 20/03/2022	Projeto: 1-A1 Projeto nº: 062/22
Responsabilidade Técnica:		Assinatura:	
Eng.º Civil - Luiz Antônio Cantarelli		Prefeitura de Redentora	
CREA-RS-48733		CNPJ nº 03.113.000/1-0	
CPF 22.484.820-4			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **013316/2020**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Bohn Gass**

Valor Repasse.....R\$ 171.900,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.100,00

Valor Total.....R\$ 174.000,00

Item:

01 (uma) Roçadeira Agrícola Articulada;

01 (uma) Plantadeira Plantio Direto 05 Linhas.

Situação:

- Aguardando Homologação do Processo de Licitação.

Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Saúde – Fundo a Fundo**

Valor Repasse.....R\$ 50.000,00

Valor Total.....R\$ 50.000,00

Item:

Equipamentos e Material Permanente

01 Câmara para Conservação de Vacinas, Medicamentos;

01 Eletrocardiógrafo;

01 Monitor de Sinais Vitais;

01 Cilindro para Oxigênio Medicinal 50 Litros

02 Cilindro para Oxigênio Medicinal 7 Litros

04 Cadeiras de Rodas Adulto Dobrável

05 Nebulizador Ultrassônico

Atividades:

- Encaminhado ao Setor de Licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS APROVADOS/RECURSO LIBERADO

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....R\$ 35.374,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.036,00

Valor Total.....R\$ 38.410,00

Item:

Aquisição de 262 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Assinado Termo Aditivo de supressão de 462 sacas para 262 sacas

Situação:

- Aguardando abertura do crédito no Orçamento 2022 para posterior realização da Licitação.

PROPOSTAS CADASTRADAS:

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Heitor Schuch**

Proposta SICONV: **002523/2022**

Valor Repasse.....R\$ 143.250,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.750,00

Valor Total.....R\$ 146.000,00

Itens:

01 (uma) Grade Aradora

01 (uma) Grade Niveladora

01 (uma) Carreta Agrícola com Carroçaria de Madeira

01 (uma) Roçadeira Agrícola

Situação:

- Proposta Aprovada, em análise de Plano de Trabalho.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROPOSTAS/Recursos Liberados:

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4296492/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 17/06/2022.**

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4619692/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Total.....R\$ 110.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 18/06/2022.**

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4601602/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Total.....R\$ 200.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 24/06/2022.**

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.460112/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar:

Valor Total.....R\$ 150.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 24/06/2022.**

Custeio – Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4658842/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Pompeo de Mattos**

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Situação: **Recurso Liberado em 24/06/2022.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETO APROVADO (Em Elaboração do Projeto de Engenharia)

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **052170/2021**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 239.750,00


Objeto: **Pavimentação com Pedras Irregulares na Localidade de Vila São Sebastião**

Atividades:

- Proposta Aprovada / Contrato de Repasse Assinado

Situação:

- Aguardando Solicitação da CEF para elaboração do Projeto de Engenharia.

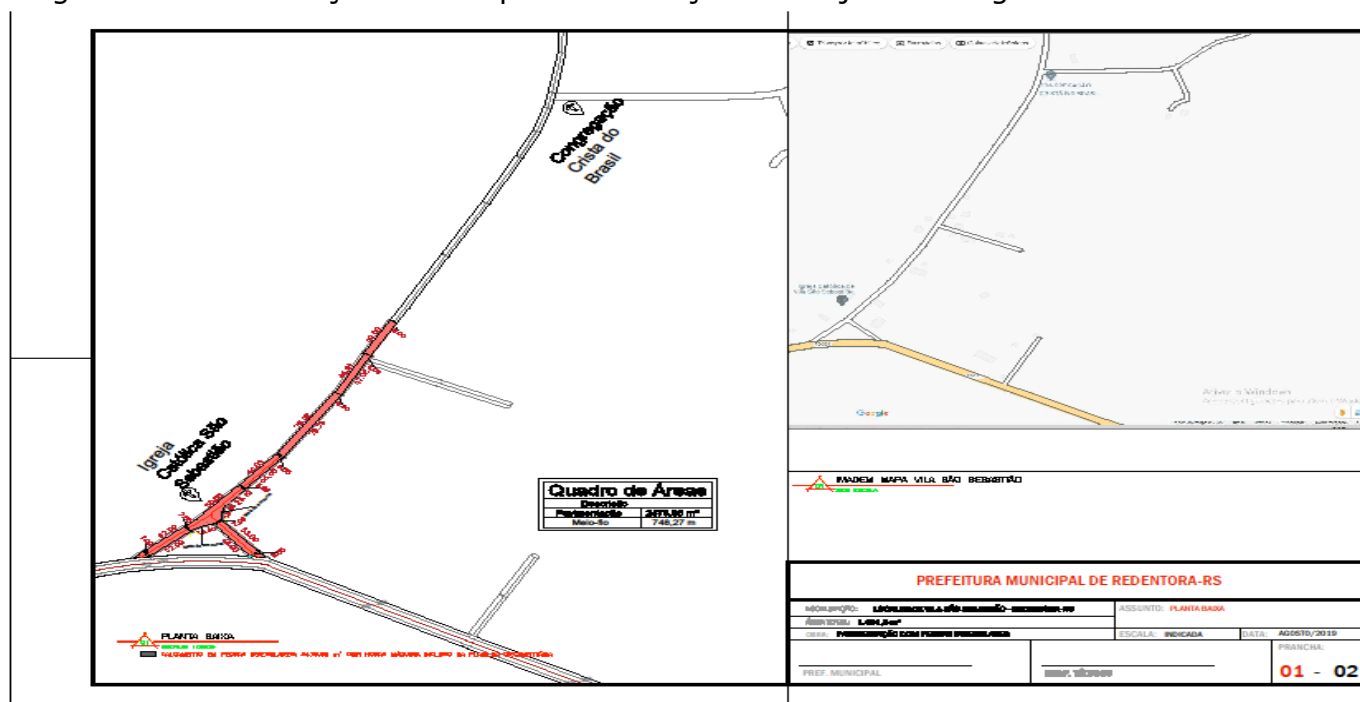



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM ANÁLISE (GOVERNO RS)

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2018/2019**

Valor Repasse.....R\$ 59.009,21

Valor Contrapartida.....R\$ 1.834,87

Valor Total.....R\$ 60.844,08

Item:

Aquisição de 418 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Projeto enviado dia 28/04/2021 para análise da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul.

Situação:

- Aguardando a Aprovação do Plano de Trabalho para posterior realização da Licitação.

Aquisição de Veículo

Órgão Concedente: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano/RS.**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Patrícia Alba**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 10.500,00

Valor Total.....R\$ 110.500,00

Item:

Aquisição de Um Veículo de Pequeno Porte

Atividades:

- Projeto enviado para análise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM ELABORAÇÃO:

Ampliação do Galpão das Máquinas da Secretaria de obras

Recurso: **Municipal**


Item:

Ampliação Da Cobertura do Galpão da Secretaria de Obras

Área Aproximada: 472,70m²

Atividades:

- Aguardando orçamentos das empresas.

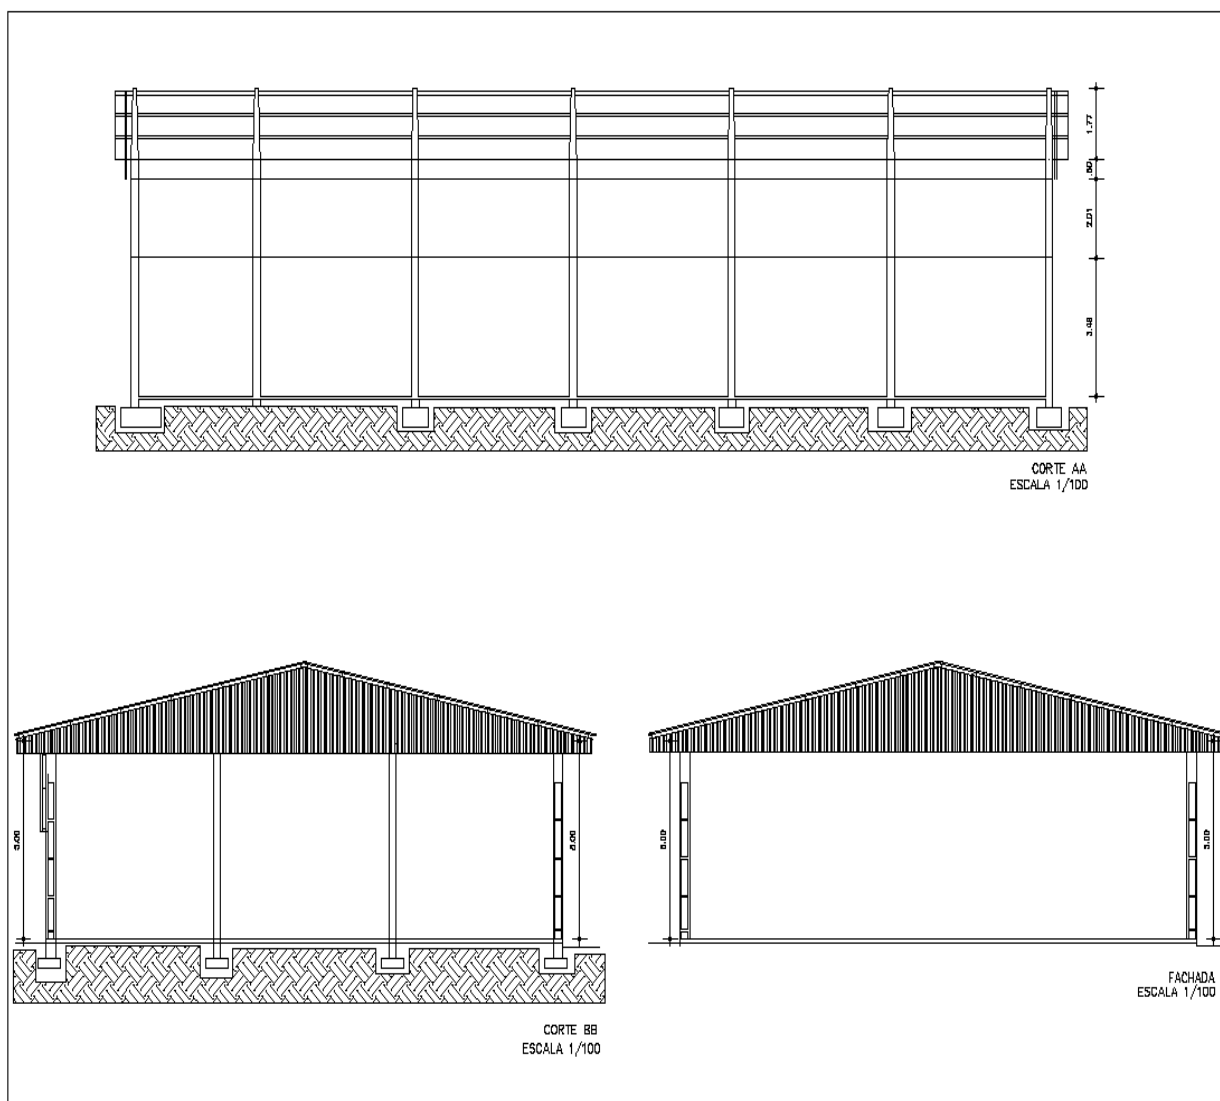



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Perímetro Urbano


Recurso: **Municipal**

Atividades:

- Encaminhada Documentação ao Tabelionato para realizar a localização de parcela na Matrícula

Situação:

- Em fase de elaboração dos mapas da ampliação do perímetro urbano

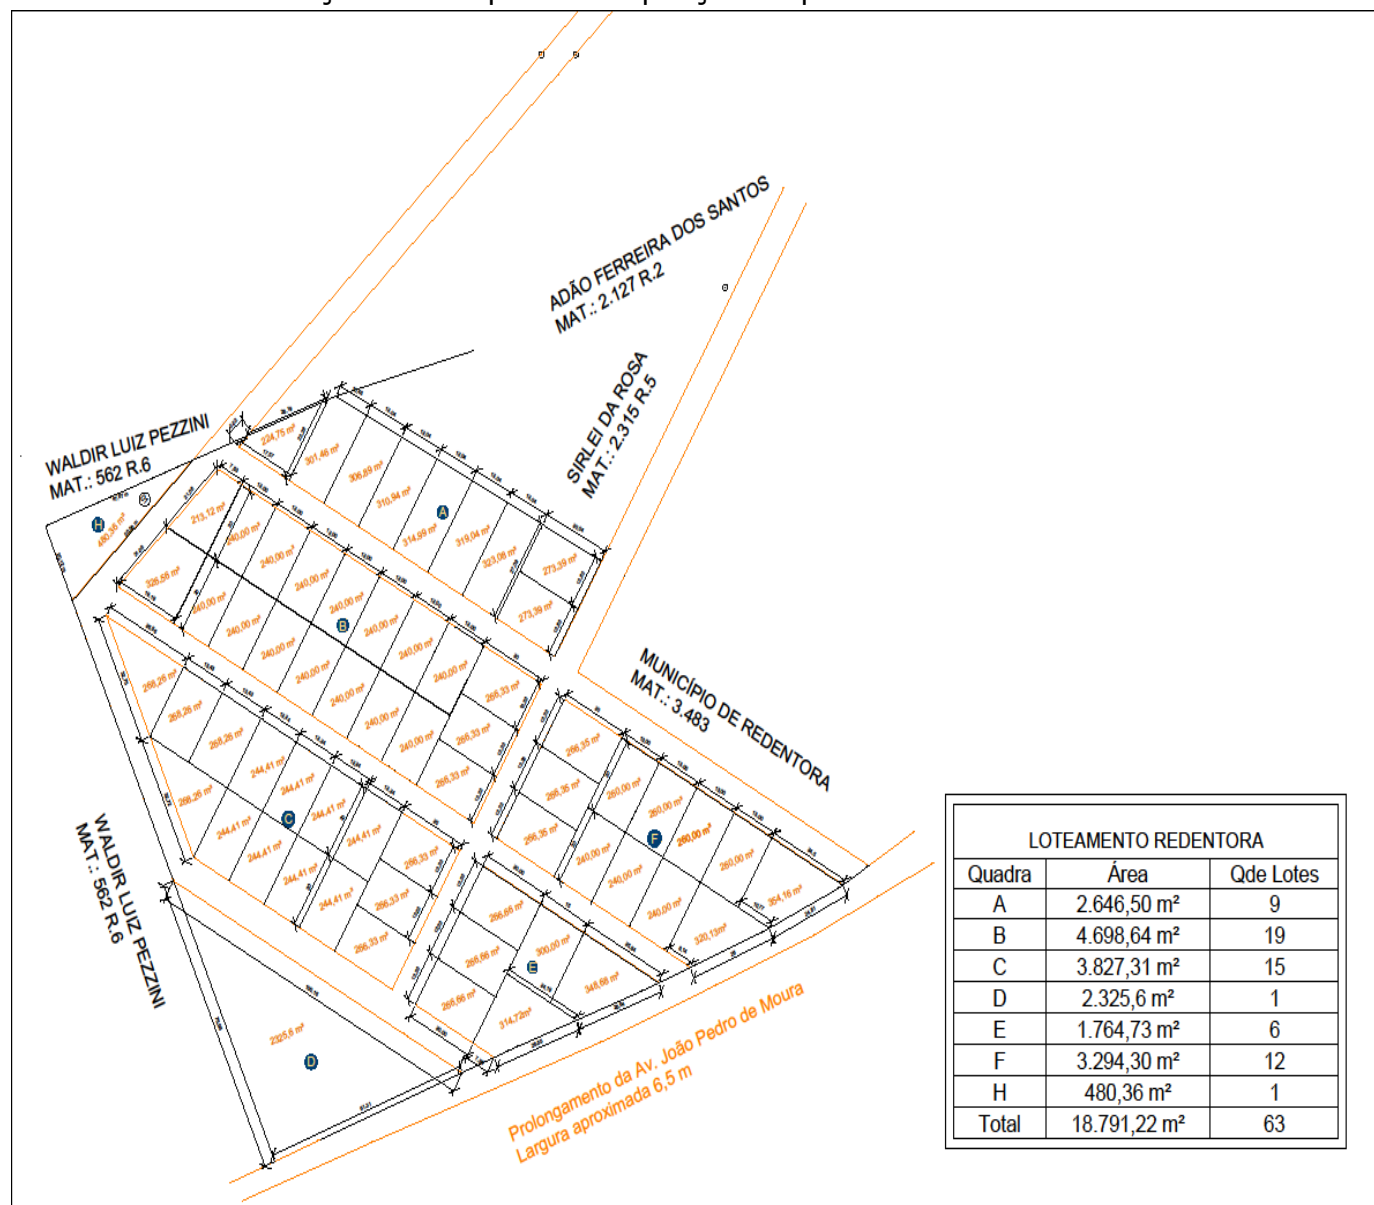



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Execução de Piso de Concreto e Drenagem na Quadra de Esportes

Recurso: **Municipal**


Valor Estimado do Projeto.....R\$ 160.000,00

Objeto:

- Execução de Piso de Concreto na Quadra de Esportes da Praça Arnaldo Roewer.

Atividades:

- Projeto em elaboração

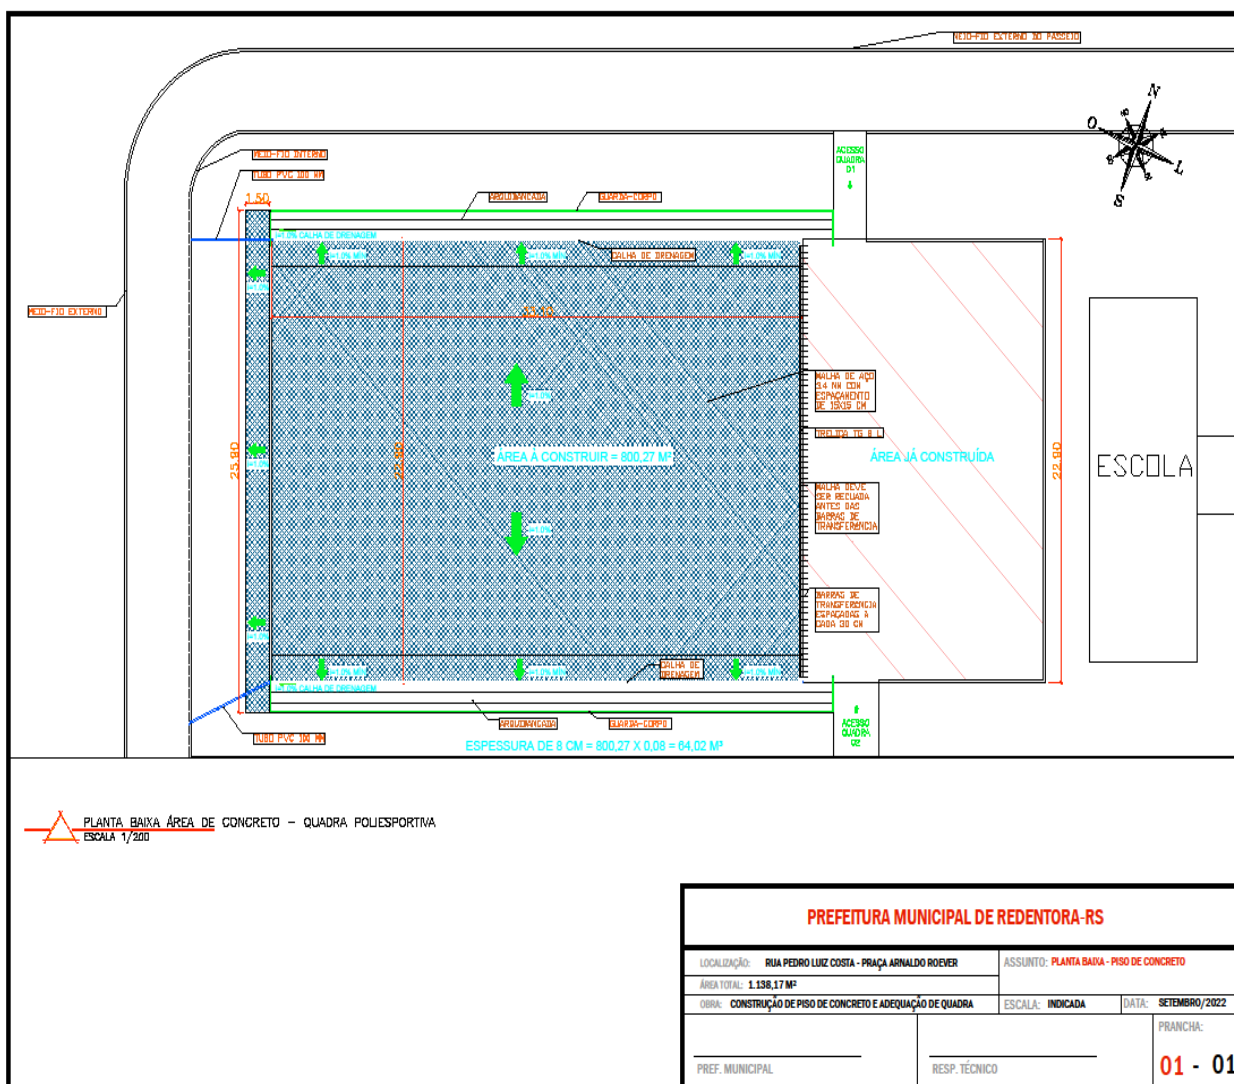



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Perfuração de Poços

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

Valor Total.....	R\$	70.000,00
Valor da Licitação (Geólogo).....	R\$	4.440,00
Valor da Licitação (Perfuração).....	R\$	45.500,00
Termo Aditivo (Adição) da Licitação (Perfuração).....	R\$	11.000,00
Termo Aditivo (Supressão) da Licitação (Perfuração).....	R\$	2.350,00
Valor Total Utilizado.....	R\$	58.590,00

Item:

Realizada a Perfuração dos Poços Tubulares Profundos (Poços Artesianos)

Situação:

- Projeto concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

Valor.....R\$ 340.585,32

Item:

Implantação de 20 Módulos Sanitários





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Situação:

- Prestação de Contas complementada e enviada para análise.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Situação:

- Prestação de Contas Enviada para Análise.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SETOR DE ARQUITETURA

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 16 de setembro de 2022 até 23 de setembro de 2022;
- Medição e anotação em planta baixa de layout definido com anotação de remoção e reinstalação de divisórias em Eucatex, referente a obra de ampliação do Centro Administrativo;
- Estudo em planta baixa de instalações referente a PPCI para conferência de placas e luminárias a serem colocadas na obra da Unidade de Acolhimento;
- Assessoramento a responsável técnico, referente a aprovação de projetos de regularização residencial;
- Análise de Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1712/2022;
- Análise de Projeto de regularização de uma edificação destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1713/2022;
- Análise de Projeto de Localização, desmembramento e retificação de lote urbano, protocolo nº 1662/2022;
- Conversa com Setor de Cadastros Imobiliários e busca nos mapas do município, referente a projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1712/2022;
- Conversa com Setor de Cadastros Imobiliários e busca nos mapas do município, referente a Projeto de regularização de uma edificação destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1713/2022;
- Conversa com Setor de Cadastros Imobiliários e busca nos mapas do município, referente a Projeto de Localização, desmembramento e retificação de lote urbano, protocolo nº 1662/2022;
- Contato com setor de Cadastros Imobiliários, Registro de Imóveis e responsável técnico, referente a melhor forma de dar seguimento para aprovação de Projeto de Localização, desmembramento e retificação de lote urbano, protocolo nº 1662/2022;
- Elaboração de parecer e envio a responsável técnico referente ao Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1712/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração de parecer e envio a responsável técnico referente ao Projeto de regularização de uma edificação destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1713/2022;
- Análise de Projeto de regularização residencial unifamiliar, com área de 85,02 m², protocolo nº 1733/2022;
- Contato com responsável técnico referente a Projeto de regularização residencial unifamiliar, com área de 85,02 m², protocolo nº 1733/2022;
- Aprovação e entrega a Setor de Cadastros Imobiliários de Projeto de regularização residencial unifamiliar, com 85,02 m², protocolo nº 1733/2022;
- Contato com setor de Cadastros Imobiliários e responsável técnico, referente a nova documentação para aprovação de Projeto de Localização, desmembramento e retificação de lote urbano, protocolo nº 1662/2022;
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (07/10);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (07/10);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (07/10);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico, referente a obra do hospital (07/10);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico, referente a obra de Revitalização dos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (07/10);
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 30 de setembro de 2022 até 07 de outubro de 2022;
- Estudo referente a quantitativo de materiais para aditivo utilizados no muro da Escola Maria Belmont Albert, após alteração na medida de 8 para 10 m de corredor;
- Listagem de itens e materiais a serem executados e glosados referente a obra de a Revitalização dos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Contato com setor de Cadastros Imobiliários e requerente, referente a recebimento de novos arquivos após parecer técnico enviado, sobre Projeto de Localização, desmembramento e retificação de lote urbano, protocolo nº 1662/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Reanálise, após recebimento de novos arquivos de Projeto de Localização, desmembramento e retificação de lote urbano, protocolo nº 1662/2022;
- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros Imobiliários de Projeto de Localização, desmembramento e retificação de lote urbano, protocolo nº 1662/2022;
- Reanálise, após recebimento de novos arquivos de Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1712/2022;
- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros Imobiliários, de Projeto de uma edificação em alvenaria, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1712/2022;
- Quantitativo de piso existente na área antiga do Centro Administrativo para simulação de valores referente a possível substituição por piso novo;
- Visita para conferência de itens finalizados e a serem finalizados para entrega da obra, assim como, relatório fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (13/10);
- Visita com empresa responsável pela execução da obra da Unidade de Acolhimento, para conferência de pontos a serem terminados antes da entrega da final da obra;
- Visita na Quadra de Esportes da Praça Arnaldo Roever, com empresa São Cristóvão para explicação referente a projeto para execução de piso polido, de forma a viabilizar orçamento por parte da empresa;
- Contato com responsável técnico, referente a alteração de requerimento, solicitado anteriormente, de Projeto de uma edificação mista, destinada ao uso residencial unifamiliar, protocolo nº 1543/2022;
- Estudo em projeto existente e situação in loco, referente a muro a ser executado na obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert (14/10);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 892538/2019 (14/10);
- Visita para acompanhamento da obra e da concretagem de pilares e laje, assim como relatório fotográfico da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914/2019 (14/10);
- Visita para acompanhamento da obra, assim como, relatório fotográfico, referente a obra de Revitalização dos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli (14/10);



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 07 de setembro de 2022 até 14 de setembro de 2022;
- Análise e aprovação referente a itens solicitados pela empresa responsável pela execução da obra, na Plataforma Mais Brasil, para elaboração de Boletim de Medição 03, da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914;
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 03, da obra de Modernização do Estádio Municipal (vestiário e alambrado), contrato 883914;
- Elaboração de Termo de Recebimento Provisório, referente a finalização da obra da Unidade de Acolhimento;
- Elaboração de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/BR, referente ao projeto para obra de Pavimentação com Pedras Irregulares na estrada Vicinal a ser executado na Comunidade Vila São Sebastião;
- Análise de projeto de desmembramento e unificação de lotes após solicitação de assessoramento por parte de responsável técnico, devido a particularidades no projeto;
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários, referente ao assessoramento de projeto de desmembramento e unificação de lotes a responsável técnico;
- Contato com responsável técnico para assessoramento referente a projeto de desmembramento e unificação de lotes, de forma a dar parecer e andamento na elaboração do mesmo;
- Busca em projeto e memorial descritivo de pontos para assessoramento a empresa responsável pela execução da obra de Modernização do Estádio Municipal, contrato 883914, referente a revestimento de paredes, tipo de cobertura, dimensão de calhas e local de tubos de queda;
- Análise de projeto de regularização de edificação residencial unifamiliar (casa popular) em madeira, protocolo nº 1772/2022;
- Contato com Setor de Cadastros Imobiliários referente a procuração anexada no projeto de regularização de edificação residencial unifamiliar (casa popular) em madeira, protocolo nº 1772/2022;
- Assinatura de lista de verificação de acessibilidade, memorial descritivo, declaração de encargos sociais e demais documentações referentes a Obra de Pavimentação com Pedras Irregulares a ser executado na Comunidade São Sebastião;
- Aprovação e entrega ao setor de cadastros imobiliários de projeto de regularização de edificação residencial unifamiliar (casa popular) em madeira, protocolo nº 1772/2022;
- Assinatura de orçamento e de pranchas referente ao Projeto de Pavimentação com pedras irregulares na estrada Vicinal da comunidade vila São Sebastião;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Aprovação nº 45/2022, de pranchas do Projeto de Pavimentação com pedras irregulares na estrada Vicinal da comunidade Vila São Sebastião para solicitação de forma a viabilizar análise da Caixa;
- Contato com empresa responsável pela execução da obra do hospital e da ampliação da Escola Maria Belmont Albert;
- Contato a responsável técnico, após envio anterior de parecer no dia 03/10, protocolo nº 1713/2022;

SETOR DE ENGENHARIA

- Visita na obra de reforma e adequação do hospital municipal;
- Visita na obra da Revitalização dos Canteiros municipais;
- Visita na obra da ampliação da escola Maria Belmont Albert para verificar serviço de emboço externo e interno;
- Visita na obra da modernização do estádio municipal para verificar levantamento de alvenaria;
- Montagem de declaração de alinhamento para a empresa PROCEL de três passos referente à Rua Alberto Pasqualini;
- Requisição de material elétrico para instalação de antena digital no município de Redentora;
- Montagem de Planilha Orçamentaria para orçamento com empresas da praça Arnaldo Roever;
- Montagem de termo de Recebimento Provisório da obra de Concreto asfáltico usinado à quente da Rua acelyno Iutz pinheiro, estrada pra Cel. Bicaco e Rua Industrial I para a empresa Pavimentação São Cristóvão;
- Montagem de Relatório de parâmetros de ensaio do projeto de CBUQ da pavimentação São Cristóvão;
- Montagem e conferência de Reequilíbrio financeiro, referente ao contrato CR 892538 da obra de modernização do estádio municipal área social e pórtico;
- Visita na obra da Revitalização dos Canteiros municipais;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita na obra da ampliação da escola Maria Belmont Albert;
- Visita na obra da modernização do estádio municipal para verificar e conferir armaduras de laje do vestiário e liberação para concretagem;
- Acompanhamento com a empresa concreteira São Cristóvão para medir o local de reforma da quadra municipal na praça Arnaldo roever para montagem de orçamento;
- Visita na obra da unidade de acolhimento para instruir a equipe de limpeza final;
- Montagem de relatório referente à execução de pavimento em concreto asfáltico CBUQ;
- Alteração da planilha orçamentária da obra do calçamento da vila são sebastião;
- Montagem de cronograma físico-financeiro da obra do calçamento da vila são sebastião;
- Inclusão na plataforma mais brasil da planilha orçamentária da obra de calçamento da vila são sebastião;
- Montagem de memorial descritivo da obra de calçamento da vila são sebastião;
- Montagem de formulário de anuência para empresa red gases LTDA para cancelamento de nota fiscal;
- Atualização de referência SINAPI da planilha de calçamento da vila são sebastião e atualização de composições orçamentárias para referência 09/2022;
- Alteração do projeto do calçamento da vila são sebastião, folha de situação e folha de planta baixa separada;
- Montagem de declaração de encargos sociais para anexos do projeto de calçamento da vila São Sebastião;
- Mudança de setor da engenharia para o prédio novo.

Redentora, 31 de outubro de 2022.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento
