



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

MARÇO - 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Projeto de Climatização e Ventilação Mecânica - Hospital

Proposta: **1918/2025**

Recurso: **Secretária Estadual da Saúde**

Valor do Projeto.....R\$	1.404.605,55
Valor da Licitação.....R\$	1.400.000,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....R\$	23.500,00
Valor Total Atualizado.....R\$	1.423.500,00
Executado.....R\$	699.580,00

Descrição:

- Execução do Projeto de Sistema de Climatização e Ventilação Mecânica

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 07/01/2026
- Percentual Executado: **49,97 %**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Projeto de Pintura Interna e Externa - Hospital

Proposta: **1918/2025**

Recurso: **Secretária Estadual da Saúde**

Valor do Projeto.....R\$ 212.163,47

Valor da Licitação.....R\$ 140.000,00

Executado.....R\$ 56.588,45

Descrição:



- Execução do Projeto de Pintura Interna e Externa

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 07/01/2026

- Percentual Executado: **40,42%**

- Obra paralisada, aguardando conclusão da climatização e gesso, para andamento.

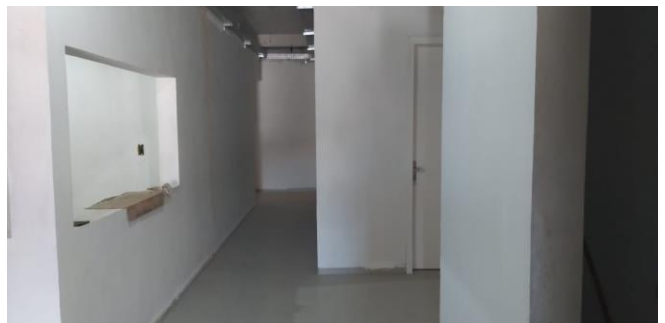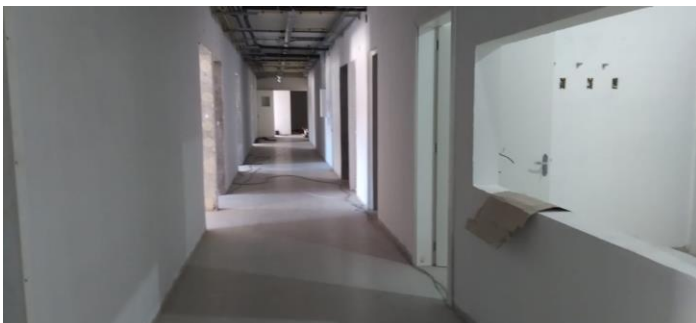



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Execução de Instalações Elétricas, Lógica e SPDA - Hospital

Plano de Ação nº: **09032024-072425**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**


Valor do Repasse.....	R\$	210.000,00
Valor Contrapartida.....	R\$	83.388,47
Valor Total do Projeto.....	R\$	293.388,47
Valor da Licitação.....	R\$	246.000,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$	22.595,03
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$	33.612,44
Valor Total.....	R\$	302.207,47
Valor Pago a Empresa.....	R\$	293.891,68

Itens:

- Execução do Projeto de Instalações Elétricas;
- Instalações de Comunicação;
- Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

Situação:

- Emitida Ordem de Início da Obra em 14/04/2025.
- Percentual Executado: **96,62%**
- Obra paralisada, aguardando conclusão da Climatização, Gesso e Pintura.

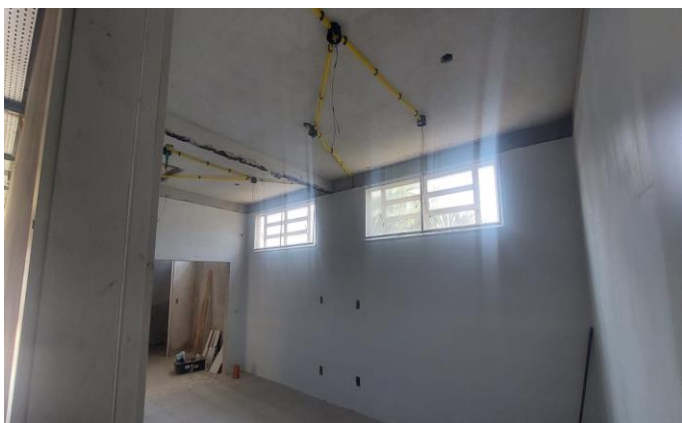



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Projeto de Adequação das Calçadas do Hospital

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$	76.290,45
Valor da Licitação.....R\$	66.200,00
Valor do 1º Termo Aditivo (Supressão).....R\$	1.266,84
Valor do 2º Termo Aditivo (Adição).....R\$	6.977,65
Valor Total.....R\$	71.910,81
Executado.....R\$	39.541,04

Descrição:

- Execução do Projeto de Calçadas, Corrimão e Cobertura de Acesso ao Setor de Imagem

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 27/10/2025
- Percentual Executado: **54,98%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de Creche – Pré Escola Tipo II

Órgão: **Ministério da Educação**

Proposta nº: **003139/2024**

Recurso: **Programa PAC II**

Valor do Repasse.....R\$ 3.461.389,15

Valor da Contrapartida.....R\$ 47.273,88

Valor Total.....R\$ 3.508.663,03

Valor do Projeto.....R\$ 3.508.363,03

Executado.....R\$ 1.029.717,47

Itens:

Construção de Creche/Escola Tipo II

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 31/07/2025.
- Percentual Executado: **29,35%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Revitalização da Praça Arnaldo Roever

Recurso: **Governo/RS**

Valor Repasse.....R\$	500.000,00
Valor Contrapartida.....R\$	210.584,53
Valor do Projeto.....R\$	710.584,53
Valor da Licitação.....R\$	710.584,51
Valor do 1º Termo Aditivo (Adição).....R\$	26.855,80
Valor Total.....R\$	737.440,33
Executado.....R\$	345.301,68

Descrição:

Revitalização da Praça Arnaldo Roever (Substituição dos meio fio, pavimentação e criação de novos espaços de lazer)

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 13/01/2026.
- Percentual Executado: **48,60%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação Asfáltica (Bairro São José)

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 998.818,89

Valor da Licitação.....R\$ 988.648,71

Executado.....R\$ 913.251,81

Descrição:

Objeto: **Pavimentação asfáltica em P.M.F sobre pedras irregulares**

Local: **Ruas do Bairro São José**

Área: **12.857,00m²**

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 17/09/2025.
- Percentual Executado: **100%**
- Ajuste de Aditivo referente a Base





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Recuperação de Estradas Vicinais

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Agricultura**

Recurso: **Edital de Chamamento Público de Recuperação de Estradas Vicinais**

Valor Repasse.....R\$ 298.164,48

Valor Total.....R\$ 298.164,48

Valor da Licitação.....R\$ 275.136,00

Executado.....R\$ 206.057,20

Item:

Recuperação de Estradas Vicinais (contratação de serviço de hora/máquina)

- Sítio Casemiro
- São João
- Sítio Langner
- Sítio Bombardelli/Sítio Santos

Situação:

- Em Execução
- Percentual Executado: **74,89%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de Um Pavilhão Comunitário

Plano de Ação nº: **09032024-071776**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor do Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 97.240,60

Valor do Projeto.....R\$ 397.240,60

Valor da Licitação.....R\$ 394.181,48

Objeto:

Construção de Um Pavilhão Comunitário na Localidade de Linha Aparecida

Situação:

- Emitida Ordem de Início em 26/01/2026
- Em execução





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação com Pedras Irregulares

Plano de Ação nº: **09032024-071695**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Giovani Cherini**

Valor do Projeto.....R\$ 249.382,17

Valor da Licitação.....R\$ 187.000,00

Executado.....R\$ 49.666,95


Objeto:

Pavimentação com Pedras Irregulares na Rua Capitão Daíndo

Área: 1.730,00 m²

Situação:

- Emitida Ordem de Início em 26/03/2026
- Percentual Executado: **26,56%**

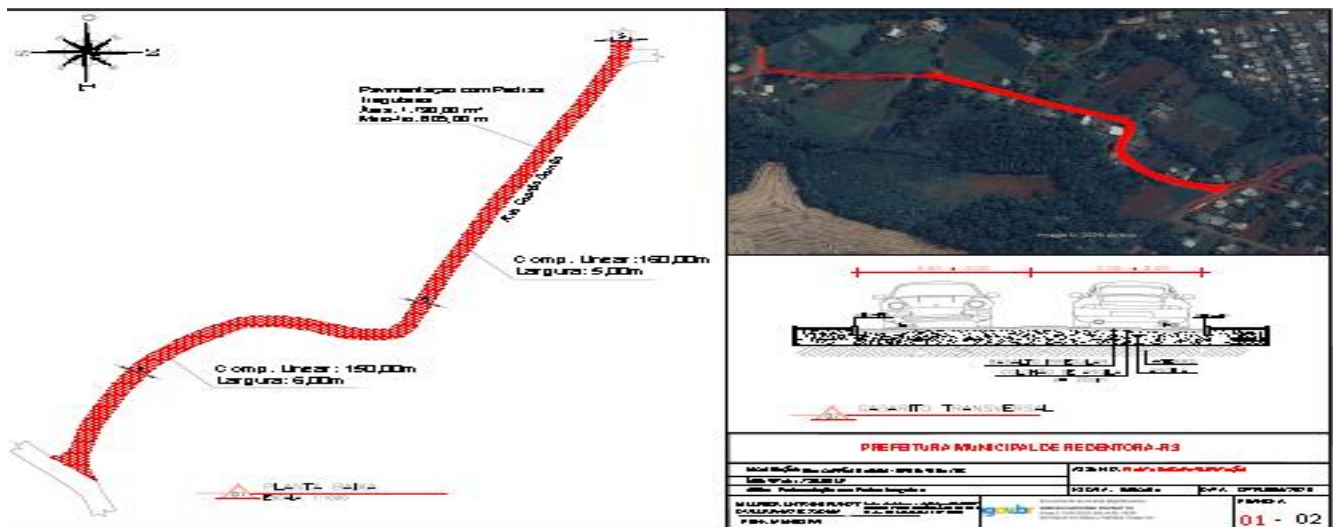



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Execução de Calçada e Pavimentação no Centro Turístico

Plano de Ação nº: **09032023-033**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Paulo Pimenta**

Valor do Repasse.....R\$ 32.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 31.100,54


Executado.....R\$ 25.574,72

Itens:

Execução de Calçadas e Pavimentação no Centro Turístico de Exposição e Comercialização do Artesanato da Terra Indígena do Guarita.

Situação:

- Emitida Ordem de Início em 02/03/2026
- Percentual Executado: **82,23%**

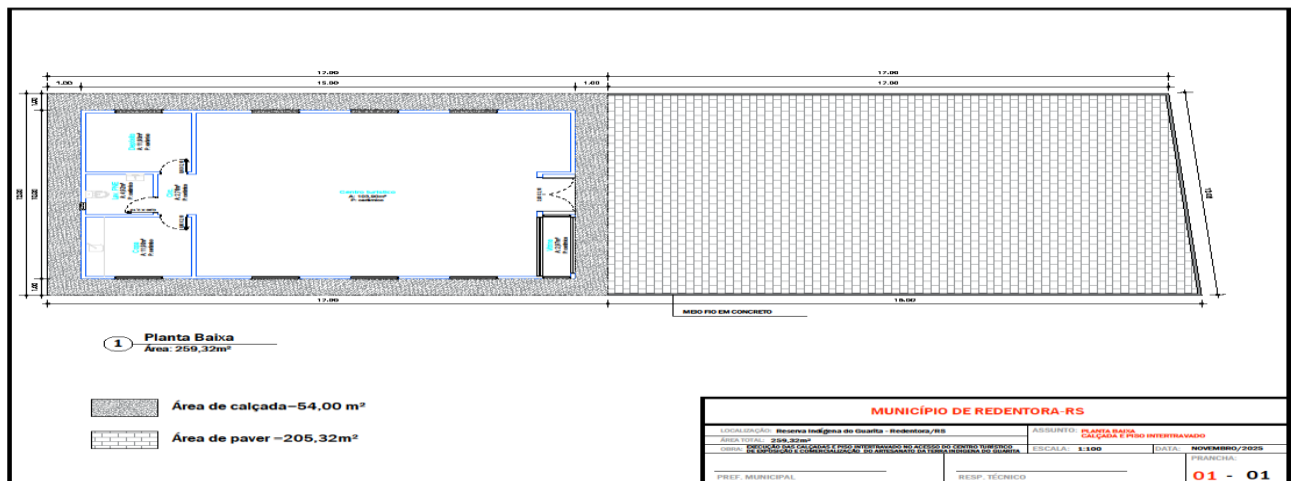



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de Uma UBS no Distrito de São João

Órgão: **Ministério da Saúde**

Proposta nº: **97531.2560001/24-004**

Recurso: **Programa**

Valor do Repasse.....R\$ 2.056.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 130.836,87

Valor Total.....R\$ 2.186.836,87

Valor da Licitação.....R\$ 2.185.212,23

Itens:

Construção de Uma UBS no Distrito de São João

Situação:

- Emitida Ordem de Início em 13/03/2026
- Em Fase de Execução da Terraplanagem





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Materiais - Hospital

Recurso: **Livre**

Valor do Projeto.....R\$	100.921,46
Valor da Licitação.....R\$	85.833,46

Descrição:

- Aquisição de Luminárias;
- Aquisição de Portas;
- Aquisição de Barras de Apoio;
- Aquisição de Torneiras/Chuveiros.

Situação:

- Luminárias recebidas, aguardando conclusão das obras para instalação.
- Demais materiais aguardando a entrega.



PROJETOS LICITADOS (Aguardando Início de Obras)

Projeto de Forro em Gesso Acartonado - Hospital

Proposta: **1918/2025**

Recurso: **Secretária Estadual da Saúde**

Valor do Projeto.....R\$	101.490,46
Valor da Licitação.....R\$	101.490,46

Descrição:

- Execução do Projeto de Forro em Gesso Acartonado

Situação:

- Licitação Realizada em 11/12/2025
- Aguardando conclusão da climatização para colocação do forro



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de 20 Unidades Habitacionais

Órgão: **Ministério das Cidades**

Proposta nº: **040909/2025**

Recurso: **Programa**

Valor do Repasse.....R\$ 2.800.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 92.608,74

Valor Total.....R\$ 2.892.608,74

Valor da Licitação.....R\$ 2.892.349,53

Itens:

Construção de 20 Unidades Habitacionais no Loteamento Nossa Senhora Aparecida

Situação:

- Licitação Realizada dia 27/01/2026.
- Em fase de análise da documentação para análise da CEF





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Infraestrutura do Loteamento Habitacional

Recurso: **FINISA**

Valor.....R\$ 769.968,81

Valor Total.....R\$ 769.968,81


Valor da Licitação.....R\$ 769.805,11

Itens:

Infraestrutura do Loteamento Habitacional (Pavimentação, calçadas, drenagem, meio fio)

Situação:

- Licitação realizada 10/03/2026.
- Aguardando a Limpeza do Terreno

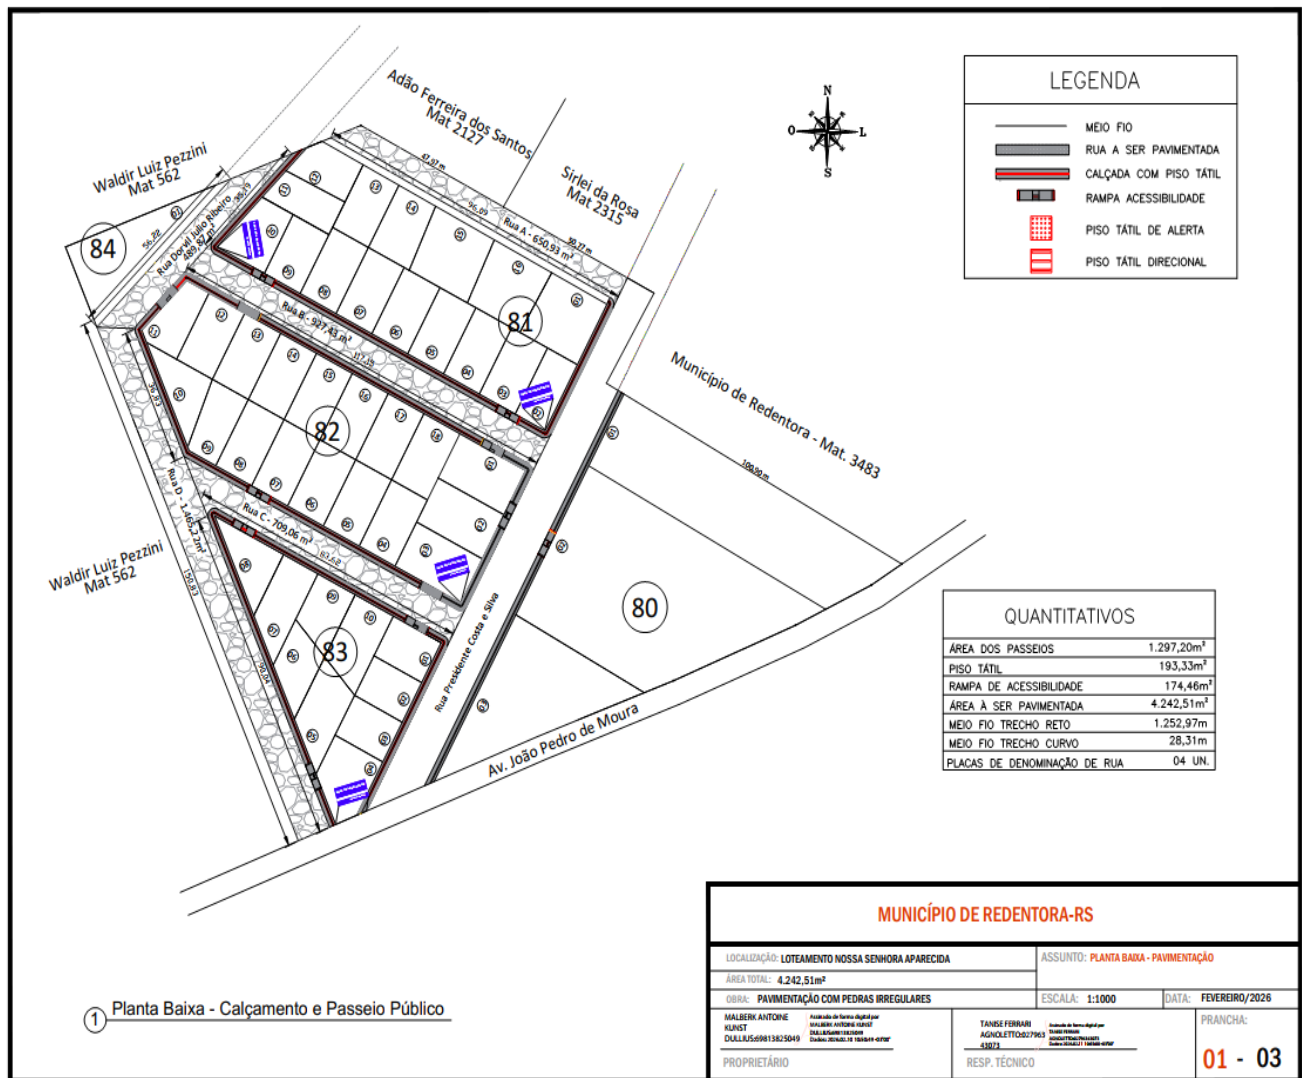



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETO LICITADO (Aguardando Liberação do Recurso)

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **052170/2021**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00


Valor Total.....R\$ 239.750,00

Valor da Licitação.....R\$ 224.101,12

Objeto: **Pavimentação com Pedras Irregulares na Localidade de Vila São Sebastião**

Situação:

- Licitação Aprovada Pela Caixa Econômica Federal em 28/03/2023.
- Aguardando a Liberação do Recurso para Início da Execução da Obra.

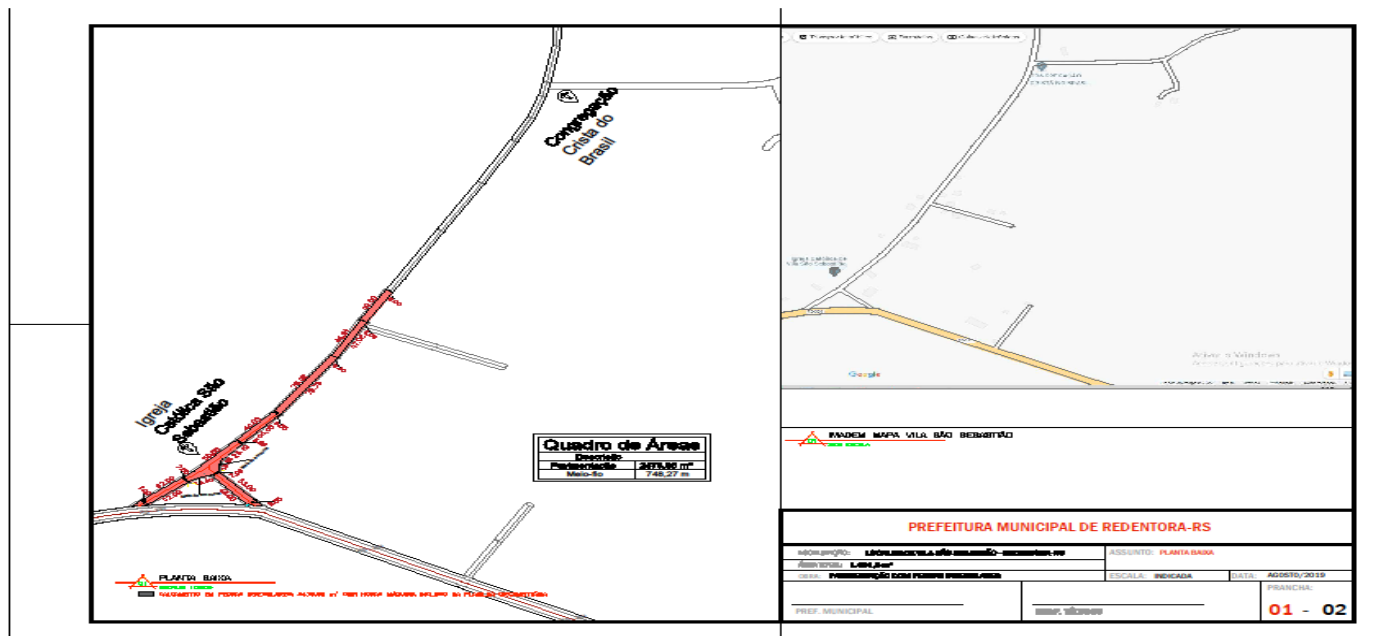



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS COM RECURSO LIBERADO (Aguardando Licitação)

Aquisição de 01 (um) Veículo

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Saúde**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 10.900,00

Valor Total.....R\$ 10.900,00

Item:

Aquisição de Um Veículo Tipo Sedan 05 lugares

Situação:

- Recurso Liberado em 28/11/2025.

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (Sec. Saúde)

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde**

Proposta nº: **97531.2560001/24-002**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Paulo Paim**

Valor do Repasse.....R\$ 250.000,00

Itens:

Aquisição de Equipamentos - UBS Cidade:

01 Aparelho de Ultrassom;

12 Aparelhos de Ar Condicionado;

02 Refrigerador;

02 Armários Vitrini;

02 Computadores Desktop;

01 Impressora Multifuncional;

01 Carro Maca Simples;

04 Biombos;

02 Carros de Curativo;

14 Longarinas;

02 Balde a Pedal;

02 (dois) No-Break;

01 (uma) Autoclave.

Situação:

- Recurso Liberado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS COM RECURSO LIBERADO (Aguardando Licitação)
(CONSULTA POPULAR)

Aquisição de Insumos

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural**

Recurso: **Consulta Popular 2018/2019 (Passivo)**

Valor Repasse.....R\$	59.009,21
Valor Contrapartida.....R\$	3.966,79
Valor Total.....R\$	62.976,00

Item:

Aquisição de 400 sacas de 50 kg de adubo Químico (Fórmula 10-20-20)

Situação:

- Recurso Liberado em 11/12/2025.
- Aguardando abertura de crédito no orçamento 2026.

Aquisição de Equipamentos Agrícolas

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural**

Recurso: **Consulta Popular 2024/2025**

Valor Repasse.....R\$	108.852,45
Valor Contrapartida.....R\$	13.680,89
Valor Total.....R\$	122.533,34

Item:

02 (duas) Colhedeiras de Forragens com Plataforma de no mínimo 1,00 m de corte

Situação:

- Recurso Liberado em 30/12/2025.
- Aguardando abertura de crédito no orçamento 2026.

Manutenção e Melhorias das Estradas Vicinais

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Agricultura**

Recurso: **Consulta Popular 2024/2025**

Valor Repasse.....R\$	81.641,87
Valor Contrapartida.....R\$	5.121,88
Valor Total.....R\$	86.763,75

Item:

Manutenção e Melhorias das Estradas Vicinais (contratação de serviço de hora/máquina)

125 Horas de Motoniveladora

125 Horas de Rolo Compactador

Situação:

- Recurso Liberado em 28/11/2025.
- Aguardando abertura de crédito no orçamento 2026.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS COM RECURSO LIBERADO
(Em Fase de Elaboração Projeto Engenharia)

Perfuração de 01 Poço Artesiano

Órgão Concedente: **Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária/RS.**

Recurso: **Programa Mais Água**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Item:

Perfuração de 01 Poços Artesiano na Localidade de Linha Mânica

Situação:

- 1ª Parcela do Recurso Liberado para a Elaboração do Projeto
- Aguardando abertura de crédito no orçamento 2026 (contratação de Geólogo)

Pavimentação Asfáltica

Órgão Concedente: **Ministério das Cidades**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Transferências Especiais**

Plano de Ação: **09032025-078936**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor Repasse.....R\$ 396.000,00

Valor Total.....R\$ 396.000,00

Item:

Pavimentação Asfáltica na Rua Aceino Lutz Pinheiro

Situação:

- Recurso Liberado em 10/09/2025

Construção de Espaço de Esporte e Lazer

Órgão Concedente: **Ministério do Esporte**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Transferências Especiais**

Plano de Ação: **09032025-085516**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 396.000,00

Valor Total.....R\$ 396.000,00

Item:

Construção de Uma Quadra Coberta na Terra Indígena do Guarita

Situação:

- Recurso Liberado em 15/09/2025



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROPOSTAS APROVADAS (Aguardando Assinatura do Convênio)

Construção de Espaço Esportivo

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual de Esporte e Lazer**

Recurso: **Programa Avançar + Esporte**

Valor Repasse.....R\$ 385.180,82

Valor Contrapartida.....R\$ 165.077,50

Valor Total.....R\$ 550.258,32

Item:

Construção de Espaço Esportivo – Quadra Coberta com Gramado Sintético

Situação:

- Projeto Aprovado, Município Selecionado, Aguardando assinatura do Termo de Convênio.



Implantação de Iluminação no Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual de Esporte e Lazer**

Recurso: **Programa Avançar + Ilumina**

Valor Repasse.....R\$ 185.945,75

Valor Contrapartida.....R\$ 79.691,03


Valor Total.....R\$ 265.636,78

Item:

Implantação do Projeto de Iluminação no Estádio Municipal Ricardo Tesche

Situação:

- Projeto Aprovado, Município Selecionado, Aguardando assinatura do Termo de Convênio.

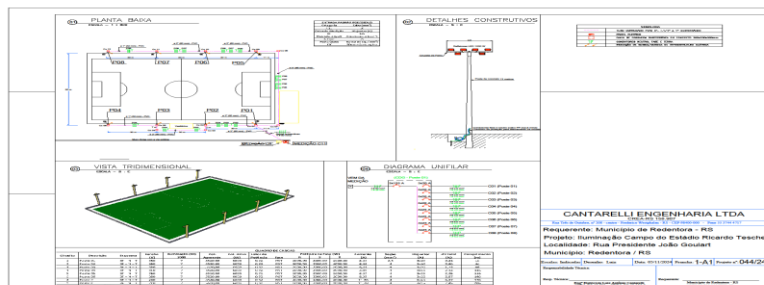



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROPOSTA APROVADA (Em Fase de Elaboração do Projeto)

Pavimentação com Pedras Irregulares

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Termo de Convênio: **975377/2025**

Parlamentar: **Heitor Schuch**

Valor Repasse.....R\$ 429.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.250,00


Valor Total.....R\$ 431.000,00

Descrição:

Pavimentação com Pedras Irregulares no Setor de Irapuá na Terra Indígena do Guarita

Situação:

- Em fase de levantamento topográfico para elaboração do projeto

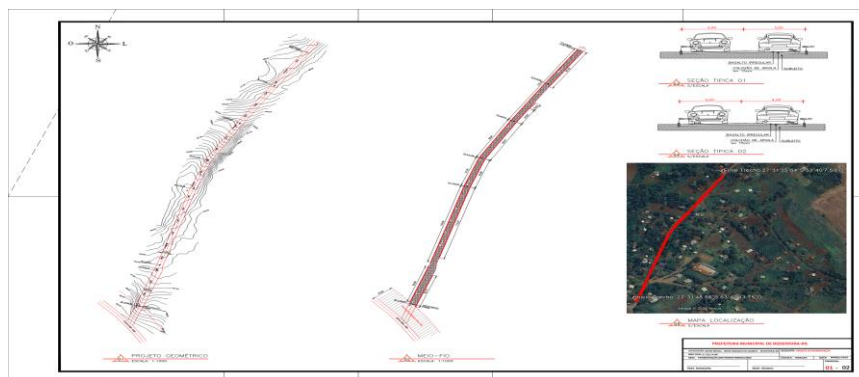

PROJETO EM FASE DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Aquisição de Equipamentos Agrícolas

Proposta nº: **011742/2024**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Paulo Pimenta**

Valor Repasse.....R\$ 334.250,00

Valor Contrapartida.....R\$ 6.650,00

Valor Total.....R\$ 340.900,00

Valor da Licitação.....R\$ 286.300,00

Valor de Saldo.....R\$ 54.600,00

Item:

01 (um) Classificador de Sementes

Situação:

- Em fase de readequação do Plano de Trabalho



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROPOSTAS CADASTRADAS (Governo RS)

Pavimentação Asfáltica - PAVIMENTA

Recurso: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano**

Proposta nº: **2680/2025**

Recurso: **Programa Pavimenta**

Valor Repasse.....R\$ 971.022,97

Valor Contrapartida.....R\$ 58.261,38

Valor Total.....R\$ 1.029.284,35


Item:

Pavimentação Asfáltica de 12,100,16 m²

- Bairro Nove de Julho
- Bairro Santa Lúcia

Situação:

- Proposta enviada para análise.

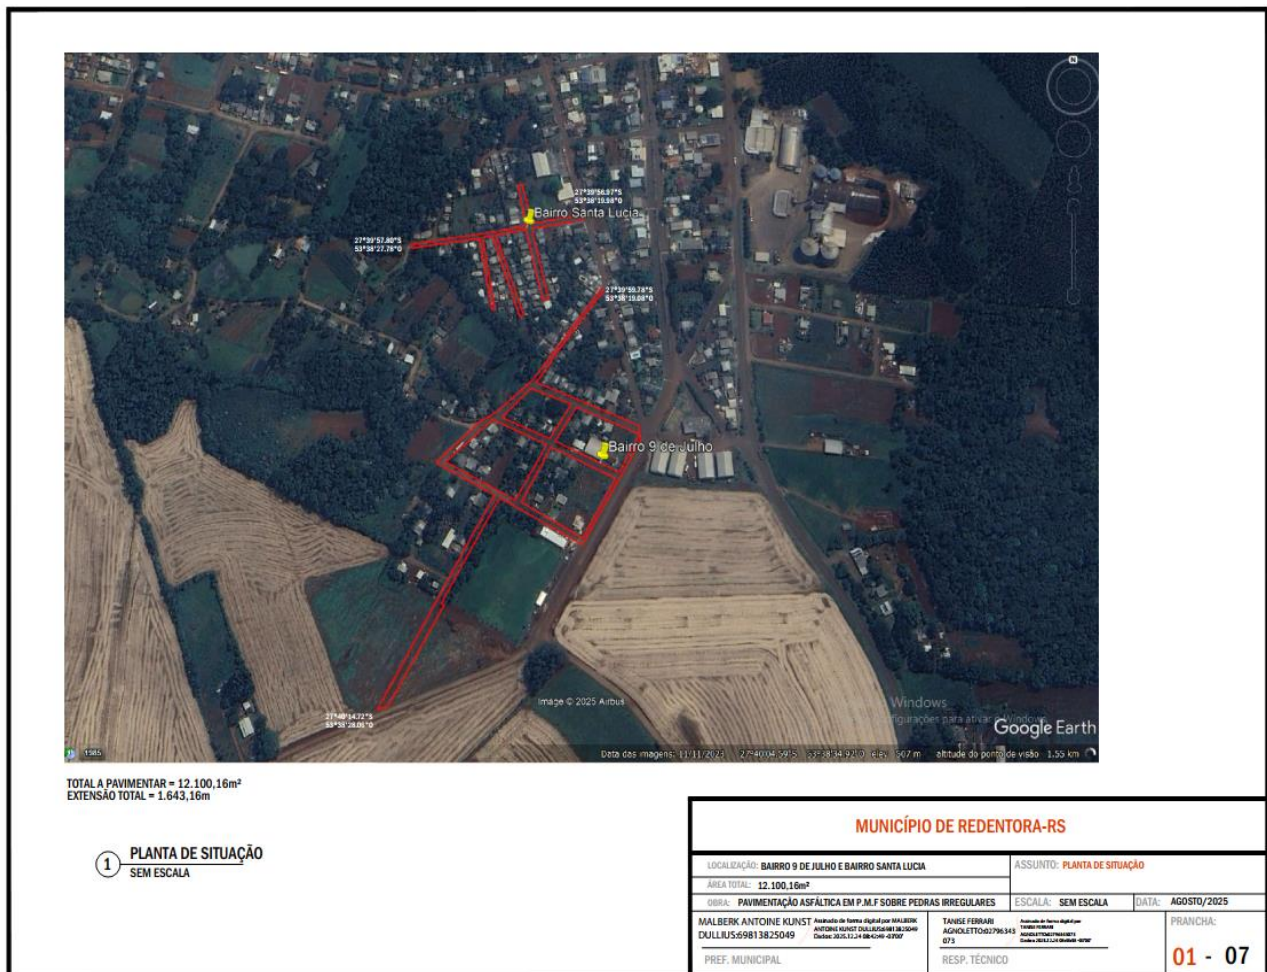



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação com Pedras Irregulares

Recurso: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano**

Proposta nº: **3476/2025**

Recurso: **Programa Pavimenta**

Valor Repasse.....R\$ 369.569,72

Valor Contrapartida.....R\$ 22.174,18

Valor Total.....R\$ 391.743,90


Item:

Pavimentação com Pedras Irregulares de 2.975 m²

- Distrito de Sítio Cassemiro

Situação:

- Proposta enviada para análise.

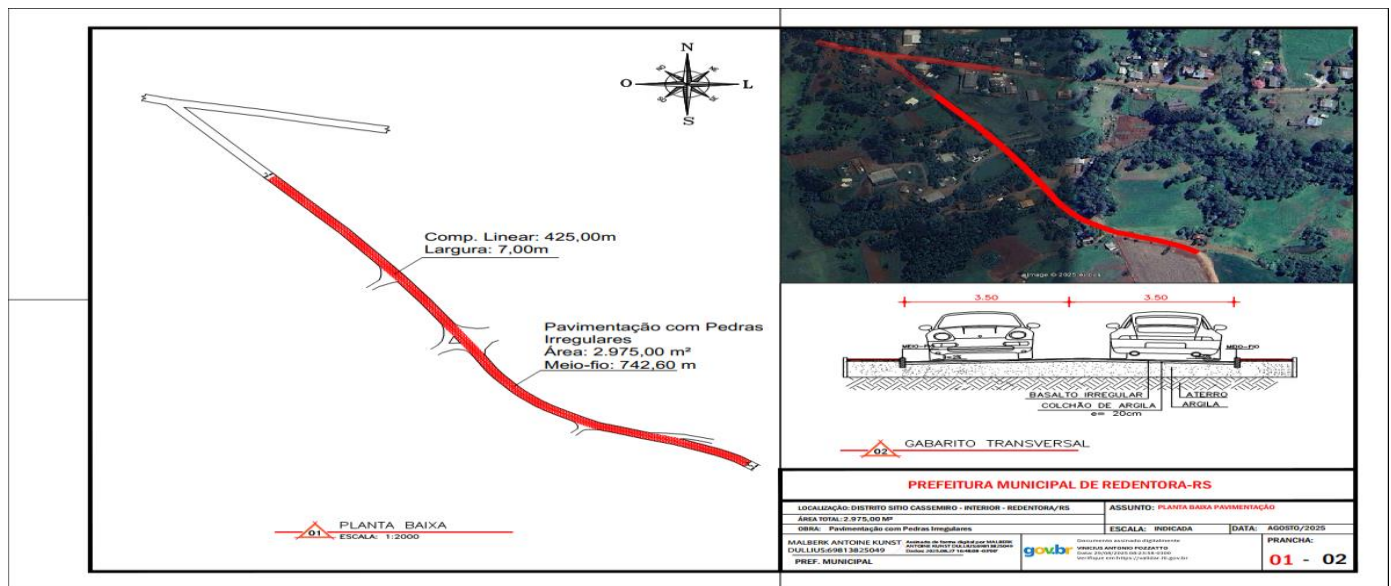

Aquisição de Equipamentos para Agroindústrias

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural**

Recurso: **Consulta Popular 2024/2025**

Valor Repasse.....R\$ 58.781,51

Valor Contrapartida.....R\$ 2.512,91

Valor Total.....R\$ 61.294,42

Item:

Aquisição de Equipamentos

Situação:

- Proposta Enviada para Análise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROPOSTAS CADASTRADAS (Governo Federal)

Aquisição de Kit Equipamentos Saúde

Órgão: **Ministério da Saúde**

Recurso: **Programa Novo PAC**

Valor Total.....R\$ 199.596,00

Itens:

Aquisição de Equipamentos para a UBS Cidade

Situação:

- Proposta Enviada para Análise.

Aquisição de Kit Equipamentos Saúde

Órgão: **Ministério da Saúde**

Recurso: **Programa Novo PAC**

Valor Total.....R\$ 7.158,00

Itens:

Aquisição de Kit Teleconsulta

Situação:

- Proposta Enviada para Análise.

PROJETOS EM ELABORAÇÃO

Aquisição de Materiais para Blindagem (Raio x/Ultrassonografia)

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado.....R\$ 15.000,00

Itens:

- Porta Sala Raio X; Portão Sala de Ultrassonografia; Visor Portas; Barita.

Situação:

- Em Elaboração.

Elaboração dos Projetos de OUTORGA

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado.....R\$ 51.000,00

Objeto:

Elaboração de 10 Projetos de OUTORGA de Poços Tubulares

Situação:

- Em Elaboração.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS CONCLUÍDOS

Projeto de Fechamento do Pavilhão – Assistência Social

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 74.128,08

Valor da Licitação.....R\$ 72.932,39


Valor Executado.....R\$ 72.932,39

Descrição:

Fechamento do Pavilhão e execução de piso de concreto.

Situação:

- Concluído 05/01/2026.

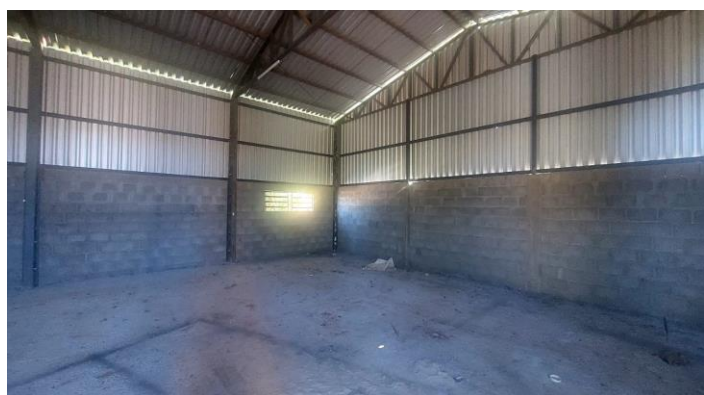



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Revitalização da Pracinha de Brinquedos da Praça Arnaldo Roever

Recurso: **Municipal**

Emenda Impositiva.....	R\$	31.777,42
Recurso Livre.....	R\$	210.584,53
Valor do Projeto.....	R\$	144.715,63
Valor da Licitação.....	R\$	126.900,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$	4.047,87
Valor Atualizado.....	R\$	130.947,87
Executado.....	R\$	130.947,87

Descrição:

Revitalização da Praça de Brinquedos (piso, muro, grades e gramado sintético)

Situação:

- Emitido o Termo de Recebimento da Obra em 27/03/2026.
- Percentual Executado: **100% Concluído**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Perfuração de 01 Poço Artesiano

Órgão Concedente: **Secretaria de da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação/RS.**

Recurso: **Programa Avançar Poços**

Valor Repasse.....	R\$	110.218,93
Valor Contrapartida.....	R\$	7.035,25
Valor Total.....	R\$	117.254,18
Valor da Licitação.....	R\$	116.389,61
Valor do 1º Termo Aditivo (supressão).....	R\$	22.539,34
Valor Atualizado.....	R\$	93.850,27
Executado.....	R\$	93.850,27

Item:

Perfuração de 01 Poços Artesiano na Localidade de Passo do Pinheirinho

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 03/12/2025.
- Percentual Executado: **100,00% Concluído**
- Emitida Termo de Recebimento da Obra em 26/02/2026.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Brinquedos Tipo Parque Infantil

Órgão Concedente: **Secretaria do Esporte e Lazer/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2023/2024**

Valor Repasse.....	R\$	32.921,85
Valor Contrapartida.....	R\$	11.944,82
Valor Total.....	R\$	44.866,68
Valor da Licitação.....	R\$	44.850,00

Item:

Aquisição de Brinquedos Tipo Parque Infantil de 04 Torres (Playground) em Madeira Plástica

Situação:

- Brinquedos Instalados em 07/01/2026.
- Percentual Executado: **100,00% Concluído**



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de Um Pavilhão Comunitário

Plano de Ação nº: **09032024-067459**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Heitor Schuch**

Valor de Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor do Projeto.....R\$ 98.583,15

Valor da Licitação.....R\$ 97.400,00

Objeto:

Construção de Um Pavilhão Comunitário Setor de Katiu Griá na Terra Indígena do Guarita

Situação:

- Emitida Ordem de Início em 26/01/2026
- Percentual Executado: **100,00% Concluído**
- Emitida Termo de Recebimento da Obra em 30/03/2026.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Elaboração dos Projetos de OUTORGA

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 50.133,30

Valor da Licitação.....R\$ 43.672,50

Objeto:

Elaboração de 10 Projetos de OUTORGA de Poços Tubulares

Situação:

- Emitida Ordem de Início dia 17/07/2025.
- Concluído o cadastro das Outorgas junto a SEMA.



RELATÓRIO POÇOS TUBULARES
DATA: 25/02/2026
A/C:
Prefeitura Municipal de Redentora
Redentora - RS

(55) 9 9719-9487
firmogeologia.com.br
firmogeologia@gmail.com

O presente documento visa apresentar a relação dos poços previamente cadastrados junto ao SIOU e devidamente requeridos ao pedido de outorga, aguardando análise do DRH, no município de Redentora - RS, sob responsabilidade técnica do Eng. Geólogo Hernanes Firmo Silva, sob registro CREA/RS 245495, a fim de atender ao programa Poço Legal.

SERVIÇOS E VALORES

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº CADASTRO SIOU	ART
1	Poço Linha Menica - (Linha Palmeira)	2023/016.549-1	14185304
2	Poço vista alegre	2023/016.574-1	14185279
3	Poço Localidade de Sítio Langner - Luiz Bonato	2023/016.404-2	14185272
4	Poço Prates	2022/009.955-3	14185302
5	Poço São José	2023/016.524-3	14185300
6	Poço Linha São Sebastião 2023/016.410-2	2023/016.410-2	14185278
7	Poço Localidade de Sítio Cassimiro (Otanelli)	2023/016.469-1	14185280
8	Poço Ouro Verde (Ardenghi)	2023/016.436-2	14185277
9	Poço Linha Soledade (Evaldo Farias)	2023/016.559-2	14185303
10	Poço Localidade de Vila São João	2023/016.532-2	14185301

Responsável Técnico
Hernanes Firmo
Eng. Geólogo Esp. Geotécnica
CREA/RS 245495
Coordenador de Projetos

41.919.983/0001-41
H FIRMO SILVA LTDA
Rua Visconde de Pinheiros, 2302 Apt 03
Núcleo Setor de Fátima
CEP: 91.210-100
São Paulo - SP

[Assinatura]



GEOLOGIA GEOTECNIA MINERAÇÃO

Custeio Saúde

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Pompeo de Mattos**

Valor Repasse.....R\$ 150.000,00

Valor Total.....R\$ 150.000,00

Descrição:

Custeio de Incremento ao Piso de Atenção Primário - PAP

Situação:

- Recurso Liberado



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Aquisição de Equipamentos para o Hospital

Órgão Concedente: **Secretaria da Saúde/RS.**

Recurso: **Portaria SES nº 750/2023**

Valor Repasse.....R\$ 750.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.193,03

Valor Total.....R\$ 752.193,03

Valor da Licitação.....R\$ 729.010,00

Valor a Ser Devolvido.....R\$ 20.990,00

Itens:

01 (um) Aparelho para digitalização de Imagens CR

01 (uma) Lavadora Extratora Hospitalar, Capacidade Mínima 30 kg

01 (uma) Secador Rotativo, Capacidade Mínima de 28 Kg

01 (uma) Calandra Horizontal

01 (uma) Seladora Automática para Embalagens de Grau Cirúrgico

01 (uma) Autoclave a Vapor

01 (uma) Lavadora Ultrassônica Linha Médica Hospitalar

03 (três) Camas Tipo Fowler

OBS: Realizada a vistoria pela CRS nos equipamentos dia 08/04/2026

Aquisição de Equipamentos Agrícolas

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **010719/2023**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 143.250,00

Valor Contrapartida.....R\$ 150,00

Valor Total.....R\$ 143.400,00

Valor da Licitação.....R\$ 113.500,00

Itens:

01 (uma) Colhedeira de Forragens;

01 (um) Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido.

OBS: Prestação de Contas enviada para análise



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Heitor Schuch**

Proposta SICONV: **002523/2022**

Valor Repasse.....R\$ 143.250,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.750,00

Valor Total.....R\$ 146.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 144.150,00

Itens:

01 (uma) Grade Aradora

01 (uma) Grade Niveladora

01 (uma) Carreta Agrícola com Carroceria de Madeira

01 (uma) Roçadeira Agrícola

OBS: Prestação de Contas enviada para análise

Redentora, 31 de março de 2026.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
