



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ABRIL - 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Projeto de Climatização e Ventilação Mecânica - Hospital

Proposta: **1918/2025**

Recurso: **Secretária Estadual da Saúde**

Valor do Projeto.....R\$	1.404.605,55
Valor da Licitação.....R\$	1.400.000,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....R\$	23.500,00
Valor Total Atualizado.....R\$	1.423.500,00
Executado.....R\$	699.580,00

Descrição:

- Execução do Projeto de Sistema de Climatização e Ventilação Mecânica

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 07/01/2026
- Percentual Executado: **49,97 %**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Projeto de Pintura Interna e Externa - Hospital

Proposta: **1918/2025**

Recurso: **Secretária Estadual da Saúde**

Valor do Projeto.....R\$ 212.163,47

Valor da Licitação.....R\$ 140.000,00

Executado.....R\$ 56.588,45

Descrição:



- Execução do Projeto de Pintura Interna e Externa

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 07/01/2026

- Percentual Executado: **40,42%**

- Obra paralisada, aguardando conclusão da climatização e gesso, para andamento.

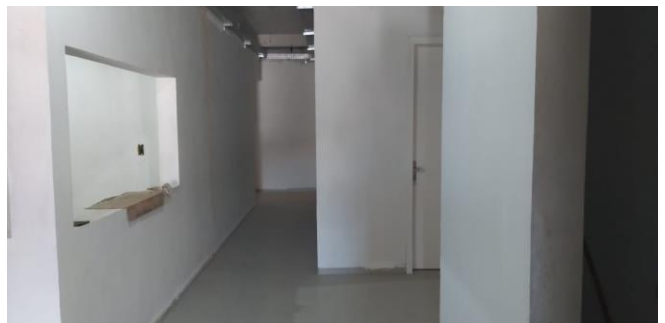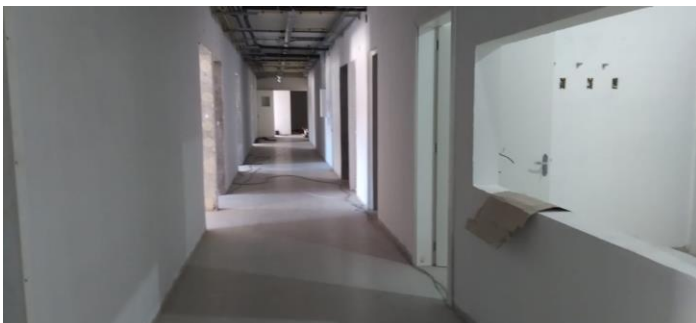



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Execução de Instalações Elétricas, Lógica e SPDA - Hospital

Plano de Ação nº: **09032024-072425**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**


Valor do Repasse.....	R\$	210.000,00
Valor Contrapartida.....	R\$	83.388,47
Valor Total do Projeto.....	R\$	293.388,47
Valor da Licitação.....	R\$	246.000,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$	22.595,03
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$	33.612,44
Valor Total.....	R\$	302.207,47
Valor Pago a Empresa.....	R\$	293.891,68

Itens:

- Execução do Projeto de Instalações Elétricas;
- Instalações de Comunicação;
- Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

Situação:

- Emitida Ordem de Início da Obra em 14/04/2025.
- Percentual Executado: **96,62%**
- Obra paralisada, aguardando conclusão da Climatização, Gesso e Pintura.

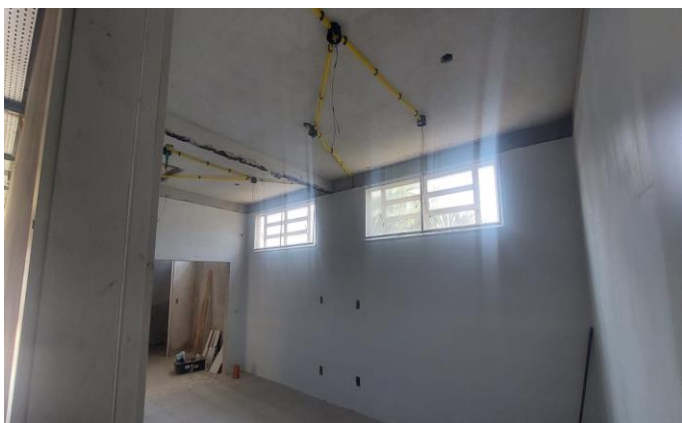



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Projeto de Adequação das Calçadas do Hospital

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$	76.290,45
Valor da Licitação.....R\$	66.200,00
Valor do 1º Termo Aditivo (Supressão).....R\$	1.266,84
Valor do 2º Termo Aditivo (Adição).....R\$	6.977,65
Valor Total.....R\$	71.910,81
Executado.....R\$	39.541,04

Descrição:

- Execução do Projeto de Calçadas, Corrimão e Cobertura de Acesso ao Setor de Imagem

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 27/10/2025
- Percentual Executado: **54,98%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de Creche – Pré Escola Tipo II

Órgão: **Ministério da Educação**

Proposta nº: **003139/2024**

Recurso: **Programa PAC II**

Valor do Repasse.....R\$ 3.461.389,15

Valor da Contrapartida.....R\$ 47.273,88

Valor Total.....R\$ 3.508.663,03

Valor do Projeto.....R\$ 3.508.363,03

Executado.....R\$ 1.236.476,04

Itens:

Construção de Creche/Escola Tipo II

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 31/07/2025.
- Percentual Executado: **35,24%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Revitalização da Praça Arnaldo Roever

Recurso: **Governo/RS**

Valor Repasse.....R\$	500.000,00
Valor Contrapartida.....R\$	210.584,53
Valor do Projeto.....R\$	710.584,53
Valor da Licitação.....R\$	710.584,51
Valor do 1º Termo Aditivo (Adição).....R\$	26.855,80
Valor Total.....R\$	737.440,33
Executado.....R\$	456.489,07

Descrição:

Revitalização da Praça Arnaldo Roever (Substituição dos meio fio, pavimentação e criação de novos espaços de lazer)

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 13/01/2026.
- Percentual Executado: **61,90%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação Asfáltica (Bairro São José)

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 998.818,89

Valor da Licitação.....R\$ 988.648,71

Valor do Termo Aditivo (Adição).....R\$ 31.948,72

Valor Total.....R\$ 1.020.597,43

Executado.....R\$ 913.251,81

Descrição:

Objeto: **Pavimentação asfáltica em P.M.F sobre pedras irregulares**

Local: **Ruas do Bairro São José**

Área: **12.857,00m²**

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 17/09/2025.
- Percentual Executado: **100%**
- Aguardando liberação da parcela do Finisa para pagamento





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Recuperação de Estradas Vicinais

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Agricultura**

Recurso: **Edital de Chamamento Público de Recuperação de Estradas Vicinais**

Valor Repasse.....R\$ 298.164,48

Valor Total.....R\$ 298.164,48

Valor da Licitação.....R\$ 275.136,00

Executado.....R\$ 275.136,00

Item:

Recuperação de Estradas Vicinais (contratação de serviço de hora/máquina)

- Sítio Cassemiro
- São João
- Sítio Langner
- Sítio Bombardelli/Sítio Santos

Situação:

- Em Execução
- Percentual Executado: **100,00%**
- Em fase de solicitação de Ampliação de metas para utilização do saldo do repasse.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de Um Pavilhão Comunitário

Plano de Ação nº: **09032024-071776**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor do Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 97.240,60

Valor do Projeto.....R\$ 397.240,60

Valor da Licitação.....R\$ 394.181,48

Executado.....R\$ 165.550,18

Objeto:

Construção de Um Pavilhão Comunitário na Localidade de Linha Aparecida

Situação:

- Emitida Ordem de Início em 26/01/2026
- Executado: **42,00%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação com Pedras Irregulares

Plano de Ação nº: **09032024-071695**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Giovani Cherini**

Valor do Projeto.....R\$ 249.382,17

Valor da Licitação.....R\$ 187.000,00

Valor do Termo Aditivo (Adição).....R\$ 46.749,08

Valor Total.....R\$ 233.749,08

Executado.....R\$ 85.973,20

Objeto:


Pavimentação com Pedras Irregulares na Rua Capitão Daíndo

Área: 1.730,00 m²

Situação:

- Emitida Ordem de Início em 26/03/2026

- Percentual Executado: **36,78%**

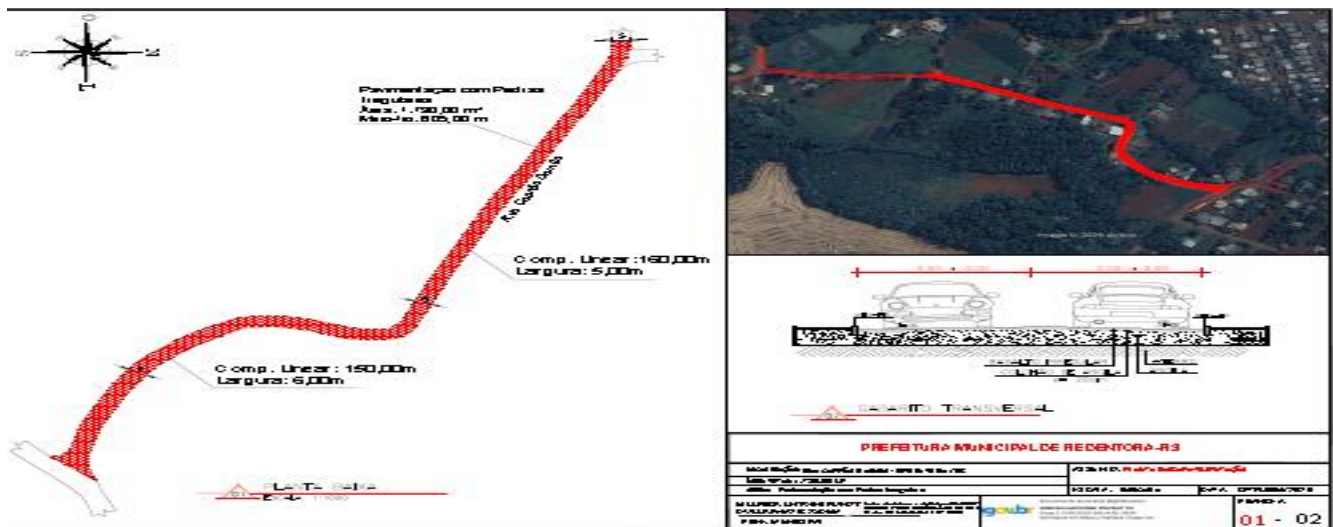



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de Uma UBS no Distrito de São João

Órgão: **Ministério da Saúde**

Proposta nº: **97531.2560001/24-004**

Recurso: **Programa**

Valor do Repasse.....R\$ 2.056.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 130.836,87

Valor Total.....R\$ 2.186.836,87

Valor da Licitação.....R\$ 2.185.212,23

Itens:

Construção de Uma UBS no Distrito de São João

Situação:

- Emitida Ordem de Início em 13/03/2026
- Em Fase de Execução da Terraplanagem





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Materiais - Hospital

Recurso: **Livre**

Valor do Projeto.....R\$ 100.921,46

Valor da Licitação.....R\$ 85.833,46

Descrição:

- Aquisição de Luminárias;
- Aquisição de Portas;
- Aquisição de Barras de Apoio;
- Aquisição de Torneiras/Chuveiros.

Situação:

- Luminárias recebidas, aguardando conclusão das obras para instalação.
- Demais materiais aguardando a entrega.



PROJETOS LICITADOS (Aguardando Início de Obras)

Projeto de Forro em Gesso Acartonado - Hospital

Proposta: **1918/2025**

Recurso: **Secretária Estadual da Saúde**

Valor do Projeto.....R\$ 101.490,46

Valor da Licitação.....R\$ 101.490,46

Descrição:

- Execução do Projeto de Forro em Gesso Acartonado

Situação:

- Licitação Realizada em 11/12/2025
- Aguardando conclusão da climatização para colocação do forro



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de 20 Unidades Habitacionais

Órgão: **Ministério das Cidades**

Proposta nº: **040909/2025**

Recurso: **Programa**

Valor do Repasse.....R\$ 2.800.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 92.608,74

Valor Total.....R\$ 2.892.608,74

Valor da Licitação.....R\$ 2.892.349,53

Itens:

Construção de 20 Unidades Habitacionais no Loteamento Nossa Senhora Aparecida

Situação:

- Licitação Realizada dia 27/01/2026.
- Em fase de análise da documentação para análise da CEF





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Infraestrutura do Loteamento Habitacional

Recurso: **FINISA**

Valor.....R\$ 769.968,81

Valor Total.....R\$ 769.968,81


Valor da Licitação.....R\$ 769.805,11

Itens:

Infraestrutura do Loteamento Habitacional (Pavimentação, calçadas, drenagem, meio fio)

Situação:

- Licitação realizada 10/03/2026.
- Aguardando a Limpeza do Terreno

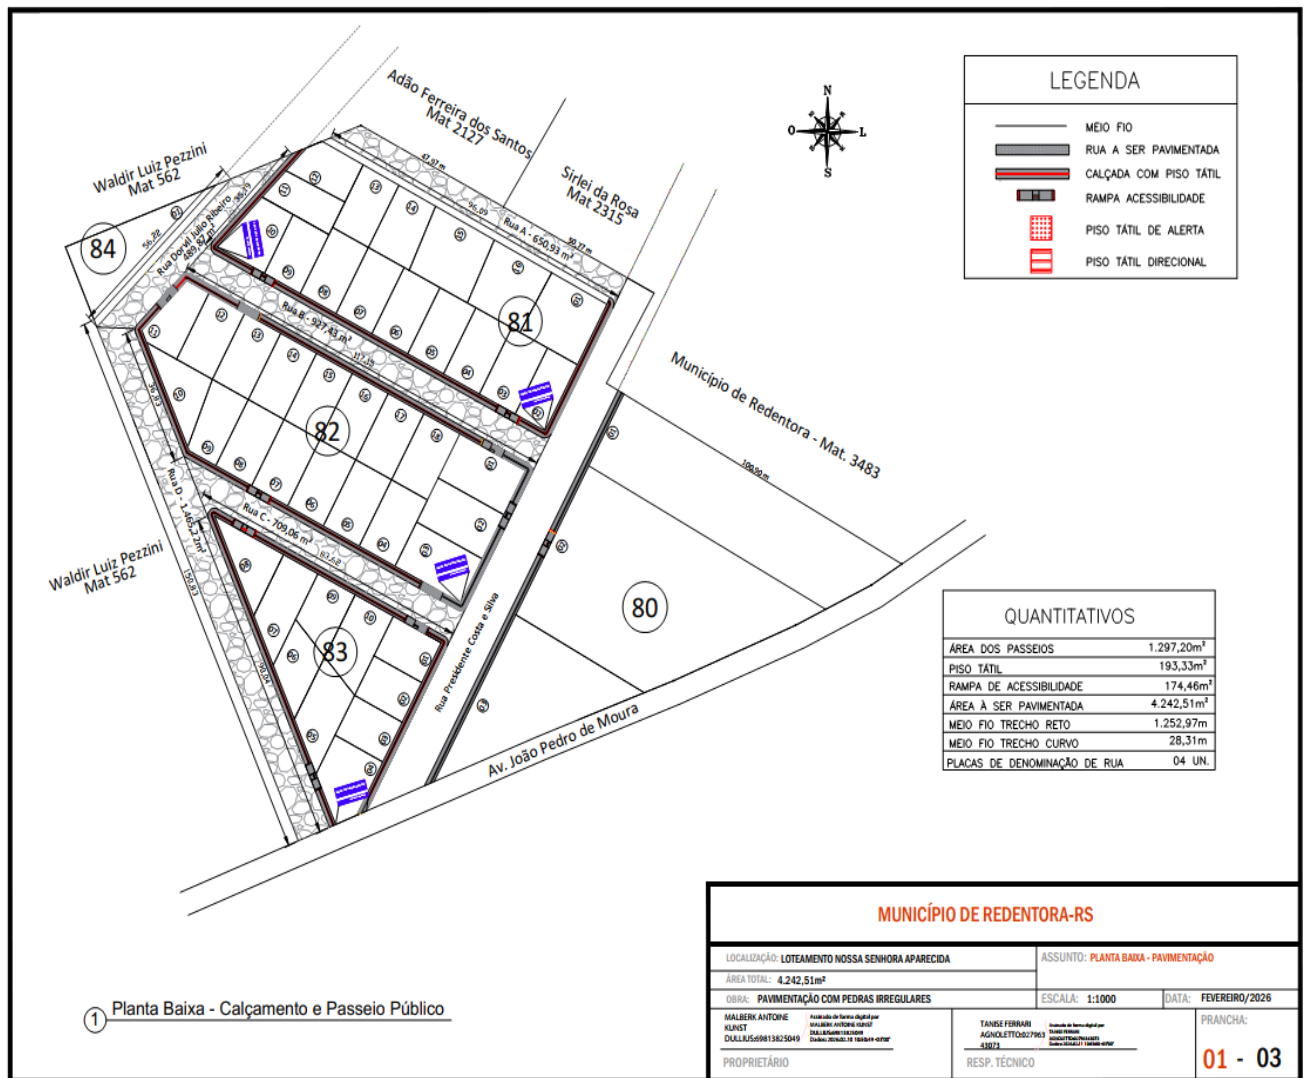



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETO LICITADO (Aguardando Liberação do Recurso)

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **052170/2021**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00


Valor Total.....R\$ 239.750,00

Valor da Licitação.....R\$ 224.101,12

Objeto: **Pavimentação com Pedras Irregulares na Localidade de Vila São Sebastião**

Situação:

- Licitação Aprovada Pela Caixa Econômica Federal em 28/03/2023.
- Aguardando a Liberação do Recurso para Início da Execução da Obra.

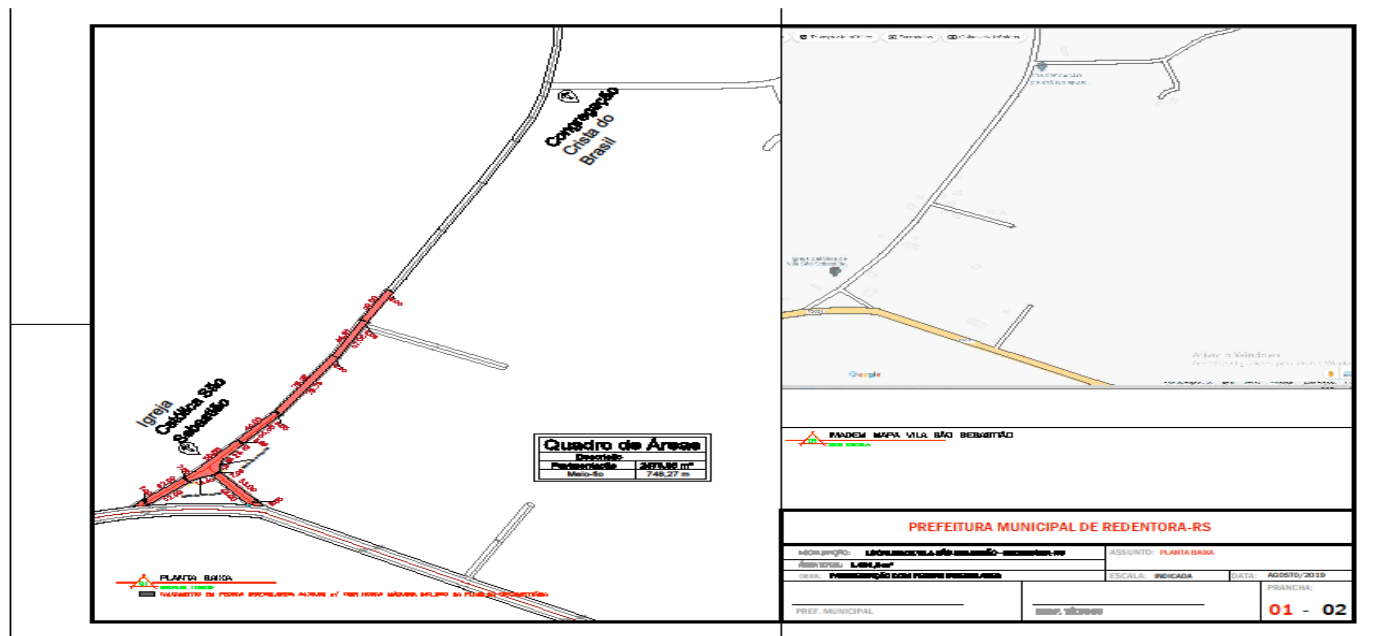



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS ENCAMINHADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES

Aquisição de 01 (um) Veículo

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Saúde**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 10.900,00

Valor Total.....R\$ 10.900,00

Item:

Aquisição de Um Veículo Tipo Sedan 05 lugares

Situação:

- Recurso Liberado em 28/11/2025.
- Encaminhado ao Setor de Licitações em 22/04/2026

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (Sec. Saúde)

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde**

Proposta nº: **97531.2560001/24-002**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Paulo Paim**

Valor do Repasse.....R\$ 250.000,00

Itens:

Aquisição de Equipamentos - UBS Cidade:

- 01 Aparelho de Ultrassom;
- 12 Aparelhos de Ar Condicionado;
- 02 Refrigerador;
- 02 Armários Vitríni;
- 02 Computadores Desktop;
- 01 Impressora Multifuncional;
- 01 Carro Maca Simples;
- 04 Biombos;
- 02 Carros de Curativo;
- 14 Longarinas;
- 02 Balde a Pedal;
- 02 (dois) No-Break;
- 01 (uma) Autoclave.

Situação:

- Recurso Liberado.
- Encaminhado ao Setor de Licitações em 24/04/2026



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (Sec. Saúde)

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde**

Proposta nº: **97531.2560001/24-015**

Recurso: **Calamidade Pública**

Valor do Repasse.....R\$ 69.875,00

Itens:

Aquisição de Equipamentos - UBS Cidade:

03 Armários;
02 Câmaras para Conservação de Imunobiológicos;
01 cadeira;
02 Computadores Desktop;
01 Computador Portátil (Notebook);
03 Caixa Térmica;
03 Longarinas;
01 Mesa de Exames;
02 Ar Condicionado;
06 Mesas de Escritório.

Situação:

- Recurso Liberado.
- Encaminhado ao Setor de Licitações em 24/04/2026

Manutenção e Melhorias das Estradas Vicinais

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Agricultura**

Recurso: **Consulta Popular 2024/2025**

Valor Repasse.....R\$ 81.641,87

Valor Contrapartida.....R\$ 5.121,88

Valor Total.....R\$ 86.763,75

Item:

Manutenção e Melhorias das Estradas Vicinais (contratação de serviço de hora/máquina)

125 Horas de Motoniveladora

125 Horas de Rolo Compactador

Situação:

- Recurso Liberado em 28/11/2025.
- Encaminhado ao Setor de Licitações em 17/04/2026



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Contratação de Empresa para Elaboração de Projetos de OUTORGA

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado.....R\$ 51.000,00

Objeto:

Elaboração de 10 Projetos de OUTORGA de Poços Tubulares

Situação:

- Encaminhado ao Setor de Licitações em 15/04/2026

PROJETOS COM RECURSO LIBERADO (Aguardando Licitação)

Aquisição de Insumos

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural**

Recurso: **Consulta Popular 2018/2019 (Passivo)**

Valor Repasse.....R\$ 59.009,21

Valor Contrapartida.....R\$ 3.966,79

Valor Total.....R\$ 62.976,00

Item:

Aquisição de 400 sacas de 50 kg de adubo Químico (Fórmula 10-20-20)

Situação:

- Recurso Liberado em 11/12/2025.

Aquisição de Equipamentos Agrícolas

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural**

Recurso: **Consulta Popular 2024/2025**

Valor Repasse.....R\$ 108.852,45

Valor Contrapartida.....R\$ 13.680,89

Valor Total.....R\$ 122.533,34

Item:

02 (duas) Colhedeiras de Forragens com Plataforma de no mínimo 1,00 m de corte

Situação:

- Recurso Liberado em 30/12/2025.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS COM RECURSO LIBERADO
(Em Fase de Elaboração Projeto Engenharia)

Perfuração de 01 Poço Artesiano

Órgão Concedente: **Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária/RS.**

Recurso: **Programa Mais Água**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Item:

Perfuração de 01 Poços Artesiano na Localidade de Linha Mânica

Situação:

- 1ª Parcela do Recurso Liberado para a Elaboração do Projeto
- Contratada empresa para Elaboração do Projeto

Pavimentação Asfáltica

Órgão Concedente: **Ministério das Cidades**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Transferências Especiais**

Plano de Ação: **09032025-078936**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor Repasse.....R\$ 396.000,00

Valor Total.....R\$ 396.000,00

Item:

Pavimentação Asfáltica na Rua Aceino Lutz Pinheiro

Situação:

- Recurso Liberado em 10/09/2025

Construção de Espaço de Esporte e Lazer

Órgão Concedente: **Ministério do Esporte**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Transferências Especiais**

Plano de Ação: **09032025-085516**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 396.000,00

Valor Total.....R\$ 396.000,00

Item:

Construção de Uma Quadra Coberta na Terra Indígena do Guarita

Situação:

- Recurso Liberado em 15/09/2025
- Em fase de elaboração do projeto de Engenharia



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROPOSTAS APROVADAS (Aguardando Assinatura do Convênio)

Construção de Espaço Esportivo

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual de Esporte e Lazer**

Recurso: **Programa Avançar + Esporte**

Valor Repasse.....R\$ 385.180,82

Valor Contrapartida.....R\$ 165.077,50

Valor Total.....R\$ 550.258,32

Item:

Construção de Espaço Esportivo – Quadra Coberta com Gramado Sintético

Situação:

- Projeto Aprovado, Município Selecionado, Aguardando assinatura do Termo de Convênio.



Implantação de Iluminação no Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual de Esporte e Lazer**

Recurso: **Programa Avançar + Ilumina**

Valor Repasse.....R\$ 185.945,75

Valor Contrapartida.....R\$ 79.691,03


Valor Total.....R\$ 265.636,78

Item:

Implantação do Projeto de Iluminação no Estádio Municipal Ricardo Tesche

Situação:

- Projeto Aprovado, Município Selecionado, Aguardando assinatura do Termo de Convênio.

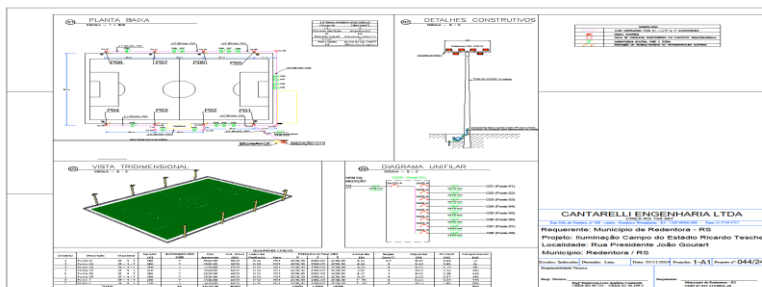



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROPOSTA APROVADA (Em Fase de Elaboração do Projeto)

Pavimentação com Pedras Irregulares

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Termo de Convênio: **975377/2025**

Parlamentar: **Heitor Schuch**

Valor Repasse.....R\$ 429.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.250,00


Valor Total.....R\$ 431.000,00

Descrição:

Pavimentação com Pedras Irregulares no Setor de Irapuá na Terra Indígena do Guarita

Situação:

- Projeto enviado para análise

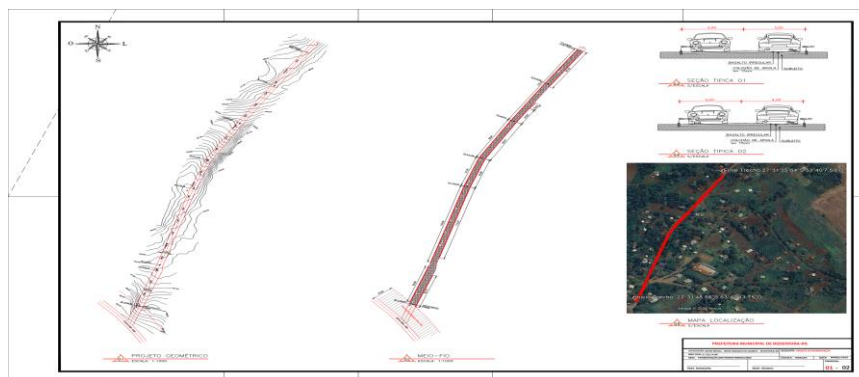

PROJETO EM FASE DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Aquisição de Equipamentos Agrícolas

Proposta nº: **011742/2024**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Paulo Pimenta**

Valor Repasse.....R\$ 334.250,00

Valor Contrapartida.....R\$ 6.650,00

Valor Total.....R\$ 340.900,00

Valor da Licitação.....R\$ 286.300,00

Valor de Saldo.....R\$ 54.600,00

Item:

01 (um) Classificador de Sementes

Situação:

- Em fase de readequação do Plano de Trabalho



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROPOSTAS CADASTRADAS (Governo RS)

Pavimentação Asfáltica - PAVIMENTA

Recurso: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano**

Proposta nº: **2680/2025**

Recurso: **Programa Pavimenta**

Valor Repasse.....R\$ 971.022,97

Valor Contrapartida.....R\$ 58.261,38

Valor Total.....R\$ 1.029.284,35


Item:

Pavimentação Asfáltica de 12,100,16 m²

- Bairro Nove de Julho
- Bairro Santa Lúcia

Situação:

- Proposta enviada para análise.

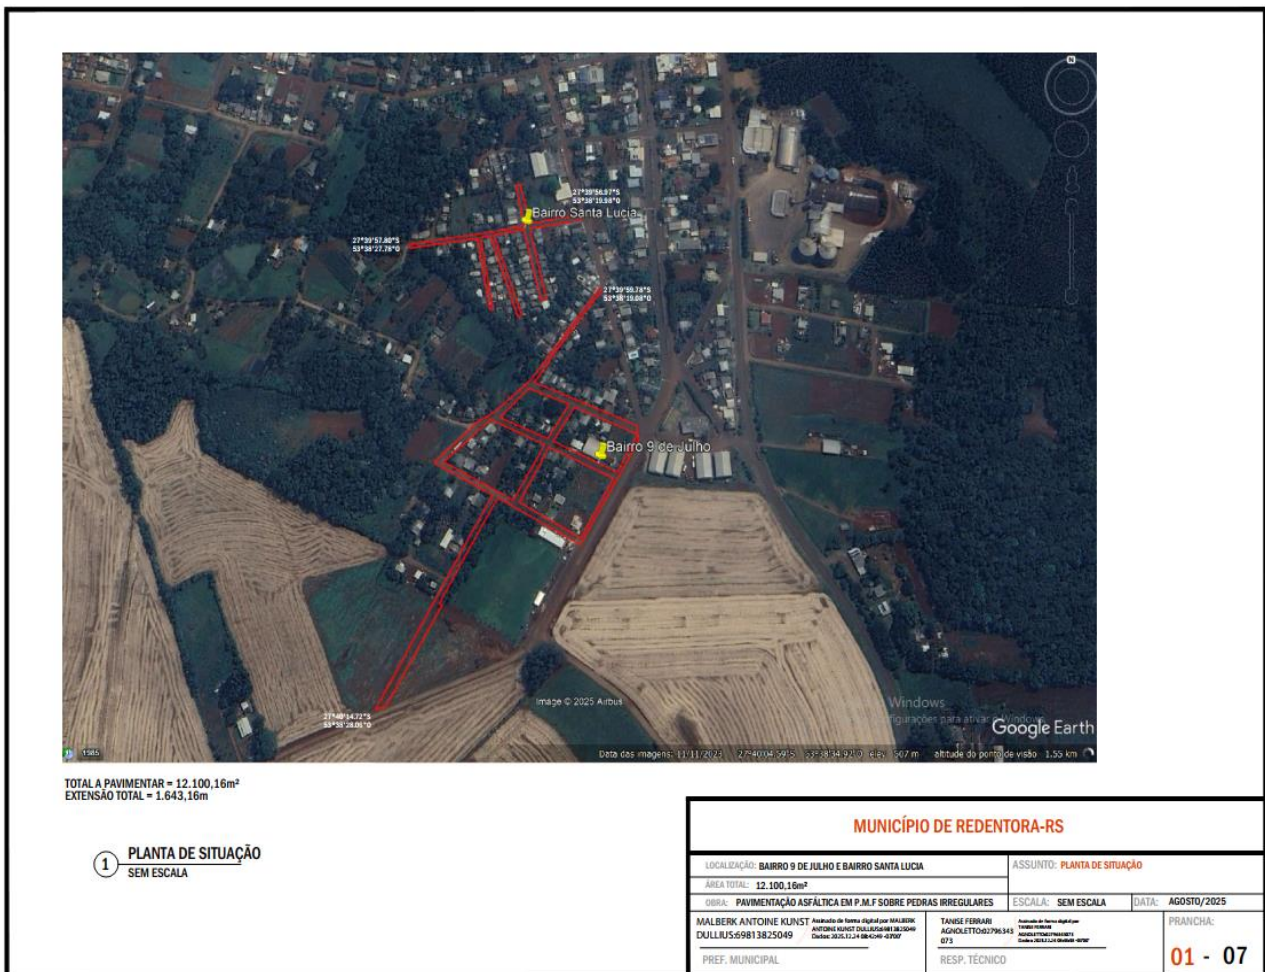



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação com Pedras Irregulares

Recurso: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano**

Proposta nº: **3476/2025**

Recurso: **Programa Pavimenta**

Valor Repasse.....R\$ 369.569,72

Valor Contrapartida.....R\$ 22.174,18

Valor Total.....R\$ 391.743,90


Item:

Pavimentação com Pedras Irregulares de 2.975 m²

- Distrito de Sítio Cassemiro

Situação:

- Proposta enviada para análise.

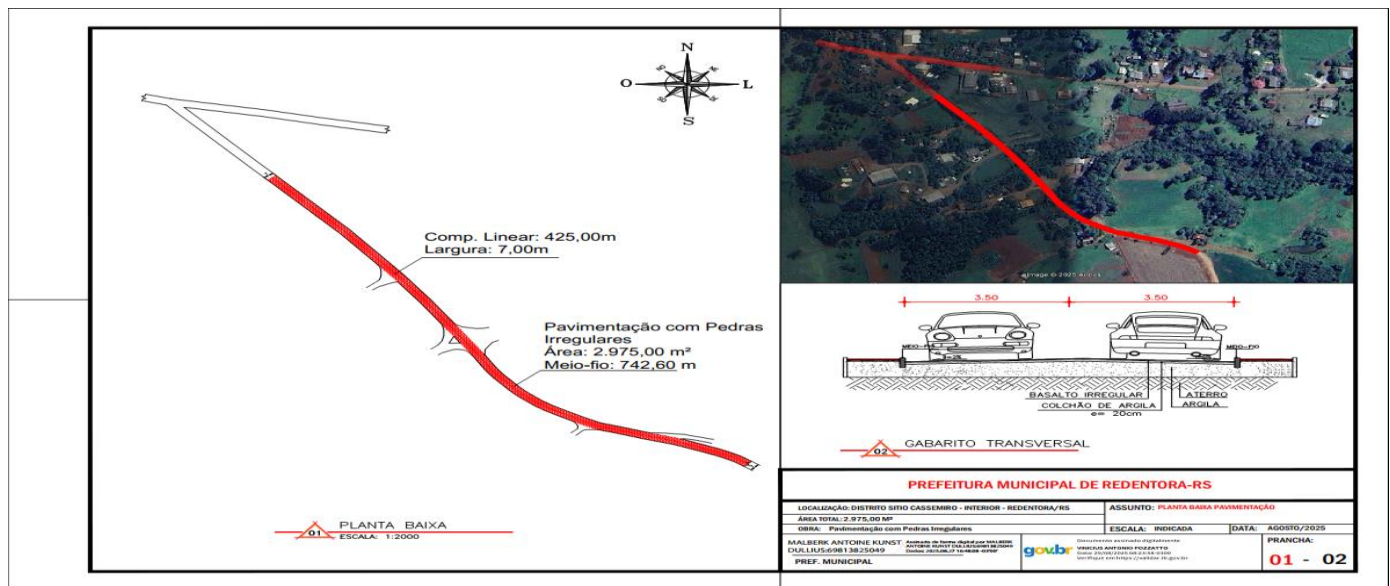

Aquisição de Equipamentos para Agroindústrias

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural**

Recurso: **Consulta Popular 2024/2025**

Valor Repasse.....R\$ 58.781,51

Valor Contrapartida.....R\$ 2.512,91

Valor Total.....R\$ 61.294,42

Item:

Aquisição de Equipamentos

Situação:

- Proposta Enviada para Análise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação com Pedras Irregulares

Recurso: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - RS**

Proposta nº: **1288/2026**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Deputado Estadual Rafael Braga**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.017,89

Valor Total.....R\$ 103.017,89

Item:

Pavimentação com Pedras Irregulares de 989,53 m²

- Localidade de São Sebasião

Situação:

- Proposta enviada para análise.



Aquisição de Equipamentos Agrícolas

Recurso: **Secretaria de Desenvolvimento Rural - RS**

Proposta nº: **1366/2026**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Deputado Estadual Adão Pretto Filho**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.312,44

Valor Total.....R\$ 102.312,44

Itens:

01 Colhedora de Forragens

01 Carreta Metálica Basculante

Situação:

- Proposta enviada para análise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROPOSTAS CADASTRADAS (Governo Federal)

Aquisição de Kit Equipamentos Saúde

Órgão: **Ministério da Saúde**

Recurso: **Programa Novo PAC**

Valor Total.....R\$ 199.596,00

Itens:

Aquisição de Equipamentos para a UBS Cidade

Situação:

- Proposta Enviada para Análise.

Aquisição de Kit Equipamentos Saúde

Órgão: **Ministério da Saúde**

Recurso: **Programa Novo PAC**

Valor Total.....R\$ 7.158,00

Itens:

Aquisição de Kit Teleconsulta

Situação:

- Proposta Enviada para Análise.

Pavimentação Asfáltica

Órgão Concedente: **Ministério das Cidades**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Transferências Especiais**

Plano de Ação: **09032026-091463**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor Repasse.....R\$ 398.000,00

Valor Total.....R\$ 398.000,00

Item:

Pavimentação Asfáltica

Situação:

- Proposta Aprovada



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação Asfáltica

Órgão Concedente: **Ministério das Cidades**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Transferências Especiais**

Plano de Ação: **09032026-098151**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 398.000,00

Valor Total.....R\$ 398.000,00

Item:

Pavimentação Asfáltica no Distrito de São João

Situação:

- Proposta Aprovada

Aquisição de Equipamentos Agrícolas

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura e Pecuária**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Transferências Especiais**

Plano de Ação: **09032026-091012**

Parlamentar: **Paulo Pimenta**

Valor Repasse.....R\$ 497.500,00

Valor Total.....R\$ 497.500,00

Itens:

01 Tratora Agrícola

01 Colhedora de Milho (Acoplada no Trator)

Situação:

- Proposta Aprovada

Aquisição de Veículos

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Transferências Especiais**

Plano de Ação: **09032026-098150**

Parlamentar: **Osmar terra**

Valor Repasse.....R\$ 298.500,00

Valor Total.....R\$ 298.500,00

Itens:

02 Veículos Tipo SUV

Situação:

- Proposta Enviada para Análise



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS CONCLUÍDOS

Projeto de Fechamento do Pavilhão – Assistência Social

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 74.128,08

Valor da Licitação.....R\$ 72.932,39

Valor Executado.....R\$ 72.932,39

Descrição:

Fechamento do Pavilhão e execução de piso de concreto.

Situação:

- Concluído 05/01/2026.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Revitalização da Pracinha de Brinquedos da Praça Arnaldo Roever

Recurso: **Municipal**

Emenda Impositiva.....	R\$	31.777,42
Recurso Livre.....	R\$	210.584,53
Valor do Projeto.....	R\$	144.715,63
Valor da Licitação.....	R\$	126.900,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$	4.047,87
Valor Atualizado.....	R\$	130.947,87
Executado.....	R\$	130.947,87

Descrição:

Revitalização da Praça de Brinquedos (piso, muro, grades e gramado sintético)

Situação:

- Emitido o Termo de Recebimento da Obra em 27/03/2026.
- Percentual Executado: **100% Concluído**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Perfuração de 01 Poço Artesiano

Órgão Concedente: **Secretaria de da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação/RS.**

Recurso: **Programa Avançar Poços**

Valor Repasse.....	R\$	110.218,93
Valor Contrapartida.....	R\$	7.035,25
Valor Total.....	R\$	117.254,18
Valor da Licitação.....	R\$	116.389,61
Valor do 1º Termo Aditivo (supressão).....	R\$	22.539,34
Valor Atualizado.....	R\$	93.850,27
Executado.....	R\$	93.850,27

Item:

Perfuração de 01 Poços Artesiano na Localidade de Passo do Pinheirinho

Situação:

- Emitida a Ordem de Início da Obra em 03/12/2025.
- Percentual Executado: **100,00% Concluído**
- Emitida Termo de Recebimento da Obra em 26/02/2026.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Brinquedos Tipo Parque Infantil

Órgão Concedente: **Secretaria do Esporte e Lazer/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2023/2024**

Valor Repasse.....R\$	32.921,85
Valor Contrapartida.....R\$	11.944,82
Valor Total.....R\$	44.866,68
Valor da Licitação.....R\$	44.850,00

Item:

Aquisição de Brinquedos Tipo Parque Infantil de 04 Torres (Playground) em Madeira Plástica

Situação:

- Brinquedos Instalados em 07/01/2026.
- Percentual Executado: **100,00% Concluído**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de Um Pavilhão Comunitário

Plano de Ação nº: **09032024-067459**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Heitor Schuch**

Valor de Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor do Projeto.....R\$ 98.583,15

Valor da Licitação.....R\$ 97.400,00

Objeto:

Construção de Um Pavilhão Comunitário Setor de Katiu Griá na Terra Indígena do Guarita

Situação:

- Emitida Ordem de Início em 26/01/2026
- Percentual Executado: **100,00% Concluído**
- Emitida Termo de Recebimento da Obra em 30/03/2026.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Execução de Calçada e Pavimentação no Centro Turístico

Plano de Ação nº: **09032023-033**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Paulo Pimenta**

Valor do Repasse.....R\$ 32.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 31.100,54

Executado.....R\$ 31.100,54

Itens:

Execução de Calçadas e Pavimentação no Centro Turístico de Exposição e Comercialização do Artesanato da Terra Indígena do Guarita.

Situação:

- Emitida Ordem de Início em 02/03/2026
- Percentual Executado: **100,00%**
- Obra concluída em 16/04/2026



Custeio Saúde

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Pompeo de Mattos**

Valor Repasse.....R\$ 150.000,00

Valor Total.....R\$ 150.000,00

Descrição:

Custeio de Incremento ao Piso de Atenção Primário - PAP

Situação:

- Recurso Liberado



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Elaboração dos Projetos de OUTORGA

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 50.133,30

Valor da Licitação.....R\$ 43.672,50

Objeto:

Elaboração de 10 Projetos de OUTORGA de Poços Tubulares

Situação:

- Emitida Ordem de Início dia 17/07/2025.
- Concluído o cadastro das Outorgas junto a SEMA.



RELATÓRIO POÇOS TUBULARES
DATA: 25/02/2026

A/C:
Prefeitura Municipal de Redentora
Redentora - RS

(55) 9 9719-9487
firmogeologia.com.br
firmogeologicoambiental@gmail.com

O presente documento visa apresentar a relação dos poços previamente cadastrados junto ao SIOUT e devidamente requeridos ao pedido de outorga, aguardando análise do DRH, no município de Redentora - RS, sob responsabilidade técnica do Eng. Geólogo Hernanes Firmo Silva, sob registro CREA/RS 245495, a fim de atender ao programa Poço Legal.

SERVIÇOS E VALORES

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº CADASTRO SIOUT	ART
1	Poço Linha Manica - (Linha Palmeira)	2023/016.549-1	14185304
2	Poço vista alegre	2023/016.574-1	14185279
3	Poço Localidade de Sítio Langner - Luiz Bonato	2023/016.404-2	14185272
4	Poço Prates	2022/009.955-3	14185302
5	Poço São Jose	2023/016.524-3	14185300
6	Poço Linha São Sebastião 2023/016.410-2	2023/016.410-2	14185278
7	Poço Localidade de Sítio Cassemiro (Otanelli)	2023/016.469-1	14185280
8	Poço Ouro Verde (Ardenghi)	2023/016.436-2	14185277
9	Poço Linha Soledade (Evaldo Farias)	2023/016.559-2	14185303
10	Poço Localidade de Vila São Joao	2023/016.532-2	14185301

Responsável Técnico
Hernanes Firmo
Eng. Geólogo Esp. Geotécnica
CREA/RS 245495
Coordenador de Projetos

41.919.983/0001-41
H FIRMO SILVA LTDA
Rua Visconde de Pelotas, 2252 Apt 03
Nossa Senhora de Fátima
CEP: 97.015-140
Santa Maria - RS



GEOLOGIA

GEOTECNIA

MINERAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Aquisição de Equipamentos para o Hospital

Órgão Concedente: **Secretaria da Saúde/RS.**

Recurso: **Portaria SES nº 750/2023**

Valor Repasse.....R\$ 750.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.193,03

Valor Total.....R\$ 752.193,03

Valor da Licitação.....R\$ 729.010,00

Valor a Ser Devolvido.....R\$ 20.990,00

Itens:

- 01 (um) Aparelho para digitalização de Imagens CR
- 01 (uma) Lavadora Extratora Hospitalar, Capacidade Mínima 30 kg
- 01 (uma) Secador Rotativo, Capacidade Mínima de 28 Kg
- 01 (uma) Calandra Horizontal
- 01 (uma) Seladora Automática para Embalagens de Grau Cirúrgico
- 01 (uma) Autoclave a Vapor
- 01 (uma) Lavadora Ultrassônica Linha Médica Hospitalar
- 03 (três) Camas Tipo Fowler

OBS: Realizada a vistoria pela CRS nos equipamentos dia 08/04/2026

Aquisição de Equipamentos Agrícolas

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **010719/2023**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 143.250,00

Valor Contrapartida.....R\$ 150,00

Valor Total.....R\$ 143.400,00

Valor da Licitação.....R\$ 113.500,00

Itens:

- 01 (uma) Colhedeira de Forragens;
- 01 (um) Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido.

OBS: Prestação de Contas enviada para análise



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Heitor Schuch**

Proposta SICONV: **002523/2022**

Valor Repasse.....R\$ 143.250,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.750,00

Valor Total.....R\$ 146.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 144.150,00

Itens:

01 (uma) Grade Aradora

01 (uma) Grade Niveladora

01 (uma) Carreta Agrícola com Carroceria de Madeira

01 (uma) Roçadeira Agrícola

OBS: Prestação de Contas enviada para análise

Redentora, 30 de abril de 2026.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
