



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JUNHO/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS EM EXECUÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 45.484,02

Valor da Licitação.....R\$ 295.484,02

Valor do Termo de Reequilíbrio Financeiro.....R\$ 35.450,90

Valor Total da Obra.....R\$ 330.934,92

Valor Executado.....R\$ 161.736,03

Percentual Executado: 48,87%

Situação Atual da Obra:

- Em fase de abertura da vala para construção do muro lateral (Norte) do Estádio.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Concedente**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 115.973,14

Valor da Licitação.....R\$ 402.473,14

Valor do Termo de Reequilíbrio Financeiro.....R\$ 46.324,86

Valor Total da Obra.....R\$ 448.797,99

Valor Executado.....R\$ 321.906,64

Percentual Executado: 72,17%

Situação:

- Em fase de revestimento das paredes e colocação das aberturas.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Revitalização da Avenida Constante Luiz Gemelli

Recurso: **Municipal**

Valor.....R\$ 513.969,56

Valor da Licitação.....R\$ 478.493,00

Valor Executado.....R\$ 399.563,63

Percentual Executado: 83,52%

Atividades:

- Execução Concluída, em fase de Vistoria Final e Elaboração de Termo Aditivo.

Quadra 01 – Em Frente à Escola Feliciano Jorge Albert



Quadra 02 – Em Frente à Praça Arnaldo Roever



Quadra 03 – Em Frente à Agência do Banco do Brasil





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Quadra 04 – Em Frente à Assistência Social



Quadra 05 – Em Frente ao Banrisul



Quadra 06 – Em Frente a Fiscalização / Hospital





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado.....R\$ 182.456,03

Valor da Licitação.....R\$ 149.554,87

Valor Executado.....R\$ 131.140,00

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Erwin Mathaus Braun

Rua Sinfrônio Julio Ribeiro

Situação:

- Em fase de Colocação dos Meios Fio e Conclusão das bocas de lobo.
- Executado **87,69%**.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Execução de Entrada de Energia Elétrica – Hospital Municipal

Recurso: **Municipal**

Valor.....R\$ 75.121,00

Valor da Licitação.....R\$ 68.800,00

Valor Executado.....R\$ 68.800,00

Percentual Executado: 100%

Atividades:

- Aprovado pela RGE a Ligação de Rede de Energia.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Saúde – Fundo a Fundo**

Valor Repasse.....R\$ 50.000,00

Valor Total.....R\$ 50.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 38.501,16

Item:

Equipamentos e Material Permanente

01 Câmara para Conservação de Vacinas, Medicamentos;

01 Eletrocardiógrafo;

01 Monitor de Sinais Vitais;

01 Cilindro para Oxigênio Medicinal 50 Litros

02 Cilindro para Oxigênio Medicinal 7 Litros

04 Cadeiras de Rodas Adulto Dobrável

05 Nebulizador Ultrassônico

Atividades:

- Em fase de entrega dos equipamentos.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Heitor Schuch**

Proposta SICONV: **002523/2022**

Valor Repasse.....R\$ 143.250,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.750,00

Valor Total.....R\$ 146.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 144.150,00

Itens:

01 (uma) Grade Aradora

01 (uma) Grade Niveladora

01 (uma) Carreta Agrícola com Carroceria de Madeira

01 (uma) Roçadeira Agrícola

Situação:

- Equipamentos Entregues, em fase de Elaboração dos Relatórios.



Grade Aradora



Roçadeira Agrícola



Grade Niveladora



Carreta Agrícola



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de Micro Açudes

Órgão Concedente: **Secretaria de Agricultura, Produção Sustentável e Irrigação/RS.**

Recurso: **Programa Avançar na Agricultura**

Valor Repasse.....R\$ 84.600,00

Valor Total.....R\$ 84.600,00

Item:

Contratação de Prestação de Serviço de Hora Máquina com Escavadeira Hidráulica.
Construção de 09 (nove) Micro Açudes)

Situação:

- Em Fase de Licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO RECURSO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **013316/2020**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Bohn Gass**

Valor Repasse.....R\$ 171.900,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.100,00

Valor Total.....R\$ 174.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 171.650,00

Itens:

01 (uma) Roçadeira Agrícola Articulada;

01 (uma) Plantadeira Plantio Direto 05 Linhas.

Situação:

- Licitação Aprovada, Aguardando a liberação do recurso pelo Ministério da Agricultura.

Aquisição de Veículo

Órgão Concedente: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano/RS.**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Patrícia Alba**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 12.665,00

Valor Total.....R\$ 112.665,00

Item:

Aquisição de Um Veículo de Pequeno Porte

Situação:

- Aguardando Liberação do Recurso.

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **052170/2021**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 239.750,00

Objeto: **Pavimentação com Pedras Irregulares na Localidade de Vila São Sebastião**

Atividades:


- Licitação Aprovada pelo Setor de Engenharia da Caixa Econômica Federal

Situação:

- Aguardando a Liberação do Recurso.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

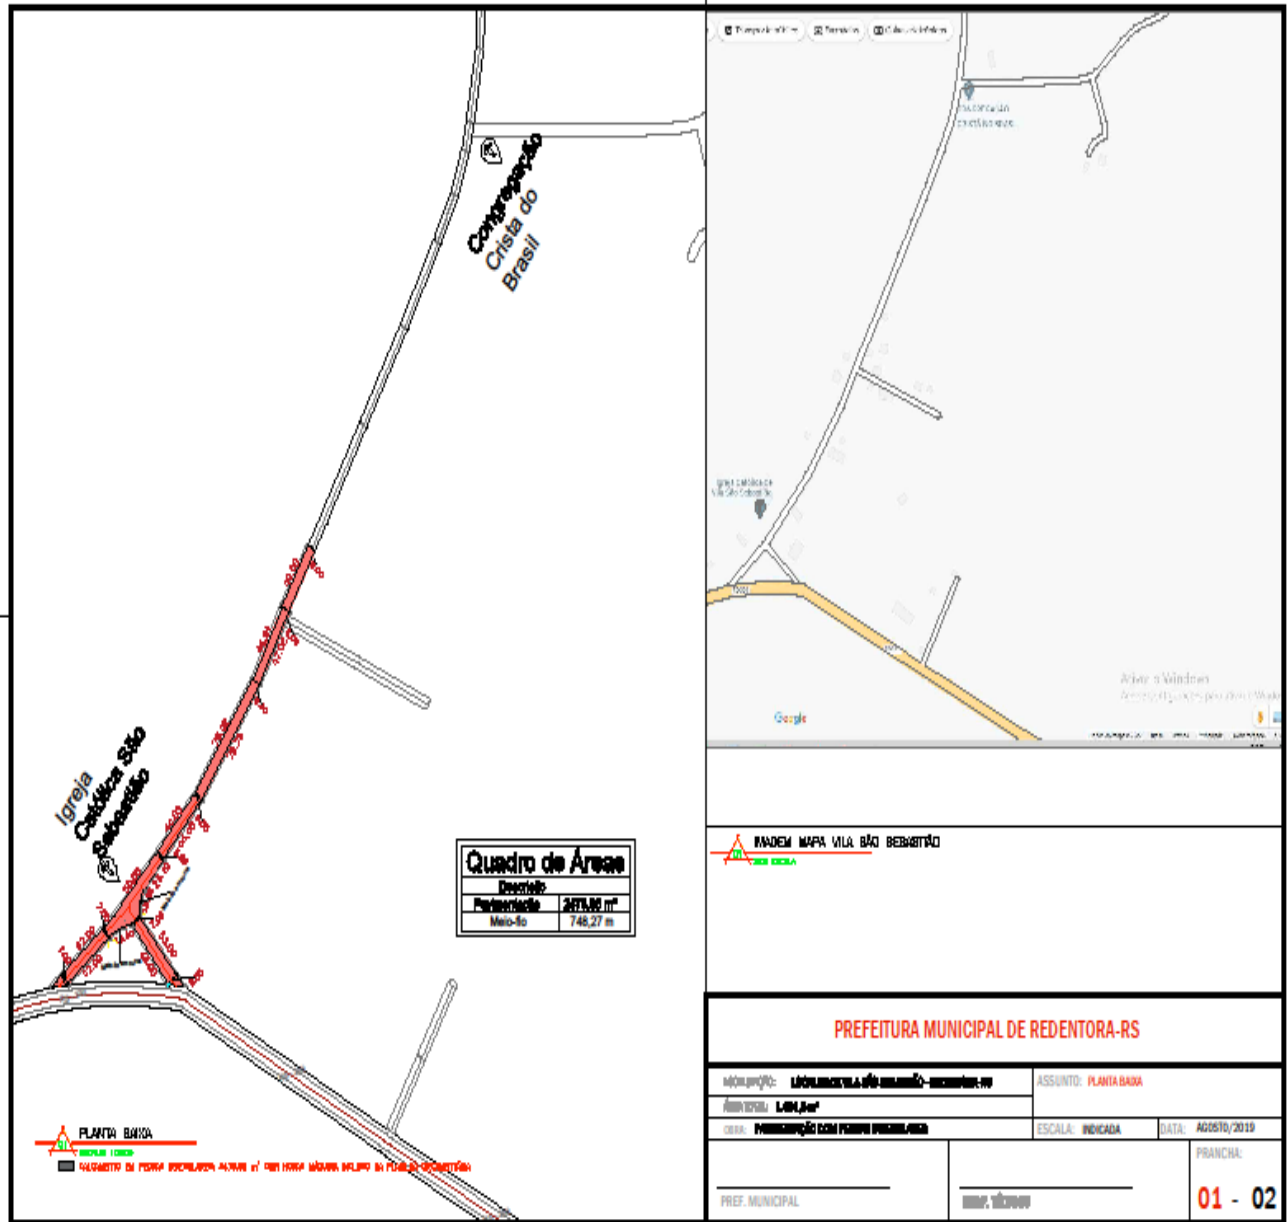



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS CADASTRADOS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Emendas Parlamentares

Pavimentação Asfáltica

Órgão Concedente: **Ministério das Cidades.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Senador Paulo Paim**

Proposta SICONV: **009419/2023**

Valor Repasse.....R\$ 238.856,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.144,00

Valor Total.....R\$ 240.000,00

Objeto: **Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Perímetro Urbano**

Atividades:

- Proposta Cadastrada

Situação:

- Aprovada, Aguardando Empenho.

Aquisição de Equipamentos Agrícolas

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **010719/2023**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 143.250,00

Valor Contrapartida.....R\$ 150,00

Valor Total.....R\$ 143.400,00

Itens:

01 (uma) Colhedeira de Forragens;

01 (um) Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido.

Situação:

- Proposta em Análise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Emendas Parlamentares Especiais

Aquisição de Equipamentos Agrícolas

Plano de Ação nº: **09032023-034**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Onyx Lorenzoni**

Valor.....R\$ **300.000,00**

Itens: A definir.

Aquisição de Equipamentos Agrícolas

Plano de Ação nº: **09032023-035**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Giovani Cherini**

Valor.....R\$ **500.000,00**

Itens: A definir.

Construção de Um Centro Turístico – Terra Indígena do Guarita

Plano de Ação nº: **09032023-033**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Paulo Pimenta**

Valor.....R\$ **250.000,00**

Itens:

Construção de Um Centro Turístico de Exposição e Comercialização do Artesanato da Terra Indígena do Guarita.

Pavimentação Asfáltica

Plano de Ação nº: **09032023-035**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor.....R\$ **200.000,00**

Itens:

Pavimentação Asfáltica

Aquisição de Equipamentos Agrícolas

Plano de Ação nº: **09032023-036**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Pompeo de Mattos**

Valor.....R\$ **150.000,00**

Itens: A definir.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS CONCLUÍDOS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área a Ser Construída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....	R\$	965.277,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$	40.203,37
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$	102.046,35
Valor do 3º Termo Aditivo.....	R\$	66.293,08
Valor do 5º Termo Aditivo.....	R\$	32.772,30
Valor do 6º Termo Aditivo.....	R\$	91.939,94
Valor do Reequilíbrio Financeiro.....	R\$	311.290,92
Valor do 8º Termo Aditivo (Supressão de Valores).....	R\$	129.899,19
Valor do 10º Termo Aditivo.....	R\$	31.133,89
Valor do Aditivo (Supressão de Valores Final).....	R\$	24.796,15
Valor do Aditivo (Supressão de Valores Final/Reequilíbrio).....	R\$	1.697,86
Valor Total.....	R\$	1.484.563,65
Valor Executado.....	R\$	1.484.563,65

% Acumulado Executado da Obra: **100,00%**

Projeto Acessibilidade (Rampas e Calçadas)

Recurso: **Municipal**

Valor da Licitação.....	R\$	126.196,72
Valor Executado.....	R\$	126.196,72

% Acumulado Executado da Obra: **100,00%**

Projeto Esquadrias (Portas e Janelas)

Recurso: **Municipal**

Valor da Licitação.....	R\$	276.057,80
Valor Executado.....	R\$	276.057,80

% Acumulado Executado da Obra: **100%**

Valor Total

Valor Total Atualizado.....	R\$	1.886.818,17
Valor Executado.....	R\$	1.886.818,17

% Acumulado Executado da Obra: **100,00%**

Situação:

- Obra Concluída.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Ampliação da Escola Municipal Maria Belmont Albert

Recurso: **Municipal**

Valor da Licitação.....R\$ 449.036,77

Valor do Termo de Adição.....R\$ 28.822,88

Valor do Termo de Supressão.....R\$ 24.937,96

Valor Total Final.....R\$ 452.921,69

Percentual Executado: 100,00%

Item:

Construção de 04 Salas de Aula e Sanitários

Situação:

- Obra Concluída.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Execução de Piso de Concreto e Drenagem na Quadra de Esportes

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado do Projeto.....R\$ 126.308,17

Valor da Licitação.....R\$ 105.840,50

Valor do Aditivo de Adição.....R\$ 21.674,16

Valor do Aditivo de Supressão.....R\$ 9.129,42

Valor Executado.....R\$ 118.385,24

Percentual Executado: 100,00 %

Objeto:

- Execução de Piso de Concreto na Quadra de Esportes da Praça Arnaldo Roever.

Situação:

- Obra Concluída.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de Paradas de Ônibus

Recurso: **Municipal**

Quantidade: **10 Unidades + 02 Unidades (Aditivo): Total 12 Unidades**

Valor.....R\$ 75.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 52.300,00

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 10.460,00

Valor da Licitação.....R\$ 62.760,00

Situação:

- Concluído.



Escola Municipal São José



Escola Municipal Maria Belmont Albert



Escola Municipal Gente Miúda



Escola Municipal Menino Jesus



Escola Municipal Assis Brasil



Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



Rua Wanderlei de Oliveira Pereira



Rua Major Feliciano



Localidade de São Sebastião



Setor Indígena de Estiva



Distrito de São João



Linha Mânica



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00

Itens:

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico (Já Entregue);

01 (uma) Roçadeira Agrícola (Já Entregue);

01 (uma) Carreta Agrícola Metálica Basculante;

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes.

Situação:

- Concluído.




Distribuidor de Calcário e Adubo Orgânico



Roçadeira Agrícola



Carreta Metálica Basculante

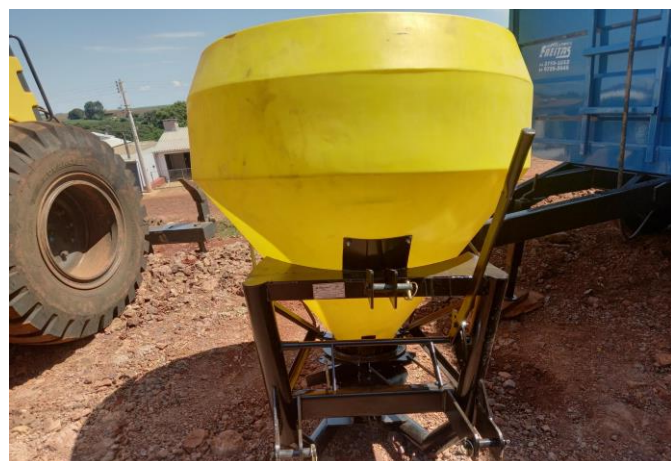

Distribuidor Hidráulico de Fertilizante



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 765.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 758.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (um) Caminhão Equipado com Caçamba de no Mínimo 12m³

Situação:

- Concluída.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de 01 (um) Veículo Tipo VAN Passageiros

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 365.957,67

Valor da Licitação.....R\$ 365.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (um) Veículo Tipo VAN com no mínimo 21 Lugares

Situação:

- Concluída.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação Asfáltica (Pavimenta)

Órgão Concedente: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.**

Recurso: **Programa Pavimenta**

Objeto:

Pavimentação Asfáltica

- Trecho da Rua Acelyno Lutz Pinheiro
- Estrada Saída para Coronel Bicaco
- Rua Industrial I

Área a Ser Pavimentada: **8.588m²**

Área a Ser Pavimentada (Aditivo): **1.778,32m²**

Área Total Ser Pavimentada: **10.366,32m²**

Valor Repasse.....R\$ 701.948,40

Valor Contrapartida.....R\$ 218.306,38

Valor da Licitação.....R\$ 920.254,78

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 182.234,80

Valor Total da Obra.....R\$ 1.102.489,58

Percentual Executado do Total da Obra: 100,00%

Valor Total Pago a Empresa.....R\$ 821.125,70

Valor a Pagar a Empresa.....R\$ 281.363,88

Situação:

- Obra Concluída, Recebida 3ª Parcela do Recurso.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS EM ELABORAÇÃO:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de Um Pavilhão Coberto

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto Estimado.....R\$ 320.985,12

Descrição:

Construção de Um Pavilhão Coberto (40m x 20m: 800 m²) no Setor de Irapuá – Terra Indígena do Guarita.

Situação:

- Em Elaboração.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Perfuração de Poços

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

Valor Total.....	R\$	70.000,00
Valor da Licitação (Geólogo).....	R\$	4.440,00
Valor da Licitação (Perfuração).....	R\$	45.500,00
Termo Aditivo (Adição) da Licitação (Perfuração).....	R\$	11.000,00
Termo Aditivo (Supressão) da Licitação (Perfuração).....	R\$	2.350,00
Valor Total Utilizado.....	R\$	58.590,00

Item:

Realizada a Perfuração dos Poços Tubulares Profundos (Poços Artesianos)

Situação:

- Prestação de Contas em Análise.



Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....	R\$	120.387,00
Valor Contrapartida.....	R\$	2.230,42
Valor Total.....	R\$	122.617,42
Valor da Licitação.....	R\$	121.000,00

Itens:

- 02 (duas) Ensiladeiras
- 01 (uma) Grades Aradora
- 01 (uma) Plantadeira
- 01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes
- 01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Situação:

- Prestação de Contas complementada e enviada para análise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Situação:

- Prestação de Contas Enviada para Análise.

Redentora, 30 de junho de 2023.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN

Secretário Municipal de Planejamento
