



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

FEVEREIRO/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área a Ser Construída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....	R\$ 965.277,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$ 40.203,37
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$ 102.046,35
Valor do 3º Termo Aditivo.....	R\$ 66.293,08
Valor do 5º Termo Aditivo.....	R\$ 32.772,30
Valor do 6º Termo Aditivo.....	R\$ 91.939,94
Valor do Reequilíbrio Financeiro.....	R\$ 311.290,92
Valor do 8º Termo Aditivo (Supressão de Valores).....	R\$ 129.899,19
Valor do 10º Termo Aditivo.....	R\$ 31.133,89
Valor do Aditivo (Supressão de Valores Final).....	R\$ 24.796,15
Valor do Aditivo (Supressão de Valores Final/Reequilíbrio).....	R\$ 1.697,86
Valor Total.....	R\$ 1.484.563,65
Valor Executado.....	R\$ 1.484.563,65

% Acumulado Executado da Obra: **100,00%**

Projeto Acessibilidade (Rampas e Calçadas)

Recurso: **Municipal**

Valor da Licitação.....	R\$ 126.196,72
Valor Executado.....	R\$ 126.196,72

% Acumulado Executado da Obra: **100,00%**

Projeto Esquadrias (Portas e Janelas)

Recurso: **Municipal**

Valor da Licitação.....	R\$ 276.057,80
Valor Executado.....	R\$ 231.597,69

% Acumulado Executado da Obra: **83,89%**

Valor Total

Valor Total Atualizado.....	R\$ 1.886.818,17
Valor Executado.....	R\$ 1.842.358,06

% Acumulado Executado da Obra: **97,64%**

Situação:

- Aguardando a Instalação das Telas de Proteção das Janelas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Ampliação da Escola Municipal Maria Belmont Albert

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 449.232,00

Valor da Licitação.....R\$ 449.036,77

Valor Executado.....R\$ 412.576,81

Percentual Executado: 91,88%

Item:

Construção de 04 Salas de Aula e Sanitários

Situação:

- Em fase de pintura interna e externa.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 45.484,02


Valor da Licitação.....R\$ 295.484,02

Valor Executado.....R\$ 138.571,92

Percentual Executado: 46,90%

Situação Atual da Obra:

- Em fase de revestimento das paredes e piso.

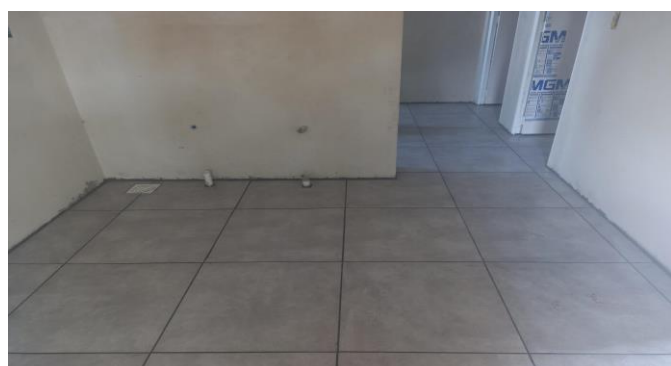



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Concedente**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 115.973,14

Valor da Licitação.....R\$ 402.473,14

Valor Executado.....R\$ 134.153,68

Percentual Executado: 33,33%

Situação:

- Em fase de levantamento das platibandas e colocação da estrutura do telhado.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Revitalização da Avenida Constante Luiz Gemelli

Recurso: **Municipal**

Valor.....R\$ 513.969,56

Valor da Licitação.....R\$ 478.493,00

Valor Executado.....R\$ 273.454,05

Percentual Executado: 57,16%

Atividades:

- Em Execução todos os Canteiros.

Quadra 01 – Em Frente à Escola Feliciano Jorge Albert



Quadra 02 – Em Frente à Praça Arnaldo Roever





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Quadra 03 – Em Frente à Agência do Banco do Brasil



Quadra 04 – Em Frente à Assistência Social



Quadra 05 – Em Frente ao Banrisul





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



Quadra 06 – Em Frente a Fiscalização / Hospital





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado.....R\$ **182.456,03**

Valor da Licitação.....R\$ **149.554,87**

Valor Executado.....R\$ **111.085,09**

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Erwin Mathaus Braun

Rua Sinfrônio Julio Ribeiro

Situação:

- Aguardando a Colocação dos Meio Fio e pó de brita, Conclusão das bocas de lobo.
- Executado **74,28%**.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Construção de Paradas de Ônibus

Recurso: **Municipal**

Quantidade: **10 Unidades + 02 Unidades (Aditivo): Total 12 Unidades**

Valor.....R\$ 75.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 52.300,00

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 10.460,00

Valor da Licitação.....R\$ 62.760,00

Situação:

- Concluído.



Escola Municipal São José



Escola Municipal Maria Belmont Albert



Escola Municipal Gente Miúda



Escola Municipal Menino Jesus



Escola Municipal Assis Brasil



Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



Rua Wanderlei de Oliveira Pereira



Rua Major Feliciano



Localidade de São Sebastião



Setor Indígena de Estiva



Distrito de São João



Linha Mânica



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Execução de Entrada de Energia Elétrica – Hospital Municipal

Recurso: **Municipal**

Valor.....R\$ 75.121,00

Valor da Licitação.....R\$ 68.800,00

Atividades:

- Realizada a colocação do Transformador;
- Solicitado a RGE a Ligação da Energia.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Execução de Piso de Concreto e Drenagem na Quadra de Esportes

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado do Projeto.....R\$ 126.308,17


Valor da Licitação.....R\$ 105.840,50

Objeto:

- Execução de Piso de Concreto na Quadra de Esportes da Praça Arnaldo Roever.

Situação:

- Obra Iniciada pelas canaletas de drenagem.

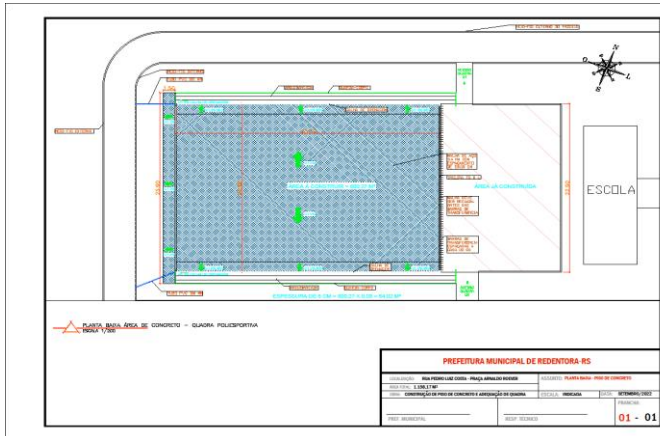



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00

Itens:

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico (Já Entregue);

01 (uma) Roçadeira Agrícola (Já Entregue);

01 (uma) Carreta Agrícola Metálica Basculante;

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes.

Situação:

- Concluído.




Distribuidor de Calcário e Adubo Orgânico



Roçadeira Agrícola



Carreta Metálica Basculante

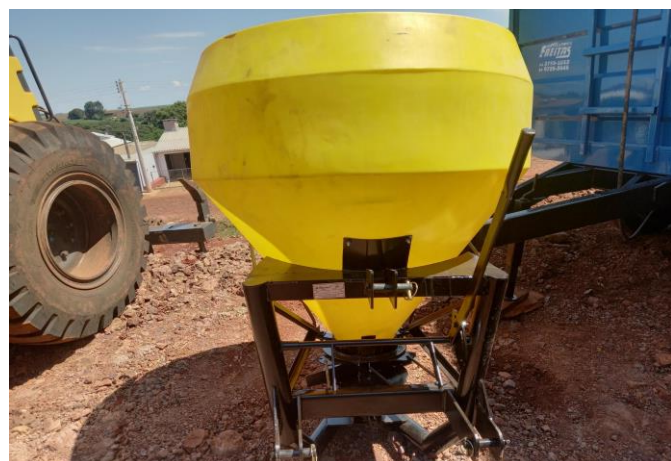

Distribuidor Hidráulico de Fertilizante



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (Cidade)

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual da Saúde – Fundo a Fundo**

Valor Repasse.....R\$ 50.000,00

Valor Total.....R\$ 50.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 38.501,16

Item:

Equipamentos e Material Permanente

01 Câmara para Conservação de Vacinas, Medicamentos;

01 Eletrocardiógrafo;

01 Monitor de Sinais Vitais;

01 Cilindro para Oxigênio Medicinal 50 Litros

02 Cilindro para Oxigênio Medicinal 7 Litros

04 Cadeiras de Rodas Adulto Dobrável

05 Nebulizador Ultrassônico

Atividades:

- Em fase de entrega dos equipamentos.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 765.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 758.000,00

Aquisição de 01 (um) Caminhão Equipado com Caçamba de no Mínimo 12m³

Situação:

- Licitação realizada, aguardando a entrega do Veículo.



Aquisição de 01 (um) Veículo Tipo VAN Passageiros

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 365.957,67

Valor da Licitação.....R\$ 365.957,67

Itens:

Aquisição de 01 (um) Veículo Tipo VAN com no mínimo 21 Lugares

Situação:

- Em fase de Licitação, Certame previsto para o dia 06/02/2023.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETO LICITADO – Aguardando Liberação Recurso

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **013316/2020**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Bohn Gass**

Valor Repasse.....R\$ 171.900,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.100,00

Valor Total.....R\$ 174.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 171.650,00

Itens:

01 (uma) Roçadeira Agrícola Articulada;

01 (uma) Plantadeira Plantio Direto 05 Linhas.

Situação:

- Licitação Aprovada, Aguardando a liberação do recurso pelo Ministério da Agricultura.

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Heitor Schuch**

Proposta SICONV: **002523/2022**

Valor Repasse.....R\$ 143.250,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.750,00

Valor Total.....R\$ 146.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 144.150,00

Itens:

01 (uma) Grade Aradora

01 (uma) Grade Niveladora

01 (uma) Carreta Agrícola com Carroceria de Madeira

01 (uma) Roçadeira Agrícola

Situação:

- Licitação Aprovada, Aguardando a liberação do recurso pelo Ministério da Agricultura.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **052170/2021**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 239.750,00


Objeto: **Pavimentação com Pedras Irregulares na Localidade de Vila São Sebastião**

Atividades:

- Enviada a Licitação Para Análise

Situação:

- Aguardando Aprovação e Liberação do Recurso.

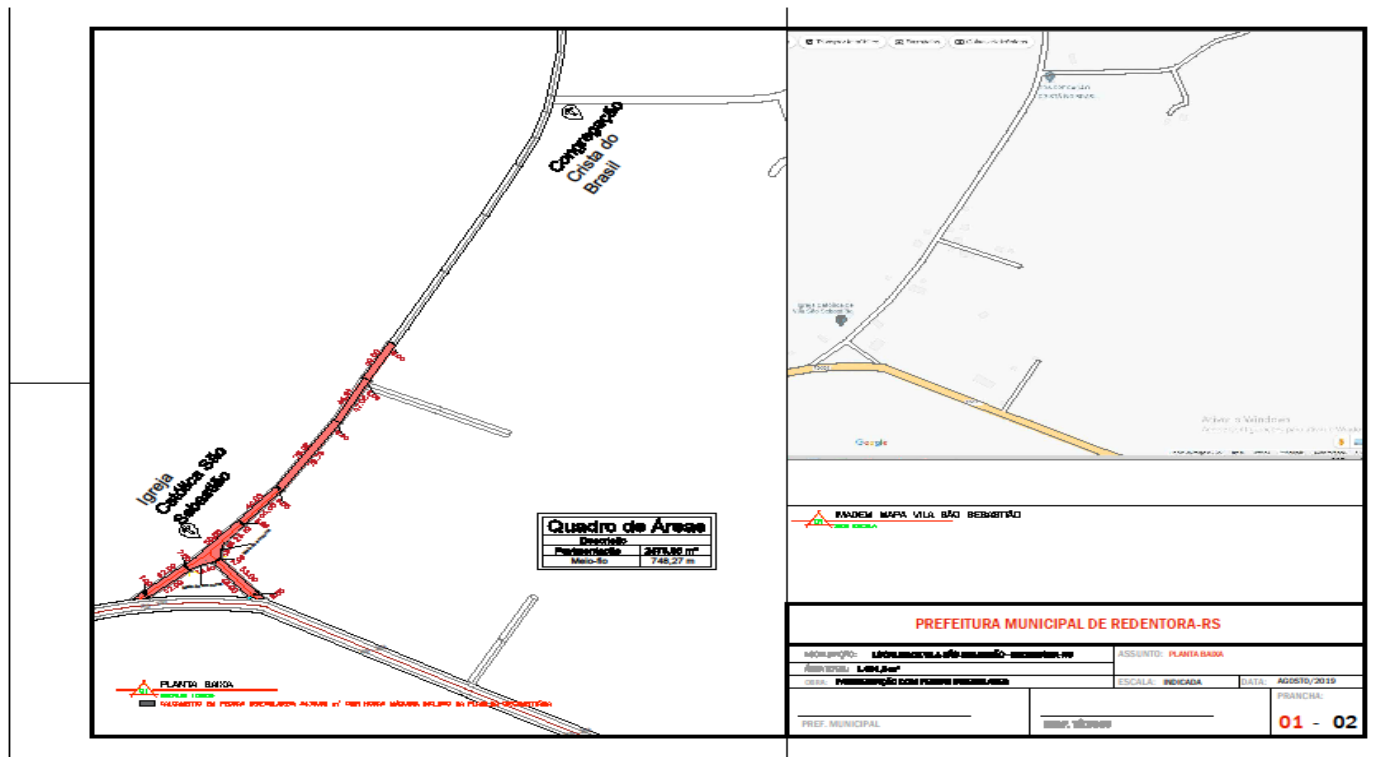



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETO CONCLUÍDO – Aguardando Liberação Recurso

Pavimentação Asfáltica (Pavimenta)

Órgão Concedente: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.**

Recurso: **Programa Pavimenta**

Objeto:

Pavimentação Asfáltica

- Trecho da Rua Acelyno Lutz Pinheiro
- Estrada Saída para Coronel Bicaco
- Rua Industrial I

Área a Ser Pavimentada: **8.588m²**

Área a Ser Pavimentada (Aditivo): **1.778,32m²**

Área Total Ser Pavimentada: **10.366,32m²**

Valor Repasse.....R\$ 701.948,40

Valor Contrapartida.....R\$ 218.306,38

Valor da Licitação.....R\$ 920.254,78

Valor do Termo Aditivo.....R\$ 182.234,80

Valor Total da Obra.....R\$ 1.102.489,58

Percentual Executado do Total da Obra: 100,00%

Valor Total Pago a Empresa.....R\$ 821.125,70

Valor a Pagar a Empresa.....R\$ 281.363,88

Situação:

- Obra Concluída, Aguardando Liberação da 3ª Parcelas do Recurso.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS EM ANÁLISE (GOVERNO RS)

Aquisição de Veículo

Órgão Concedente: **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano/RS.**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Patrícia Alba**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 12.665,00

Valor Total.....R\$ 112.665,00

Item:

Aquisição de Um Veículo de Pequeno Porte

Situação:

- Projeto enviado para análise.

PROJETOS EM ELABORAÇÃO:

Adequação do Entorno da Escola Municipal Maria Belmont Albert

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto Estimado.....R\$ 300.000,00

Descrição:

Muro, Grades, Passeio Público, Calçadas, Rampas de Acesso.

Situação:

- Em Elaboração.

DEMAIS ATIVIDADES:

- Análises de Projetos de Construção;
- Levantamento dos Itens Faltantes de Prevenção de Incêndio nas Escolas;
- Visitas para análise e elaboração de Projetos de Auxílios Sociais;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETOS EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Perfuração de Poços

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

Valor Total.....	R\$	70.000,00
Valor da Licitação (Geólogo).....	R\$	4.440,00
Valor da Licitação (Perfuração).....	R\$	45.500,00
Termo Aditivo (Adição) da Licitação (Perfuração).....	R\$	11.000,00
Termo Aditivo (Supressão) da Licitação (Perfuração).....	R\$	2.350,00
Valor Total Utilizado.....	R\$	58.590,00

Item:

Realizada a Perfuração dos Poços Tubulares Profundos (Poços Artesianos)

Situação:

- Projeto concluído.



Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....	R\$	35.374,00
Valor Contrapartida.....	R\$	3.036,00
Valor Total.....	R\$	38.410,00

Item:

Aquisição de 262 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Situação:

- Não Executado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Situação:

- Prestação de Contas complementada e enviada para análise.

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Situação:

- Prestação de Contas Enviada para Análise.

Redentora, 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento
